

審計部監督行政院工程會列管莫拉克颱風災後重建工程預算執行情形

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算自民國 98 年 11 月 20 日至 101 年度，歲出預算數 1,165 億餘元，經行政院於 101 年 8 月原則同意「莫拉克颱風災後重建特別條例」施行 3 年期滿未及執行之計畫酌予延長，延長期限以 2 年為限；另本移緩濟急原則自相關預算移撥支應各項緊急重建工作，其中由行政院工程會列管與工程相關之預算，98 至 102 年度可支用預算數 802 億餘元，預算編列單位計有 10 個中央主管機關，截至 102 年 9 月底，累計分配數 785 億餘元，累計執行數 766 億餘元，執行率 97.60%，各主管機關執行率均達 80% 以上(詳附表 1)；另截至 102 年 9 月底，已核定之標案計 9,224 件，其中實際執行進度較預定執行進度落後 20 個百分點以上者計有 4 件(詳附表 2)。各主管機關執行情形等詳細資料¹列示如後。

● [各主管機關預算執行情形統計表](#)

● [各主管機關預算執行情形統計圖](#)

¹各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就工程進度落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

行政院工程會列管莫拉克颱風災後重建工程各主管機關預算執行情形統計表


資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	已核定 標案件數 (1)	可支用 預算數 (2)	累計 分配數 (3)	累計 支用數 (4)	累計 應付未付數 (5)	累計 賸餘數 (6)	累計 執行數 (7=4+5+6)	執行率 (%) (7/3)
合計		9,224	80,267	78,575	73,243	2,700	745	76,688	97.60
1	原民會	444	6,448	6,427	5,348	430	160	5,939	92.40
2	農委會	3,128	15,239	15,239	13,864	442	199	14,506	95.19
3	內政部	1,571	7,277	7,221	6,820	85	82	6,988	96.77
4	交通部	1,224	27,549	2,5986	24,079	1,303	290	25,673	98.80
5	教育部	1,298	1,450	1,445	1,382	45	0	1428	98.85
6	經濟部	1,447	22,146	22,136	21,633	388	11	22,033	99.54
7	衛福部	80	97	60	56	4	-	60	100.00
8	文化部	1	1	1	1	-	-	1	100.00
9	環保署	19	26	26	26	-	-	26	100.00
10	客委會	12	30	30	30	-	-	30	100.00

註：可支用預算數係整體預算(包括特別預算及移緩濟急預算)累計至 102 年度之可支用預算數。

附圖

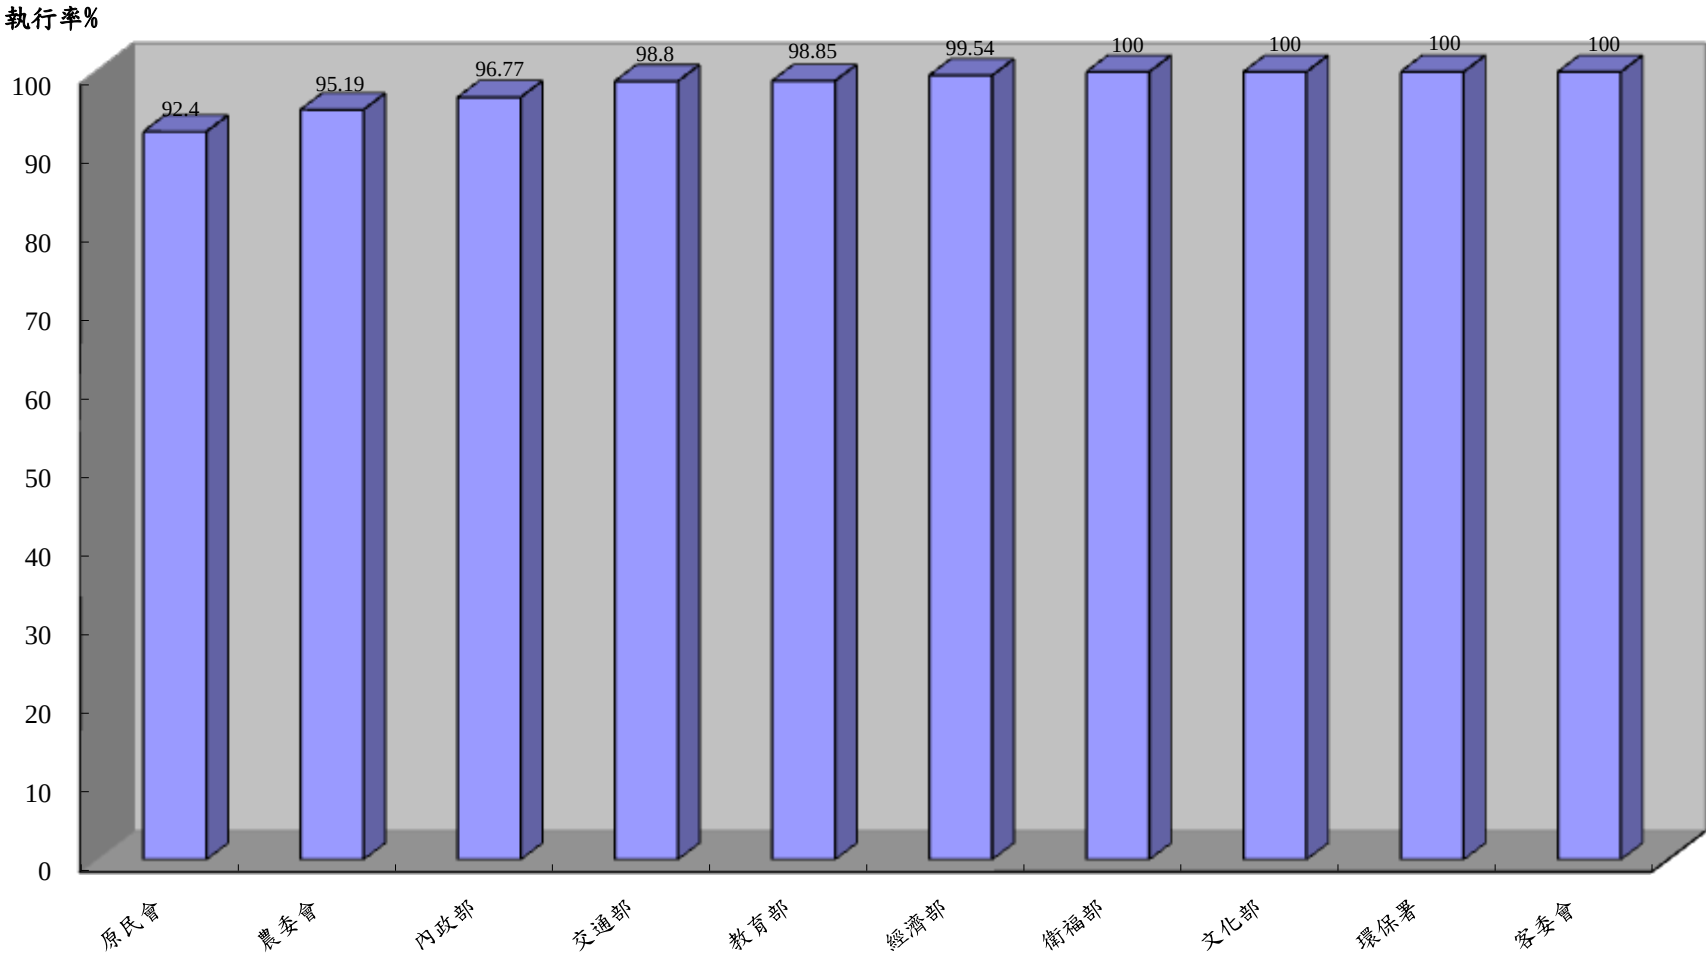

資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

行政院工程會列管莫拉克颱風災後重建工程各主管機關預算執行情形統計圖

附表2

莫拉克颱風災後重建進度落後20個百分點以上工程

資料截止日期：民國102年9月30日

單位：千元

項次	主管機關	主辦機關	工程名稱	核定經費	預定進度(%)	實際進度(%)	進度落後(百分點)	落後原因	機關因應改善措施	審計部處理情形
1	行政院農業委員會	行政院農業委員會林務局	森林鐵路60k+550~61k+450路基修復	453,780	51.43	25.00	26.43	本工程因受近期颱風豪雨影響，造成聯外道路或施工便道中斷，及隧道東洞口之設備及機具遭巨石砸毀導致落後。	主辦機關業於102年9月13日會勘完竣確認處理原則，正督促廠商積極趕辦。	業就落後情形函請農委會研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	行政院農業委員會	行政院農業委員會林務局	森林鐵路49k+780~50k+100路基修復	200,000	100.00	66.00	34.00	本工程因受近期颱風豪雨影響，造成施工便道中斷導致落後。	目前已清理完成恢復施工，正督促廠商積極趕辦。	業就落後情形函請農委會研謀因應措施，並督促積極辦理。
3	行政院農業委員會	行政院農業委員會林務局	森林鐵路58k+150~60k+550災害修復工程	12,000	65.99	15.00	50.99	本工程前因施工環境位於地勢險峻及堆積土層之崩塌區，且受近期颱風豪雨影響，造成前後施工便道中斷導致落後。	本工程業依契約條款規定辦理工期展延核准在案，並據以調整預定進度及實際進度。	業就落後情形函請農委會研謀因應措施，並督促積極辦理。
4	行政院原住民族委員會	臺東縣政府原住民族行政處	台東縣金峰鄉101年度振興農業-地方特色農產品加值開發計畫	3,500	100.00	40.00	60.00	金灣段興建集貨場部分已取得建築執照，惟歷坵段經臺東縣政府審核後須變更簡易水保計畫，致承包商尚未進場施作，影響工程進度。	協調承包商儘速進場施作金灣段集貨場，並依規定程序辦理歷坵段簡易水保計畫變更申請。	有關進度落後缺失，業已賡續列管追蹤其後續辦理情形。
