

115 年度公共工程委員會列管公共建設計畫經費執行情形

115 年度公共工程委員會列管公共建設計畫¹，截至第 1 季止計 301 項，分屬 19 個主管機關²，年計畫經費 7,124 億餘元，年累計分配經費 1,226 億餘元，年累計執行數 1,304 億餘元，年分配經費執行率 106.39%，各主管機關執行率未達 80% 者，有 2 個機關（詳附表 1、附圖 1）；各項計畫年分配經費執行率未達 80% 者，有 22 項計畫（詳附表 2³、附圖 2）；總分配經費執行率未達 80% 者，有 4 項計畫（同附表 2、詳附圖 3）。

¹係指行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）之當年度計畫經費達一億元以上之公共建設計畫。

²係指計畫主管機關，以下同。

³各項執行情形係依據公共工程委員會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就經費執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

115 年度公共工程委員會列管公共建設計畫各主管機關經費執行情形

115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管計畫項數	年計畫經費 (1)	年累計分配經費 (2)	實現數 (3)	已執行應付未付數 (4)	節餘數 (5)	預付數 (6)	年累計執行數 (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	年分配經費執行率 (%) (7)/(2)×100
合計		301	712,421	122,607	93,601	18,983	4	17,853	130,442	106.39
1	數位發展部	1	280	18	0	-	-	-	0	4.50
2	文化部	17	8,461	512	299	62	-	40	401	78.30
3	農業部	20	46,019	6,379	3,913	1,277	0	585	5,775	90.53
4	客家委員會	3	625	73	20	47	-	-	67	92.42
5	海洋委員會	4	3,773	592	460	99	-	-	559	94.44
6	衛生福利部	13	12,824	2,190	345	1,791	-	6	2,142	97.80
7	國家發展委員會	4	2,303	388	119	222	-	39	381	98.14
8	環境部	5	3,497	398	213	179	-	-	393	98.76
9	國立故宮博物院	1	2,397	1,009	97	26	-	878	1,002	99.32
10	運動部	3	4,836	1	1	-	-	-	1	100.00
11	交通部	96	280,471	53,455	36,077	4,993	-	12,715	53,786	100.62
12	內政部	17	47,828	9,646	5,838	848	3	3,533	10,223	105.99
13	核能安全委員會	1	184	184	0	157	-	39	197	106.87
14	國家科學及技術委員會	13	30,489	4,362	4,810	91	-	-	4,901	112.35
15	教育部	19	14,658	1,279	1,231	247	-	-	1,478	115.62
16	經濟部	65	238,238	40,579	38,287	8,885	0	-	47,173	116.25
17	國防部	9	10,497	818	1,031	-	-	-	1,031	126.00
18	國軍退除役官兵輔導委員會	5	3,653	691	838	38	-	15	892	129.09
19	原住民族委員會	5	1,378	23	15	15	-	-	30	129.36

註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

2. 年計畫經費係指全年計畫可支用經費，包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金等。


3. 本表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

4. 國家科學及技術委員會、國防部及國軍退除役官兵輔導委員會實現數大於年累計分配經費，係部分計畫執行進度超前，主辦機關（基金）調整經費支應所致。

附圖 1

115 年度公共工程委員會列管公共建設計畫各主管機關經費執行情形

115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

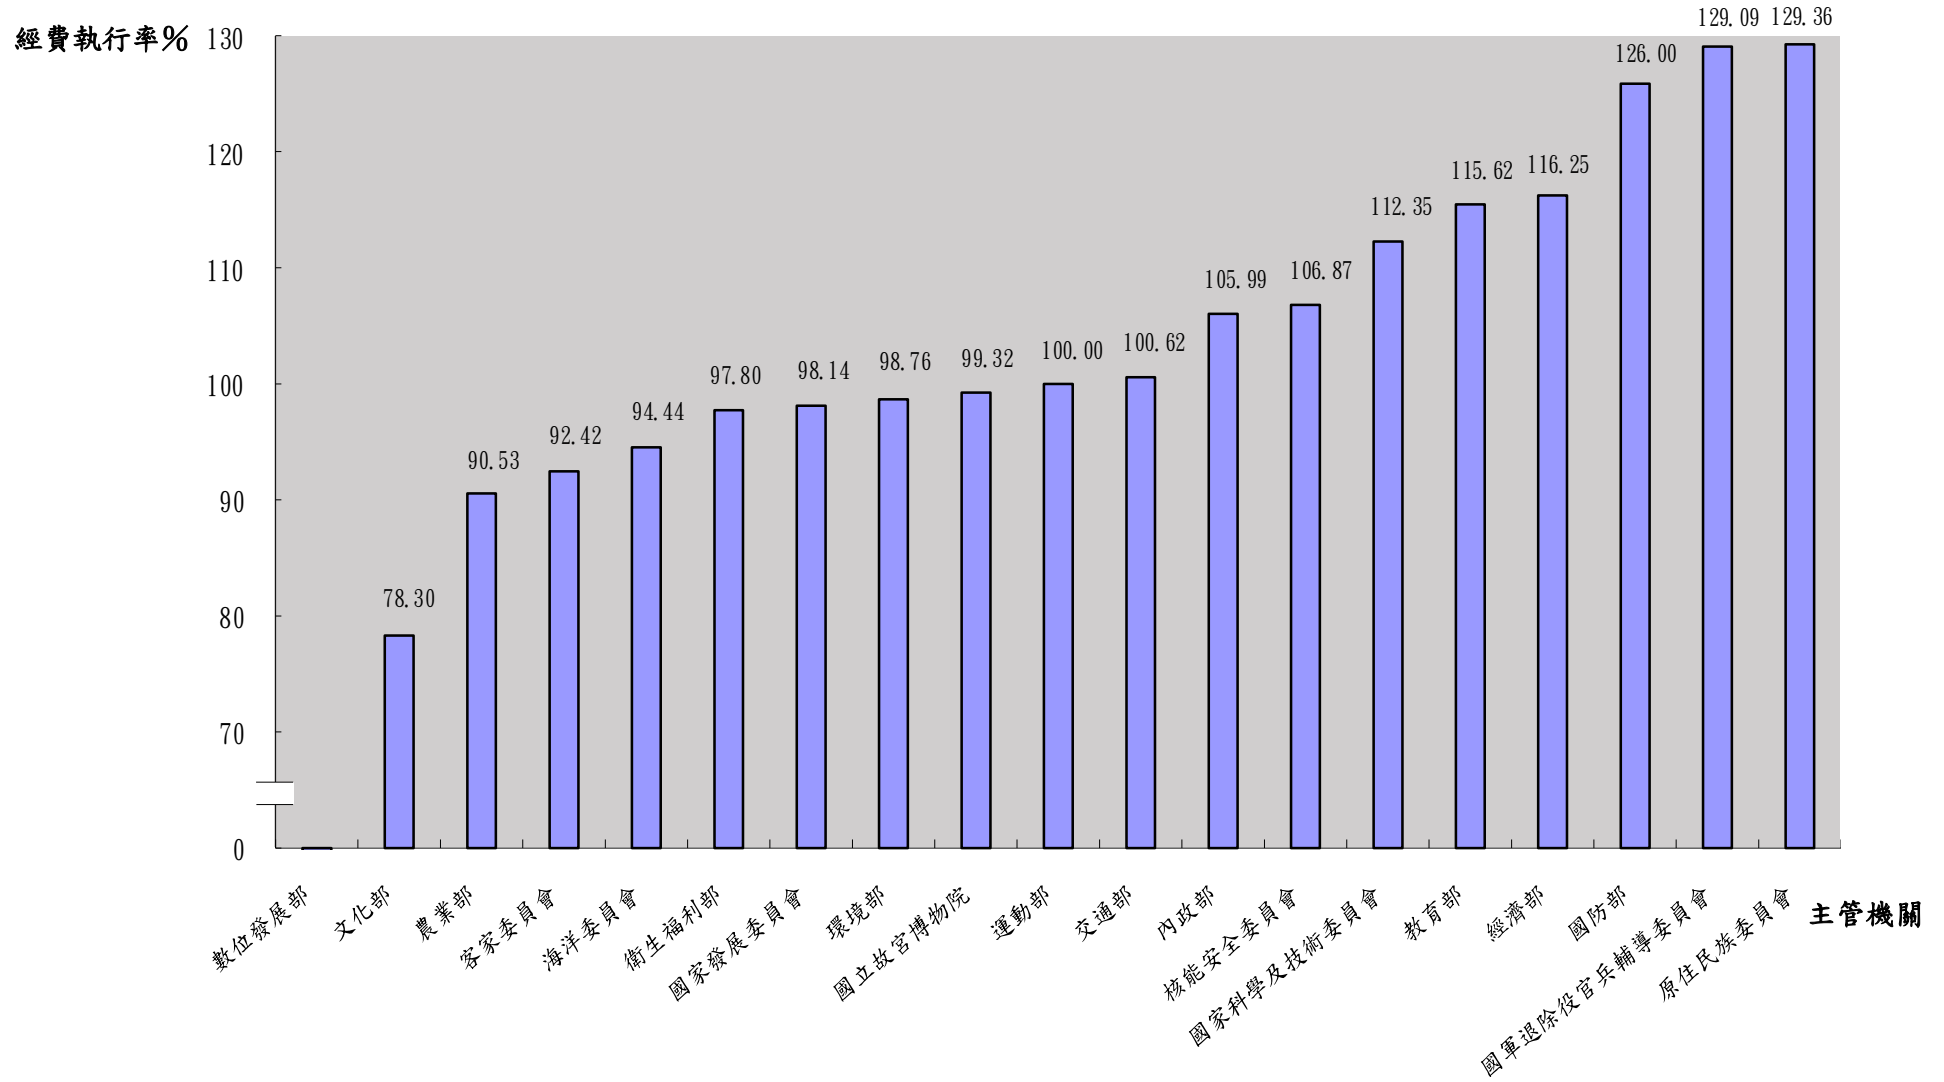

監督115年度公共工程委員會列管公共建設計畫
年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形

115年1月1日至3月31日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)x100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)x100	落後原因	審計部處理情形
1	文化部	文化部	空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫(115-117年)	11501-11712	804,123	行政院	辦理古蹟與歷史建築修復再利用工程及全區綜合業務、推廣與行銷宣傳活動及實驗創新計畫等作業。	118,000	90,326	-	-	90,326	-	-	因計畫修正作業不如預期所致。	業就文化部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
2	交通部	交通部	氫燃料電池大客車示範運行計畫	11401-11512	120,000	行政院	實現零排放交通，補足電動巴士續航與補能瓶頸，帶動氫能產業鏈技術升級，完善法規標準，加速國家能源轉型與淨零目標。	115,200	41,200	-	-	46,000	4,800	10.43	因加氫站建置作業延遲所致。	業就交通部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
3	原住民族委員會	原住民族委員會	原住民族經濟永續發展計畫(115-118年)	11501-11512	211,800	行政院	推動部落參與淨零轉型，提升部落淨零治理體系中主體地位；推動原住民族產業高值化與綠色化；協助原住民族企業強化經營體質；提升經濟自立與市場競爭力。	211,800	10,590	-	-	10,590	-	-	因補助申請案件審查作業不如預期，影響執行進度所致。	業就原住民族委員會所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
4	教育部	教育部	國立臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	10801-11812	4,326,000	行政院	提供學生教學研究空間及多功能運動中心，並解決校內停車位不足問題。	53,171	2,000	-	-	105,668	103,668	98.11	因招標作業多次流標所致。	業就教育部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
5	經濟部	經濟部產業園區管理局	高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	11101-11712	2,603,338	行政院	配合政府大南方新矽谷與亞灣2.0智慧科技創新區政策，結合嘉義、臺南、高雄至屏東等地產業與科技園區資源，打造半導體廊帶南部核心。	1,059,845	16,944	43	0.25	1,332,357	1,315,456	98.73	因結構銜銜關鍵工項工程進場延遲所致。	業就該案落後情形函請經濟部督促所屬確實檢討進度落後原因，並研提具體改善措施，以提升計畫執行效率。
6	經濟部	經濟部產業技術司	先進半導體研發基地建置中長期個案計畫	11401-11612	688,000	行政院	透過建立先進半導體研發基地，培育先進製程技術與人才，以強化我國全球半導體供應鏈之關鍵地位。	268,520	42,963	1,789	4.16	263,507	222,333	84.37	因申請建造執照進度不如預期，影響執行進度所致。	業就該案落後情形函請經濟部督促所屬確實檢討進度落後原因，並研提具體改善措施，以提升計畫執行效率。
7	數位發展部	數位發展部資通安全署	政府數位韌性強化計畫	11401-11812	1,138,028	行政院	強化資安聯防運作機制，以提升整體防護效能；接軌國際資安防護趨勢，強化防護新興資安威脅能力；強化偏鄉通訊網路可用性。	280,413	18,658	839	4.50	178,806	160,987	90.03	因本案係屬新興計畫，預算尚待通過使得動支，影響預算執行所致。	業就數位發展部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
8	文化部	文化部	地方藝文場館、博物館與地方文化館深耕計畫	11401-11812	4,690,000	行政院	整建地方館舍既有建築與空間、充實地方館舍專業展示與設備建置、推動地方文化區域治理、鼓勵地方館舍連結與多元文化發展。	573,006	40,000	8,891	22.23	547,257	516,148	94.32	因補助地方經費撥付作業進度不如預期所致。	業就文化部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
9	經濟部	台灣電力股份有限公司	霧社水庫防淤工程計畫	11001-12003	6,280,000	行政院	改善霧社水庫淤積問題，完工後可增加霧社水庫排淤能力，減少水庫淤積並提升中部地區供水穩定。	711,010	111,011	27,513	24.78	1,801,398	1,717,900	95.36	因沖銷以前年度溢提款項產生負責績所致。	業就該案落後情形函請經濟部督促所屬確實檢討進度落後原因，並研提具體改善措施，以提升計畫執行效率。
10	交通部	交通部公路局	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	10301-11502	23,038,000	行政院	通車後可縮短淡水與八里間車程，有效分擔台2線竹圍段及關渡大橋車流。	2,801,748	606,573	211,080	34.80	20,628,986	20,233,493	98.08	因天候影響，工程施作進度不如預期所致。	業就交通部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
11	農業部	農業部農糧署	建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)	11401-11712	5,881,000	行政院	輔導產地端升級冷鏈設施(備)，降低食品安全風險；更新檢疫處理設備，提高設備效能及精確度。	2,318,269	427,916	197,544	46.16	831,415	601,043	72.29	因廠商出工人力及機具量不足所致。	業就農業部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
12	衛生福利部	衛生福利部食品藥物管理署	食品安全建設計畫	10609-12012	7,491,521	行政院	提升我國食品安全，推動「食品安全建設」，以精進國內邊境查驗、地方稽查與中央研發及食安事件之檢驗能力。	2,452,458	12,874	6,254	48.58	3,646,906	3,640,286	99.82	因本(115)年度預算尚未通過，影響預算執行所致。	業就衛生福利部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
13	農業部	農業部農糧署	建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系	11001-11412	9,555,849	行政院	建構農業安全體系與農產品現代化冷鏈物流營運模式，減少農產品損耗、調節產銷，並提供消費者新鮮安全農產品，配合新農業拓展國內外農產品多元市場政策，確保農產品供貨質量，強化我國優良農產品品牌形象，提高運銷效率、提升農產品價格，增進農民收益。	877,923	263,498	138,212	52.45	8,941,424	8,816,138	98.60	因廠商出工人力及機具量不足所致。	業就農業部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
14	教育部	教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	10801-11709	1,212,824	行政院	提升臺大醫院服務品質形象，徹底解決既有東址外牆日益老化掉落問題，使民眾可安心就醫。	120,000	8,000	4,303	53.79	756,000	752,303	99.51	因發生重大職安意外遭處勒令停工，及因天候影響，高空作業項目施工不如預期等，影響工程執行進度所致。	業就教育部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
15	文化部	國家人權博物館	國家人權博物館中程計畫	10501-11712	3,400,685	行政院	透過博物館的展示及相關活動，讓參訪者認知得來不易的民主價值與民主生活方式的珍貴性與重要性。	587,044	66,810	37,232	55.73	1,787,285	1,757,707	98.35	因後續擴充契約變更作業進度不如預期所致。	業就文化部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
16	經濟部	台灣電力股份有限公司	台中電廠第二期新建燃氣機組計畫	11401-12412	428,132,211	行政院	達成計畫增氣減煤及供電穩定之目標。	728,715	38,583	24,032	62.29	335,330	320,779	95.66	因工程間接費較預計減少，影響預算執行所致。	業就該案落後情形函請經濟部督促所屬確實檢討進度落後原因，並研提具體改善措施，以提升計畫執行效率。
17	交通部	交通部	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	10504-11912	98,264,000	行政院	透過捷運串聯桃園、八德與航空城建構環狀路網，以縮短通勤時間，並帶動產業升級與都市更新，打造永續宜居之國際航空城市。	7,680,176	1,104,984	720,624	65.22	65,230,875	64,846,515	99.41	因尚待整清預付款繳回作業細節，影響預算執行所致。	業就交通部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
18	文化部	兒童文化館	國家兒童未來館興建計畫	11008-11912	16,494,660	行政院	打造具台灣在地文化特色之兒童沉浸式體驗場域，吸引國內外旅客前往並帶動周邊商機發展。	248,580	12,181	7,987	65.57	525,080	520,886	99.20	因招標作業延遲所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
19	經濟部	經濟部國際貿易署	臺中水湳國際會展中心西側展館	11304-12012	6,025,530	行政院	創造就業機會、提供舉辦大型專業展覽與多元活動之空間，並提升周邊關聯產業經濟產值，帶動中部地區經濟發展。	48,148	7,628	5,117	67.08	34,402	31,891	92.70	因專案管理勞務採購作業不如預期，影響統包工程執行進度所致。	業就該案落後情形函請經濟部督促所屬確實檢討進度落後癥結原因，並研提具體改善措施，以提升計畫執行效率。
20	教育部	教育部	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	10701-11512	5,711,458	行政院	均衡南北圖書資源之建設，提升南部地區圖書館服務質量；建設國家圖書館永續發展環境，提升圖書服務能量等。	2,996,362	242,970	163,804	67.42	2,956,591	2,877,425	97.32	因缺工、變更設計進度不如預期所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
21	農業部	農業部	農村再生第四期實施計畫(113-116年)	11301-11612	43,228,200	行政院	提升農村人口質量，創造農村就業機會；提高農村居民所得，改善農村整體環境。	11,049,394	1,289,369	902,862	70.02	20,199,611	19,813,104	98.09	因補助計畫尚未達撥款條件，影響預算執行所致。	業就農業部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
22	農業部	農業部農業科技園區管理中心	桃園農業物流加工園區建設計畫(110-115年)	11001-11512	3,218,000	行政院	解決國內觀賞水族、蔬果、花卉及水(畜)產品出進口運銷冷鏈斷鏈問題，提升農畜產及食品類冷鏈物流環境。	377,889	88,207	63,402	71.88	2,078,174	2,053,369	98.81	因變更設計作業進度不如預期所致。	業就農業部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。


2. 本表內數值為零者，以「-」表示。

附圖 2

115 年度公共工程委員會列管公共建設計畫 年分配經費執行率未達 80% 之計畫

115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

經費執行率 %

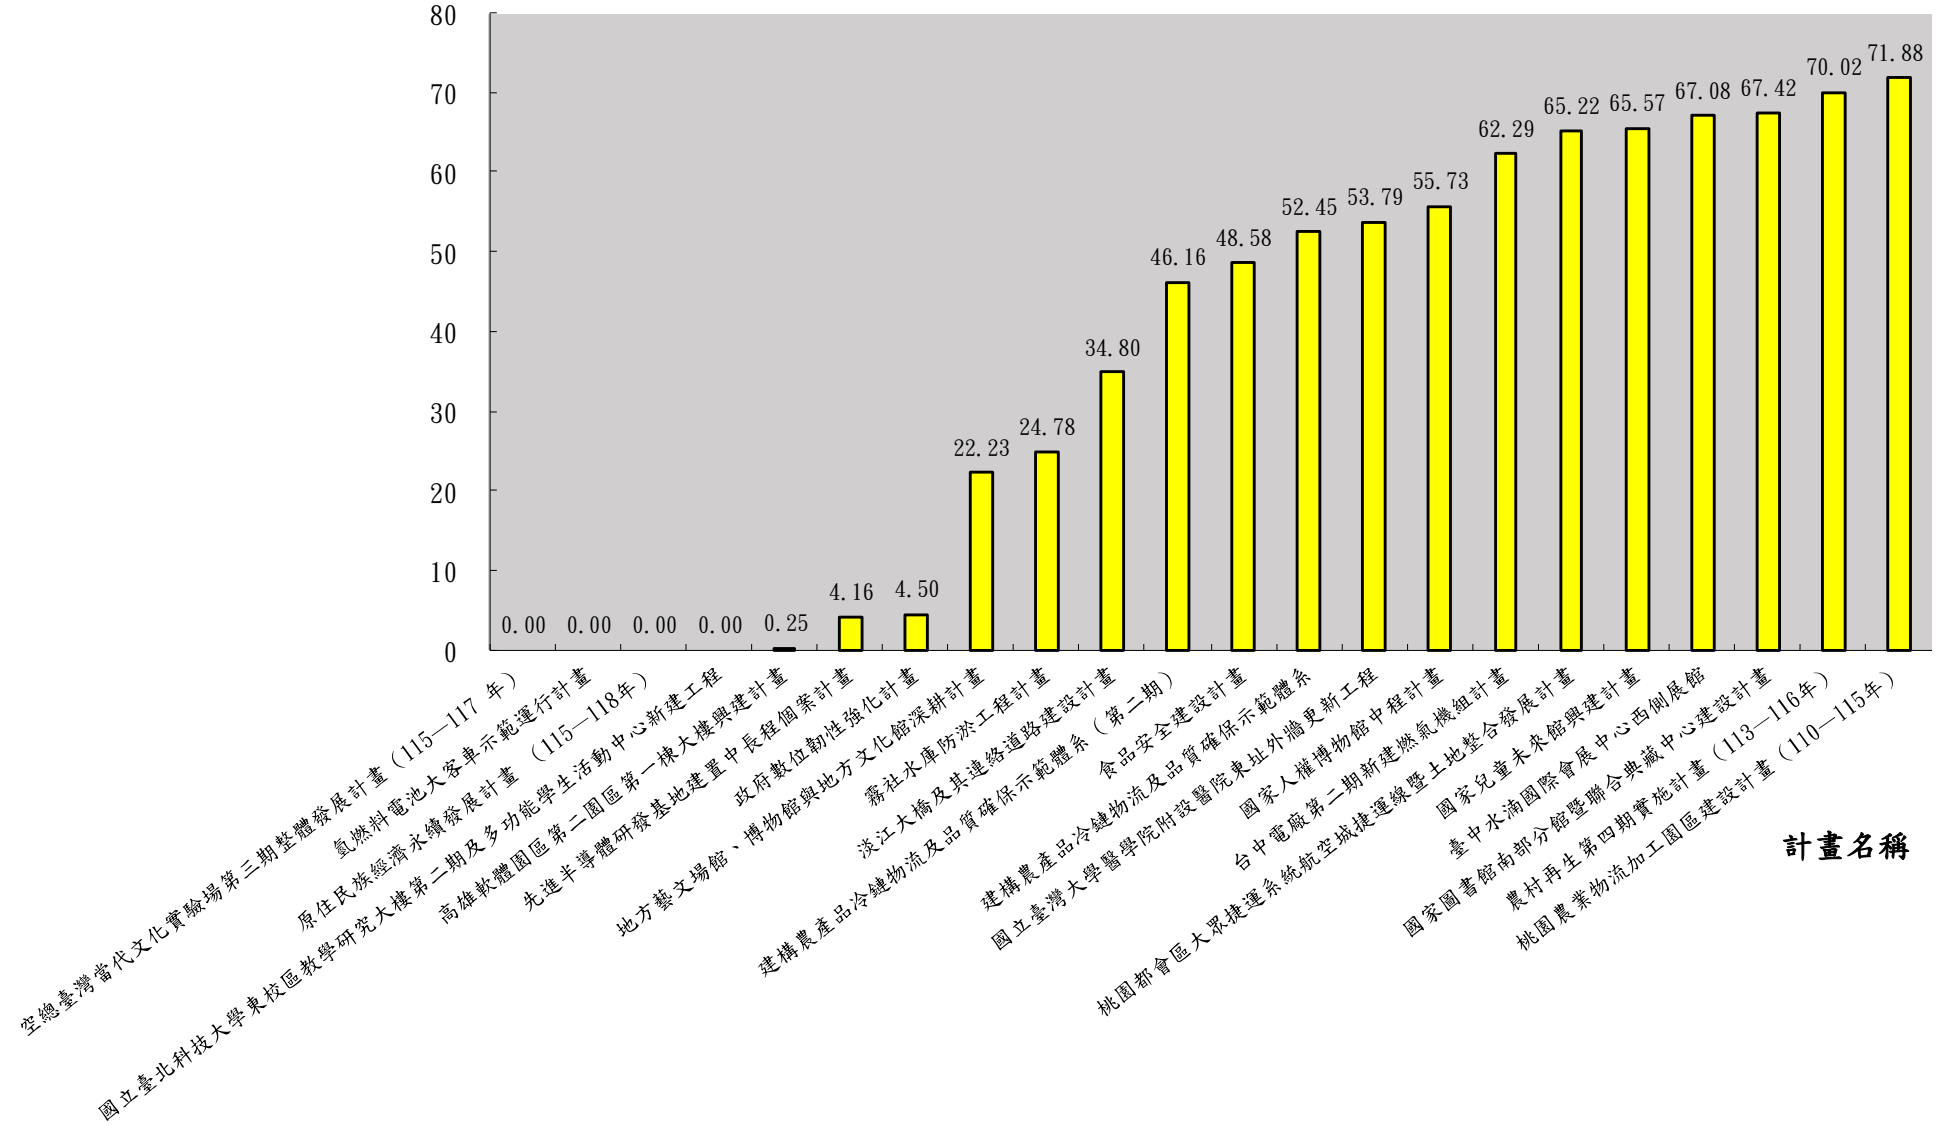

附圖 3

115 年度公共工程委員會列管公共建設計畫 總分配經費執行率未達 80% 之計畫

