

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算執行情形

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，實施期程自 114 年 11 月 11 日起至 119 年 12 月 31 日止，全部歲出預算數 270 億元，所需經費全數舉借債務支應。其預算執行情形如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至 115 年度第 1 季止，累計實現數 1 萬餘元，係水利署辦理工程採購罰款收入。

二、歲出

全部歲出預算數 270 億元，分由經濟部、農業部及交通部等 8 個主管機關執行，共計辦理 28 項業務計畫、31 項工作計畫。截至 115 年度第 1 季止，累計實現數 37 億 3,846 萬餘元，占累計分配預算數 54 億 2,668 萬餘元之 68.89%。各主管機關已實現比率¹未達 80% 者，計有衛生福利部、公共工程委員會、環境部、經濟部、農業部、交通部及內政部等 7 個機關（詳附表 1、附圖 1），各項工作計畫已實現比率未達 80% 者，計有 22 項（詳附表 2、附圖 2），截至 115 年度第 1 季止，累計實現數如加計預付數 1 億 3,257 萬餘元，合計 38 億 7,104 萬餘元，占累計分配預算數之 71.33%。

三、融資調度

債務之舉借預算數 270 億元，截至 115 年度第 1 季止，尚無實現數，該特別預算歲出經費需求，由國庫先行統籌調度。

¹已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算歲出執行情形

114 年 12 月 19 日至 115 年 3 月 31 日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註 3)		累計實現數占累計分配預算數 未達 80% 落後原因	審計部處理情形	預付數 (註 4)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
合	計	27,000	5,426	3,738	68.89			132	3,871	71.33
1	衛生福利部	36	18	—	—	主要係醫事機構建築物災後復建及醫療儀器災損復原等補助作業辦法尚在研擬中所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請衛生福利部檢討改進。	—	—	—
2	公共工程委員會	137	5	0	13.49	主要係約用人員尚未足額進用及部分採購案件未達撥款條件所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	0	1	23.31
3	環境部	4,200	590	372	63.14	主要係自辦或補助花蓮縣及各支援縣市租賃災害環境復原機具、人員僱用或加班差勤等項目，實際需求較預計減少所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	372	63.14
4	經濟部	9,091	2,394	1,554	64.91	主要係系統性治理工程發包或施工進度落後，暨馬太鞍溪及花蓮溪水系相關主流疏濬工程，部分案件尚未完成撥款作業所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	56	1,610	67.26
5	農業部	4,306	646	440	68.11	主要係馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖工程，尚未完成估驗及驗收作業所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	75	515	79.72

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註4)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
6	交通部	4,420	772	575	74.48	主要係辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案，尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	575	74.48
7	內政部	2,841	760	577	75.91	主要係災害初期緊急清淤及災後復原工作，未及辦理請款核銷所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	0	577	76.01
8	原住民族委員會	467	239	217	91.05			—	217	91.05
9	預備金(註6)	1,500	—	—	--			—	—	--

- 註：1. 本表係依據各機關 115 年 3 月份中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。
2. 本表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。
3. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。
4. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。
5. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。
6. 預備金 15 億元，截至 115 年 3 月底止尚未動支。

附表 2

監督中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算各項工作計畫預算執行情形

114 年 12 月 19 日至 115 年 3 月 31 日

單位：百萬元

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預 算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
合計			27,000	5,426	3,738	68.89			132	3,871	71.33
1	原住民族委員會	觀光產業促進	40	6	—	—	主要係補助市縣政府辦理原住民族經濟復甦及產業促進案件，尚在審查中所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	—	—
2	交通部	道路及交通	140	5	—	—	主要係辦理「臺東線鐵路 k146+100 上邊坡緊急搶修加固工程」之工進尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	—	—
3	衛生福利部	社會復原及產業促進	36	18	—	—	主要係災後復原重建計畫經行政院於 115 年 3 月 16 日核定，尚在研擬醫事機構建築物災後復建及醫療儀器災損復原等補助作業辦法所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請衛生福利部檢討改進。	—	—	—
4	農糧署及所屬	農業復原	360	102	—	—	主要係辦理農民專案休耕及農地受損復原重建等補助措施，部分申請案尚在審查中，或尚未核銷轉正所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	75	75	73.12

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預 算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
5	產業發展署	社會復原及產業促進	20	3	—	—	主要係辦理產業競爭力整合服務增值計畫尚未核銷轉正所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	3	3	100.00
6	資源循環署	環境衛生復原	2,700	50	0	0.03	主要係補助地方政府辦理「0923 馬太鞍溪堰塞湖溢流砂土夾雜廢棄物分選計畫」，申請案件尚未核定所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	0.03
7	商業發展署	社會復原及產業促進	30	6	0	0.29	主要係辦理災後商業活化振興計畫，尚未完成廠商遴選作業所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	0.29
8	原住民族委員會	家園及公共設施	200	15	0	0.47	主要係補助市縣政府辦理原住民族部落相關場域災後重建及周邊公共設施復建案件，尚在執行中所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	0.47
9	國土管理署及所屬	道路及交通	650	111	3	3.25	主要係災害初期緊急清淤及災後復原工作，未及辦理請款核銷所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	3	3.25
10	公共工程委員會	復原重建統籌協調業務	137	5	0	13.49	主要係約用人員尚未足額進用及部分採購案件未達撥款條件所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	0	1	23.31

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預 算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	經濟部	社會復原及產業促進	166	166	45	27.59	主要係撥補事業辦理災區設備毀損修繕、提供緊急救災用油及受災戶用電減免措施等經費，尚未辦理核銷所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	45	27.59
12	林業及自然保育署及所屬	農業復原	920	1	0	42.00	主要係部分計畫尚在審核中，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	42.00
13	國土管理署及所屬	家園安置業務	302	89	38	43.53	主要係辦理中繼屋第1階段新建工程，實際需求較預計減少所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	0	39	44.36
14	公路局及所屬	社會復原及產業促進	350	350	161	46.00	主要係辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案，尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	161	46.00
15	中小及新創企業署	社會復原及產業促進	20	0	0	47.34	主要係部分融資利息補貼申請件數未如預期所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	47.34
16	農業部	復原重建統籌協調業務	8	8	4	57.54	主要係供應前進協調所相關物資，實際需求較預計減少所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	4	57.54

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預 算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
17	林業及自然保 育署及所屬	馬太鞍溪堰塞 湖整治相關工 程	1,430	205	118	58.04	主要係辦理馬太鞍溪堰 塞湖壩體降挖工程，尚 未完成估驗及驗收作 業所致。	審計部將賡續注 意後續辦理情形。	0	119	58.08
18	國土管理署及 所屬	水利設施	1,389	59	34	58.37	主要係補助花蓮縣政府 辦理光復鄉雨水下水道 系統災後清淤尚未完成 驗收，及改建工程多次 流標，執行進度落後所 致。	審計部將賡續注 意後續辦理情形。	—	34	58.37
19	經濟部	自來水、瓦斯及 燃氣設施	95	21	13	63.03	主要係撥補台水公司 辦理災區供水設備毀 損修繕與強化供水韌 性等經費，尚未辦理核 銷所致。	審計部將賡續注 意後續辦理情形。	—	13	63.03
20	水利署及所屬	水利設施	8,500	2,197	1,494	68.02	主要係系統性治理工程 發包或施工進度落後， 暨馬太鞍溪及花蓮溪水 系相關主支流疏濬工 程，部分案件尚未完成 撥款作業所致。	審計部將賡續注 意後續辦理情形。	53	1,547	70.44
21	環境管理署	環境衛生復原	1,500	540	372	69.00	主要係自辦或補助花 蓮縣及各支援縣市租 賃災害環境復原機 具、人員僱用或加班差 勤等項目，實際需求較 預計減少所致。	審計部將賡續注 意後續辦理情形。	—	372	69.00

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預 算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
22	農業金融署	社會復原及產業促進	29	5	3	70.66	主要係貸款展延利息補貼，因部分案件尚未完成核算，預算執行未如預期所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	3	70.66
23	農田水利署	農業復原	1,080	75	63	84.22			—	63	84.22
24	林業及自然保育署及所屬	復原重建統籌協調業務	2	2	2	85.01			—	2	85.01
25	公路局及所屬	道路及交通	3,930	417	414	99.33			—	414	99.33
26	原住民族委員會	貸款及利息補貼	217	217	217	100.00			—	217	100.00
27	農業部	農業復原	386	178	178	100.00			—	178	100.00
28	農業部	社會復原及產業促進	91	69	69	100.00			—	69	100.00
29	國土管理署及所屬	馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰問金	500	500	500	100.00			—	500	100.00
30	經濟部	電力系統	260	—	—	--			—	—	--

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預 算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
31	原住民族委員會	社會扶助	10	—	—	--			—	—	--
32	預備金(註6)		1,500	—	—	--			—	—	--

註：1. 本表係依據各機關 115 年 3 月份中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。

2. 本表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

3. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

4. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

5. 本表係按累計實現數占累計分配數%由最低至最高之順序排列。


6. 預備金 15 億元，截至 115 年 3 月底止尚未動支。

附圖 1

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算各主管機關歲出執行情形

114 年 12 月 19 日至 115 年 3 月 31 日

已實現比率%

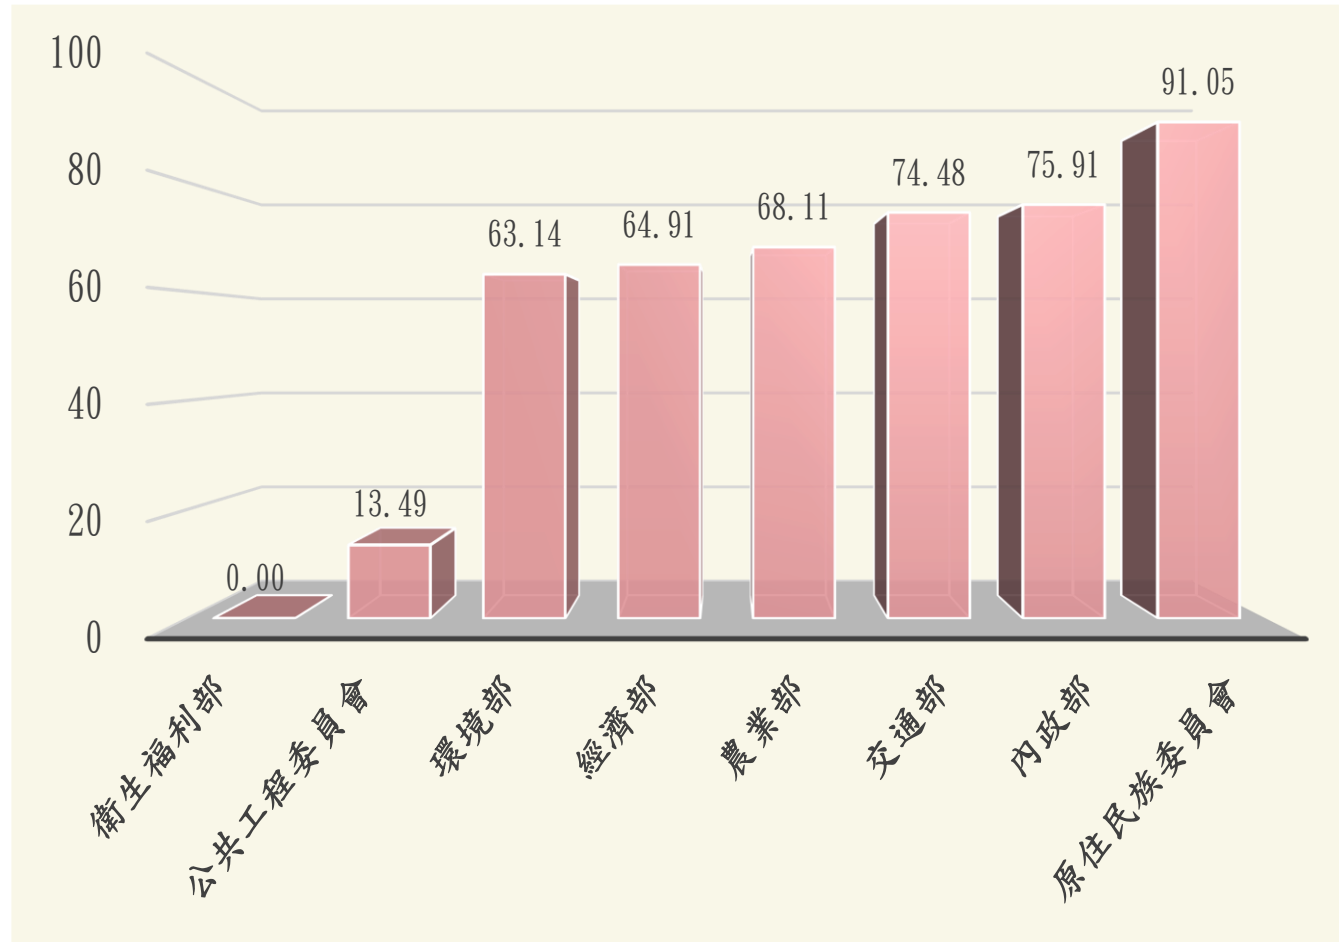


主管機關

附圖 2

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算歲出已實現比率未達 80% 之工作計畫

114 年 12 月 19 日至 115 年 3 月 31 日

已實現比率%

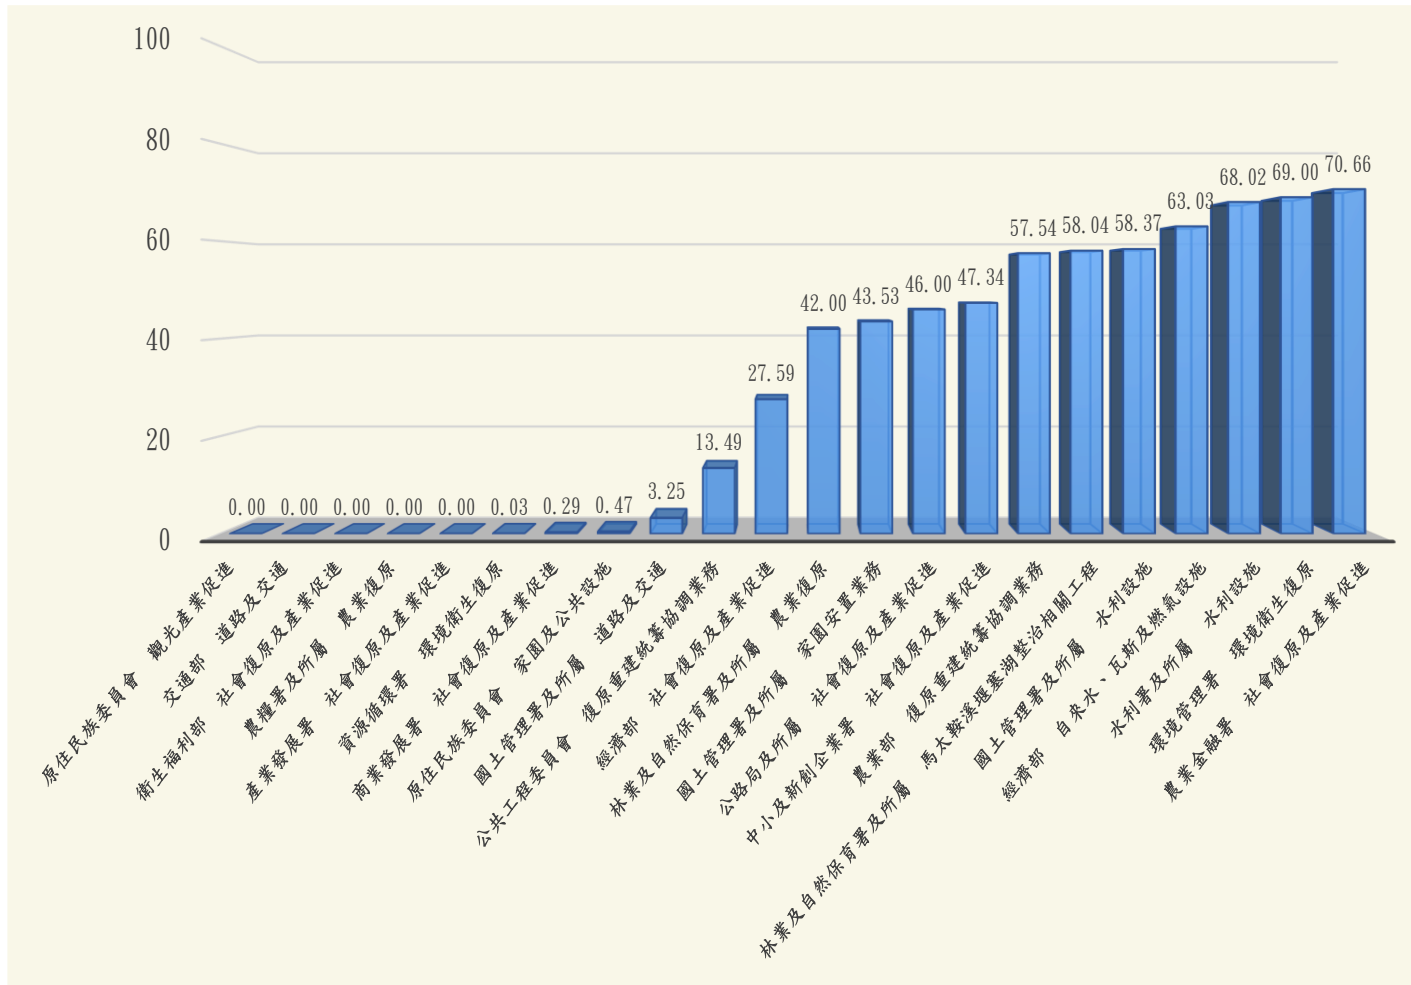

機關計畫
