

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算，執行期間自 112 至 113 年度止，分 2 個年度實施，全部歲出預算數 2,098 億餘元，全數以舉借債務支應。截至 113 年度第 2 季止，執行情形如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至 113 年度第 2 季止，累計實現數 1 億 9,400 萬餘元，主要係內政部國土管理署及交通部公路局等刨除料變賣收入。

二、歲出

全部歲出預算數 2,098 億餘元，分由總統府、國家發展委員會及內政部等 19 個主管機關執行，共計辦理 141 項業務計畫，192 項工作計畫。截至 113 年度第 2 季止，累計實現數 1,107 億餘元，占累計分配預算數 1,426 億餘元之 77.59%。各主管機關已實現比率¹未達 80%者，計有勞動部、國家發展委員會、客家委員會及所屬、衛生福利部、核能安全委員會及所屬、農業部、文化部、交通部、原住民族委員會、教育部、財政部及環境部等 12 個機關（詳附表 1、附圖 1），各項工作計畫已實現比率未達 80%者，計有 65 項（詳附表 2、附圖 2），截至 113 年度第 2 季止，累計實現數如加計預付數 166 億餘元，合計 1,273 億餘元，占累計分配預算數之 89.26%。

三、融資調度

債務之舉借預算數 2,098 億餘元，截至 113 年度第 2 季止，尚無實現數，該特別預算歲出經費需求，由國庫先行統籌調度。

¹ 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出執行情形

112 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
	合計	209,832	142,678	110,706	77.59			16,647	127,353	89.26
1	勞動部	14	4	—	—	主要係公有危險建築補強重建計畫補助案，地方政府尚未請領補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
2	國家發展委員會	2,821	1,770	753	42.59	主要係亞洲矽谷相關委託案，預付款未達核銷轉正條件，及行政法人雙語國家發展中心設置條例草案尚未經立法院審議通過，相關經費無法支用等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	511	1,265	71.51
3	客家委員會及所屬	866	654	347	53.08	主要係補助地方政府辦理客庄 369 幸福計畫，部分案件執行進度未達經費核銷條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	267	615	93.93
4	衛生福利部	4,484	2,439	1,388	56.91	主要係委辦現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫，尚未完成經費核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	313	1,701	69.76

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
5	核能安全委員會及所屬	377	253	181	71.44	主要係微電網太陽能系統建置採購案尚執行中，未完成結報所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	72	253	99.96
6	農業部	6,598	4,304	3,082	71.61	主要係阿里山林業鐵路車廂購置案基本設計尚未完成審查，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	557	3,640	84.58
7	文化部	5,512	3,814	2,763	72.47	主要係超高畫質內容創新應用等計畫，刻正辦理結案審查作業，預付款尚未核銷轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	527	3,290	86.29
8	交通部	69,978	45,383	33,128	73.00	主要係花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，尚未辦理驗收或核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	6,767	39,896	87.91
9	原住民族委員會	1,738	1,283	948	73.88	主要係補助地方政府辦理原民部落營造計畫，部分案件執行進度未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	25	974	75.88
10	教育部	12,312	8,948	6,631	74.10	主要係2030雙語教育政策計畫，部分補助經費尚未核定所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	125	6,756	75.50
11	財政部	333	181	134	74.19	主要係補助地方稅捐稽徵機關辦公廳舍耐震補強工程，部分尚辦理規劃設計中，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	134	74.19

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
12	環境部	1,152	716	560	78.30	主要係環境品質監測及預報作業技術合作協議案，執行進度尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	76	636	88.96
13	內政部	23,267	16,285	13,218	81.17			2,246	15,465	94.96
14	經濟部	58,810	42,604	34,701	81.45			4,628	39,329	92.31
15	數位發展部	15,867	10,271	9,176	89.34			460	9,637	93.82
16	總統府	194	130	124	95.58			0.2	124	95.75
17	國立故宮博物院	59	37	36	97.80			—	36	97.80
18	國家科學及技術委員會	5,400	3,572	3,505	98.13			66	3,572	100.00
19	公共工程委員會	42	19	19	100.00			—	19	100.00

- 註：1. 本表係依據各機關113年6月份中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。
2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。
3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。
4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附表 2

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算各項工作計畫預算執行情形

112 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註 2）		累計實現數占累計分 配預算數未達 80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註 3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
合計			209,832	142,678	110,706	77.59			16,647	127,353	89.26
一、軌道建設			53,730	35,222	24,766	70.32			4,991	29,758	84.49
1	鐵道局及所屬	都市推動捷運	977	517	73	14.29	主要係機場捷運增設 機場第三航廈站(A14 站)計畫，部分標案決 標日期較預計落後所 致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	395	469	90.61
2	鐵道局及所屬	臺鐵升級及改 善東部服務	6,736	6,369	1,431	22.47	主要係花東地區鐵路 雙軌電氣化計畫，尚 未辦理驗收或核銷作 業所致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	2,588	4,020	63.11
3	林業及自然保 育署及所屬	中南部觀光鐵 路	2,315	1,190	468	39.33	主要係阿里山林業鐵 路車廂購置案基本設 計尚未完成審查，執 行進度未如預期所 致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	342	810	68.10
4	交通部	臺鐵升級及改 善東部服務	5,891	2,070	826	39.93	主要係臺鐵電務智慧 化提升計畫相關工 程，因沿線鐵路電務 設備整合及審查程序	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	826	39.93

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							繁雜，規劃設計時程較長所致。				
5	鐵道局及所屬	軌道規劃作業	132	60	39	65.13	主要係高鐵延伸屏東規劃作業，尚未完成二階環境影響調查招標作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	39	65.13
6	鐵道局及所屬	鐵路立體化及通勤提速	14,855	11,324	9,126	80.59			1,665	10,792	95.30
7	交通部	都市推動捷運	22,144	13,277	12,407	93.45			—	12,407	93.45
8	經濟部	中南部觀光鐵路	250	250	236	94.71			—	236	94.71
9	交通部	中南部觀光鐵路	350	150	143	95.97			—	143	95.97
10	交通部	高鐵臺鐵連結成網	76	12	12	100.00			—	12	100.00
二、水環境建設			45,064	33,136	26,667	80.48			3,996	30,664	92.54
1	水利署及所屬	水與環境	594	415	111	26.88	主要係部分工程進度未如預期，或已符合請款條件，尚未完成請款核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	116	228	54.99
2	農業部	水與環境	96	35	10	29.90	主要係工程選址遭民眾陳情抗議，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	10	29.90

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
3	水利署及所屬	水與安全	17,357	10,687	7,312	68.42	主要係部分工程因地方政府未備妥請款資料或受氣候影響，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2,518	9,830	91.98
4	農村發展及水土保持署及所屬	水與安全	1,229	1,004	780	77.69	主要係宜蘭縣南澳鄉碧候社區旁野溪排水治理改善工程，進度未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	206	986	98.26
5	環境部	水與環境	199	120	100	83.02			—	100	83.02
6	水利署及所屬	水與發展	18,383	15,988	13,710	85.75			993	14,703	91.96
7	漁業署及所屬	水與環境	149	115	103	89.92			—	103	89.92
8	林業及自然保育署及所屬	水與安全	237	152	138	91.06			—	138	91.06
9	國土管理署及所屬	水與安全	5,379	3,559	3,368	94.63			162	3,530	99.18
10	農田水利署	水與安全	651	495	478	96.61			—	478	96.61
11	漁業署及所屬	水與安全	382	242	235	97.44			—	235	97.44
12	觀光署及所屬	水與環境	200	145	142	98.17			—	142	98.17

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
13	國土管理署 及所屬	水與環境	99	93	92	99.31			0.05	92	99.37
14	公路局及所屬	水與安全	104	82	82	99.82			0.1	82	99.99
三、綠能建設			12,648	8,133	6,687	82.22			236	6,923	85.13
1	公路局及所屬	綠能建設	970	362	60	16.58	主要係地方政府尚辦理招標文件、管線配置及會勘等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	77	137	38.00
2	國家發展委員會	綠能建設	198	130	75	57.93	主要係淨零公正轉型相關委託研究等案件，尚辦理招標作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	75	57.93
3	地質調查及礦業管理中心	綠能建設	159	98	63	64.18	主要係委辦計畫尚辦理議價簽約程序等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	63	64.18
4	公路局及所屬	綠能建設	96	71	48	67.94	主要係智慧電動巴士DMIT—智慧自駕公路創新移動服務營造計畫，預付款未達轉正條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	16	64	90.35
5	林業及自然保育署及所屬	綠能建設	57	42	29	69.26	主要係計畫審查費時，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.6	30	70.89
6	建築研究所	綠能建設	697	294	208	70.76	主要係受補助機關工程採購案流標所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.1	208	70.81

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
7	核能安全委員會及所屬	綠能建設	377	253	181	71.44	主要係微電網太陽能系統建置採購案尚執行中，未完成結報作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	72	253	99.96
8	地質調查及礦業管理中心	綠能建設	419	240	177	73.62	主要係東部變質岩區地質鑽井及資源測試等案，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	177	73.62
9	能源署	綠能建設	4,691	3,267	2,682	82.12			69	2,752	84.25
10	環境部	綠能建設	530	258	212	82.43			—	212	82.43
11	農糧署及所屬	綠能建設	153	112	93	82.83			—	93	82.83
12	農業試驗所及所屬	綠能建設	145	101	86	84.96			—	86	84.96
13	能源署	綠能建設	485	375	319	85.26			—	319	85.26
14	苗栗區農業改良場	綠能建設	2	2	1	85.27			—	1	85.27
15	桃園區農業改良場	綠能建設	7	6	5	86.49			—	5	86.49
16	水產試驗所	綠能建設	70	52	46	87.99			—	46	87.99
17	林業試驗所	綠能建設	105	87	77	88.61			—	77	88.61

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
18	標準檢驗局 及所屬	綠能建設	632	445	399	89.79			—	399	89.79
19	農業部	綠能建設	83	57	52	92.00			—	52	92.00
20	中央研究院	綠能建設	85	59	55	92.13			0.2	55	92.50
21	臺東區農業 改良場	綠能建設	2	2	2	93.27			—	2	93.27
22	茶及飲料作 物改良場	綠能建設	7	5	5	93.46			0.02	5	93.80
23	高雄區農業 改良場	綠能建設	3	2	2	96.34			—	2	96.34
24	花蓮區農業 改良場	綠能建設	8	6	6	97.40			—	6	97.40
25	漁業署及所屬	綠能建設	98	76	74	98.25			0.1	74	98.46
26	臺南區農業 改良場	綠能建設	11	8	8	98.34			—	8	98.34
27	臺中區農業 改良場	綠能建設	5	3	3	99.06			—	3	99.06
28	農業藥物試 驗所	綠能建設	5	3	3	99.19			—	3	99.19
29	產業發展署	綠能建設	543	404	403	99.70			—	403	99.70

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
30	產業發展署	綠能建設	114	43	43	99.88			—	43	99.88
31	運輸研究所	綠能建設	94	57	57	99.90			—	57	99.90
32	經濟部	綠能建設	1,514	928	927	99.94			—	927	99.94
33	國家科學及 技術委員會	綠能建設	270	270	270	100.00			—	270	100.00
四、數位建設			38,493	25,857	22,561	87.25			1,938	24,500	94.75
1	水利署及所屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	102	88	0.04	0.05	主要係委辦智慧節水 設備建置等業務，部 分經費尚未核銷所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	77	77	86.80
2	原住民族委 員會	推廣數位公益 服務	15	15	1	9.89	主要係辦理原住民族 歷史事件拍攝工作， 執行進度未達撥款條 件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	1	9.89
3	數位發展部	基礎建設環境	597	387	71	18.43	主要係應變或戰時應 用新興科技強化通訊 網路數位韌性計畫補 助案，因國際低軌衛 星服務提供者尚無法 正式提供服務，執行 進度未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	1	72	18.73

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
4	國家發展委員會	推廣數位公益服務	990	754	183	24.31	主要係亞洲矽谷相關委託及補助案，預付款未達核銷轉正條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	479	663	87.91
5	消防署及所屬	公共服務據點整備	451	266	77	29.03	主要係補助地方政府辦理消防廳舍拆除重建工程，尚未完成核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	140	218	81.96
6	資通安全署	基礎建設環境	1,570	917	505	55.13	主要係資安卓越深耕－資安卓越中心計畫，部分採購案尚未完成驗收所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	337	843	91.89
7	消防署及所屬	推廣數位公益服務	304	220	123	56.09	主要係消防5G場域計畫、警消微波網路系統移頻計畫等，尚未完成驗收所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	22	146	66.40
8	警政署及所屬	推廣數位公益服務	555	389	221	56.89	主要係警消微波網路系統移頻計畫，預付款尚未轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	167	389	99.97
9	文化部	推廣數位公益服務	1,348	990	596	60.29	主要係超高畫質內容創新應用等計畫，刻正辦理結案審查作業，預付款尚未核銷轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	239	836	84.47
10	環境部	建構開放政府及智慧城鄉服務	397	330	241	73.05	主要係環境品質監測及預報作業技術合作協議案，執行進度未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	76	318	96.10

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	數位發展部	縮短5G偏鄉數位落差	910	505	379	75.18	主要係強化偏鄉地區行動寬頻網路數位韌性與近用之基礎設施建置計畫，因部分工程受天氣因素影響，展延完工期程所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	70	449	89.04
12	國立臺灣歷史博物館	發展數位文創普及高畫質服務	258	172	134	78.15	主要係預付文化部國家文化記憶庫計畫相關系統維運經費分攤款，尚未核銷轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	26	161	93.68
13	國民及學前教育署	基礎建設環境	645	549	442	80.52			—	442	80.52
14	農業試驗所及所屬	基礎建設環境	15	12	10	83.44			—	10	83.44
15	國民及學前教育署	數位人才淬煉	107	105	89	84.32			—	89	84.32
16	教育部	基礎建設環境	691	396	337	85.33			—	337	85.33
17	鐵道局及所屬	推廣數位公益服務	135	88	75	85.68			—	75	85.68
18	國家科學及技術委員會	5G基礎公共建設	818	394	339	85.92			55	394	100.00
19	桃園區農業改良場	建構開放政府及智慧城鄉服務	8	6	6	90.59			0.04	6	91.25

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
20	中央健康保險署	推廣數位公益服務	12	8	7	90.61			—	7	90.61
21	農業部	基礎建設環境	42	29	26	90.82			—	26	90.82
22	桃園區農業改良場	推廣數位公益服務	2	2	1	91.49			—	1	91.49
23	教育部	縮短5G偏鄉數位落差	446	406	376	92.39			—	376	92.39
24	農業試驗所及所屬	推廣數位公益服務	15	9	8	92.54			—	8	92.54
25	國立臺灣美術館及所屬	推廣數位公益服務	29	26	24	92.95			—	24	92.95
26	農業部	推廣數位公益服務	210	136	128	93.74			—	128	93.74
27	消防署及所屬	基礎建設環境	158	93	88	94.05			2	91	97.18
28	交通部	推廣數位公益服務	395	303	285	94.19			1	287	94.67
29	衛生福利部	推廣數位公益服務	327	222	211	95.06			—	211	95.06
30	臺中區農業改良場	推廣數位公益服務	5	3	3	95.18			—	3	95.18
31	數位發展部	5G基礎公共建設	7,406	4,081	3,898	95.51			7	3,905	95.70

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
32	經濟部	產業數位轉型	6,336	4,106	3,931	95.74			169	4,101	99.87
33	標準檢驗局 及所屬	推廣數位公益 服務	49	34	33	96.03			—	33	96.03
34	教育部	數位人才淬煉	356	306	294	96.10			—	294	96.10
35	農田水利署	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	39	25	24	96.64			—	24	96.64
36	數位產業署	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	1,078	980	951	96.98			28	979	99.88
37	產業發展署	推廣數位公益 服務	603	496	483	97.32			8	491	98.98
38	農業試驗所 及所屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	6	4	4	97.35			—	4	97.35
39	數位產業署	數位人才淬煉	476	383	373	97.41			9	382	99.97
40	消防署及所屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	87	50	48	97.77			—	48	97.77
41	國立故宮博 物院	發展數位文創 普及高畫質服 務	59	37	36	97.80			—	36	97.80

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
42	中央研究院	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	40	29	28	97.98			—	28	97.98
43	智慧財產局	基礎建設環境	30	19	18	98.09			—	18	98.09
44	畜產試驗所 及所屬	推廣數位公益 服務	5	3	3	98.13			—	3	98.13
45	原住民族委 員會	縮短5G偏鄉數 位落差	100	66	65	98.31			—	65	98.31
46	國家科學及 技術委員會	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	510	288	283	98.38			4	288	100.00
47	經濟部	基礎建設環境	25	14	14	98.39			—	14	98.39
48	高雄區農業 改良場	推廣數位公益 服務	6	4	4	98.74			—	4	98.74
49	國史館	推廣數位公益 服務	69	41	41	98.86			—	41	98.86
50	交通部	基礎建設環境	284	182	179	98.87			—	179	98.87
51	國家科學及 技術委員會	產業數位轉型	918	644	638	99.05			6	644	100.00
52	動植物防疫 檢疫署及所屬	推廣數位公益 服務	29	20	20	99.05			—	20	99.05
53	數位產業署	產業數位轉型	2,852	2,271	2,254	99.25			4	2,258	99.44

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
54	產業發展署	基礎建設環境	15	11	11	99.53			—	11	99.53
55	關務署及所屬	基礎建設環境	39	25	25	99.57			—	25	99.57
56	文化部	基礎建設環境	15	10	10	99.73			—	10	99.73
57	產業發展署	產業數位轉型	1,529	1,026	1,025	99.89			—	1,025	99.89
58	中央氣象署	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	142	90	90	99.93			—	90	99.93
59	中央氣象署	基礎建設環境	339	268	267	99.94			—	267	99.94
60	中小及新創 企業署	推廣數位公益 服務	198	158	158	99.95			—	158	99.95
61	國家科學及 技術委員會	基礎建設環境	1,069	595	595	99.95			0.3	595	100.00
62	運輸研究所	推廣數位公益 服務	22	14	14	99.96			—	14	99.96
63	漁業署及所屬	推廣數位公益 服務	18	14	14	99.97			—	14	99.97
64	標準檢驗局 及所屬	基礎建設環境	9	7	7	99.97			—	7	99.97
65	內政部	基礎建設環境	18	10	10	99.99			—	10	99.99

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
66	財政資訊中心	基礎建設環境	186	98	98	100.00			—	98	100.00
67	數位產業署	推廣數位公益 服務	617	445	445	100.00			—	445	100.00
68	公路局及所屬	基礎建設環境	460	417	417	100.00			—	417	100.00
69	鐵道局及所屬	基礎建設環境	256	256	256	100.00			—	256	100.00
70	數位產業署	5G 基礎公共建 設	229	202	202	100.00			—	202	100.00
71	國家科學及 技術委員會	數位人才淬煉	150	112	112	100.00			—	112	100.00
72	經濟部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	110	79	79	100.00			—	79	100.00
73	公路局及所屬	推廣數位公益 服務	82	62	62	100.00			—	62	100.00
74	公共工程委 員會	基礎建設環境	42	19	19	100.00			—	19	100.00
75	國家發展委 員會	基礎建設環境	3	1	1	100.00			—	1	100.00
五、城鄉建設			46,862	31,410	23,546	74.96			5,170	28,716	91.42
1	勞動部	公共服務據點 整備	14	4	—	—	主要係公有危險建築 補強重建計畫補助	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							案，地方政府尚未請領補助款所致。				
2	衛生福利部	加速推動地方創生	60	40	1	4.10	主要係辦理地方創生長照衛福據點整備，部分補助案件招標作業或工程進度落後，未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	1	4.10
3	經濟部	公共服務據點整備	368	270	17	6.34	主要係補助地方政府辦理公有零售市場補強或拆除重建工程計畫，因攤商協調、變更設計、招標流標、尚未驗收結算等，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	70	87	32.29
4	賦稅署	公共服務據點整備	107	57	10	18.09	主要係補助地方稅捐稽徵機關辦公廳舍耐震補強工程，部分案件尚辦理規劃設計中，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	10	18.09
5	國民健康署	公共服務據點整備	287	132	27	20.58	主要係整建長照衛福據點計畫，部分補助案件招標作業或工程進度落後，未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	15	43	32.54
6	林業及自然保育署及所屬	加速推動地方創生	80	53	12	23.58	主要係部分補助計畫尚未完成審核，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	12	23.58

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
7	社會及家庭署	加速推動地方 創生	39	10	2	23.94	主要係辦理地方創生 長照衛福據點整備， 部分補助案件尚未完 成招標作業，或未達 撥款條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	23.94
8	原住民族委 員會	加速推動地方 創生	84	66	18	27.05	主要係部分補助地方 政府案件，執行進度 未達撥款條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	18	27.05
9	警政署及所屬	公共服務據點 整備	1,308	650	225	34.67	主要係補助地方警察 廳舍拆除重建及耐震 補強工程，修正計畫 尚未核定、行政審查 作業延宕等所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	225	34.67
10	衛生福利部	公共服務據點 整備	658	347	126	36.46	主要係整建長照衛福 據點計畫，部分補助 案件招標作業或工程 進度落後，未達撥款 條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	126	36.46
11	體育署	校園社區化改 造	255	217	81	37.54	主要係部分補助案件 預付款尚待核銷轉正 所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請體育署研 謀具體改善 措施。	125	206	95.01
12	農業部	加速推動地方 創生	80	40	15	37.76	主要係部分補助計畫 未達撥款條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	15	37.76

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
13	農村發展及 水土保持署 及所屬	加速推動地方 創生	99	69	32	46.83	主要係嘉義縣大林鎮 頂員林埤環境整建計 畫，因評估工程對生 態影響，尚在設計階 段，未達撥款條件所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	3	35	51.18
14	客家委員會 及所屬	加速推動地方 創生	28	28	13	47.15	主要係地方政府提送 補助案件請款資料尚 待修正所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	13	47.15
15	鐵道局及所屬	推動觀光升級	516	271	135	49.93	主要係臺鐵車站美學 與功能提升計畫，預 付款尚待依工程進度 辦理核銷轉正所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	111	246	91.09
16	交通部	推動觀光升級	711	473	236	49.95	主要係海洋觀光計 畫，受海象不佳影響， 新闢航線獎勵補助航 次較預計減少所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	214	450	95.22
17	客家委員會 及所屬	客庄 369 幸福	838	626	334	53.35	主要係部分補助地方 政府案件，執行進度 未達經費核銷條件所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	267	601	96.02
18	文化部	加速推動地方 創生	165	137	78	56.76	主要係部分補助案 件，尚辦理憑證核銷 及報告審查等作業所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	29	107	78.37
19	教育部	公共服務據點 整備	250	120	70	58.15	主要係部分受補助單 位尚未完成發包作業 所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	70	58.15

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
20	公路局及所屬	改善停車問題	7,300	3,369	2,066	61.32	主要係補助地方政府辦理改善停車問題計畫，預付款尚待依工程進度核銷轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,303	3,369	100.00
21	社會及家庭署	公共服務據點 整備	267	111	75	67.18	主要係整建長照衛福據點計畫，部分補助案件尚未完成招標作業，或工程進度未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	75	67.18
22	體育署	公共服務據點 整備	168	67	45	68.13	主要係部分補助工程履約期程跨年度、採購多次流（廢）標、地方政府尚未申請補助等所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請體育署研謀具體改善措施。	—	45	68.13
23	國民及學前 教育署	校園社區化改 造	430	404	286	70.69	主要係補助學校辦理校園社區化計畫，部分工程尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	286	70.69
24	文化部	文化生活圈建 設	2,022	1,491	1,077	72.29	主要係重建臺灣藝術史計畫，預付款尚未達核銷轉正條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	197	1,275	85.51
25	產業發展署	開發在地型產 業園區	2,752	2,064	1,496	72.49	主要係自辦工程之預付款，尚未完成核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	567	2,064	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
26	原住民族委員會	原民部落營造	942	749	553	73.83	主要係部分補助地方政府案件，執行進度未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	24	578	77.08
27	觀光署及所屬	加速推動地方創生	96	48	35	74.10	主要係補助地方政府辦理地方創生計畫，部分案件尚辦理中或未及核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	35	74.10
28	體育署	充實全民運動環境	1,799	1,019	772	75.78	主要係部分補助工程履約期程跨年度、採購多次流(廢)標或作業延遲等所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請體育署研謀具體改善措施。	0.06	772	75.78
29	國土管理署及所屬	加速推動地方創生	90	51	39	77.75	主要係補助地方政府案件，執行進度尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	39	77.75
30	國家發展委員會	加速推動地方創生	721	491	388	79.03	主要係部分補助案件，尚辦理申請撥款作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	18	406	82.79
31	國立臺灣美術館及所屬	加速推動地方創生	39	27	21	79.13	主要係部分受補助單位未提送期中報告書，預付款尚未核銷轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1	23	83.35
32	國土管理署及所屬	提升道路品質	10,912	8,707	6,900	79.25	主要係補助地方政府案件，執行進度尚未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,747	8,648	99.32
33	原住民族委員會	推動原住民族多元產業發展2.0	597	385	309	80.39			1	311	80.73

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
34	農糧署及所屬	加速推動地方 創生	99	61	49	80.73			4	54	88.77
35	公路局及所屬	加速推動地方 創生	60	36	30	82.59			3	33	92.51
36	文化資產局	文化生活圈建 設	1,497	856	723	84.44			30	754	88.02
37	公路局及所屬	提升道路品質	4,762	3,732	3,315	88.81			390	3,705	99.26
38	文化資產局	加速推動地方 創生	71	49	44	90.21			2	46	94.39
39	產業園區管 理局及所屬	開發在地型產 業園區	534	351	318	90.67			30	349	99.28
40	環境部	公共服務據點 整備	26	6	6	94.51			—	6	94.51
41	國土管理署 及所屬	城鎮之心工程	2,118	1,160	1,101	94.89			—	1,101	94.89
42	觀光署及所屬	推動觀光升級	1,786	1,268	1,206	95.16			—	1,206	95.16
43	內政部	公共服務據點 整備	1,084	738	711	96.42			2	714	96.74
44	中小及新創 企業署	開發在地型產 業園區	510	381	371	97.20			7	378	99.09
45	國立臺灣史 前文化博物館	文化生活圈建 設	49	37	36	97.98			—	36	97.98

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
46	青年發展署	加速推動地方 創生	79	60	60	99.69			—	60	99.69
47	中小及新創 企業署	加速推動地方 創生	73	47	47	100.00			—	47	100.00
48	國立臺灣文 學館	文化生活圈建 設	15	15	15	100.00			—	15	100.00
六、因應少子化友善育兒空間建設			1,389	1,010	722	71.43			—	722	71.43
1	社會及家庭署	因應少子化友 善育兒空間建 設	1,389	1,010	722	71.43	主要係建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，部分案件尚未完成招標作業，或工程進度未達撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	722	71.43
七、食品安全建設			1,441	556	214	38.55			297	512	92.01
1	食品藥物管 理署	食品安全建設	1,441	556	214	38.55	主要係委辦現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫，尚未完成經費核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	297	512	92.01
八、人才培育促進就業建設			10,202	7,350	5,539	75.37			14	5,554	75.57
1	國家發展委 員會	人才培育促進 就業建設	908	393	105	26.84	主要係行政法人雙語國家發展中心設置條例草案尚未經立法院	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	13	119	30.30

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80% 落後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							審議通過，相關經費 無法支用等所致。				
2	國民及學前 教育署	人才培育促進 就業建設	4,810	3,830	2,545	66.45	主要係 2030 雙語教 育政策計畫，部分補 助經費尚未核定所 致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	2,545	66.45
3	教育部	人才培育促進 就業建設	2,262	1,456	1,222	83.93			—	1,222	83.93
4	數位產業署	人才培育促進 就業建設	130	97	95	98.45			1	96	99.69
5	產業發展署	人才培育促進 就業建設	285	215	213	98.97			—	213	98.97
6	國立教育廣 播電臺	人才培育促進 就業建設	9	6	6	99.12			—	6	99.12
7	經濟部	人才培育促進 就業建設	5	3	3	99.95			—	3	99.95
8	中小及新創 企業署	人才培育促進 就業建設	99	64	64	99.97			—	64	99.97
9	產業園區管 理局及所屬	人才培育促進 就業建設	23	15	15	99.99			—	15	99.99
10	國家科學及 技術委員會	人才培育促進 就業建設	1,665	1,266	1,266	100.00			—	1,266	100.00


註：1. 本表係依據各機關 113 年 6 月份中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算會計報告（收支執行狀況月報表）編製。
2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。
3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。
4. 本表係按各建設計畫累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附圖 1

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出已實現比率未達 80% 之主管機關

112 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

已實現比率%

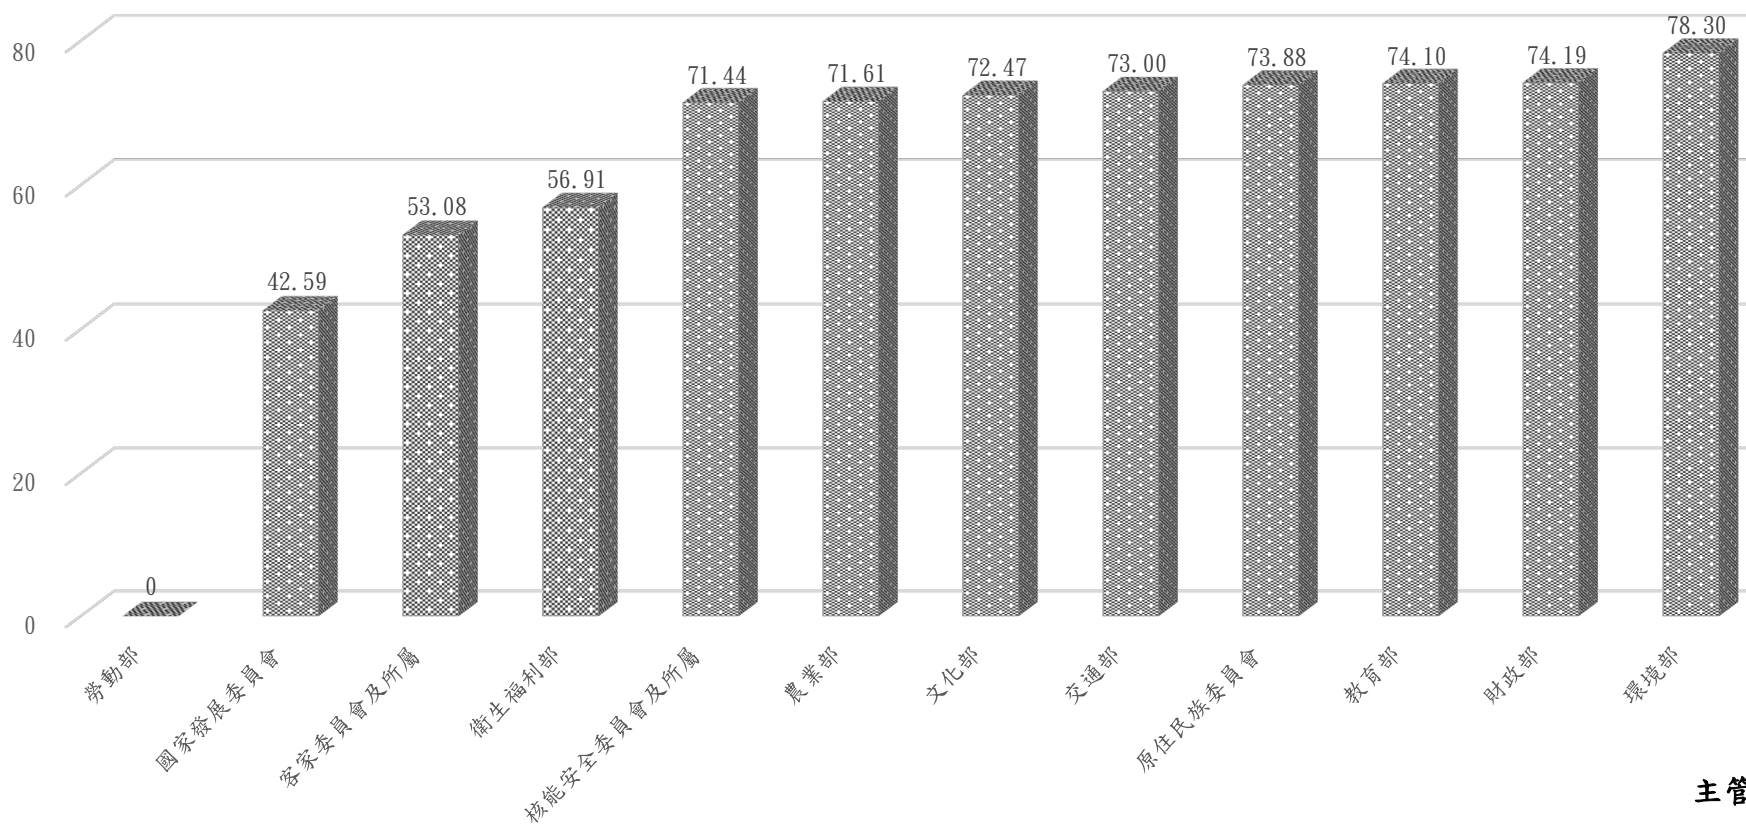


附圖 2

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出各項工作計畫預算實現率最低之前 20 項計畫

112 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

已實現比率%

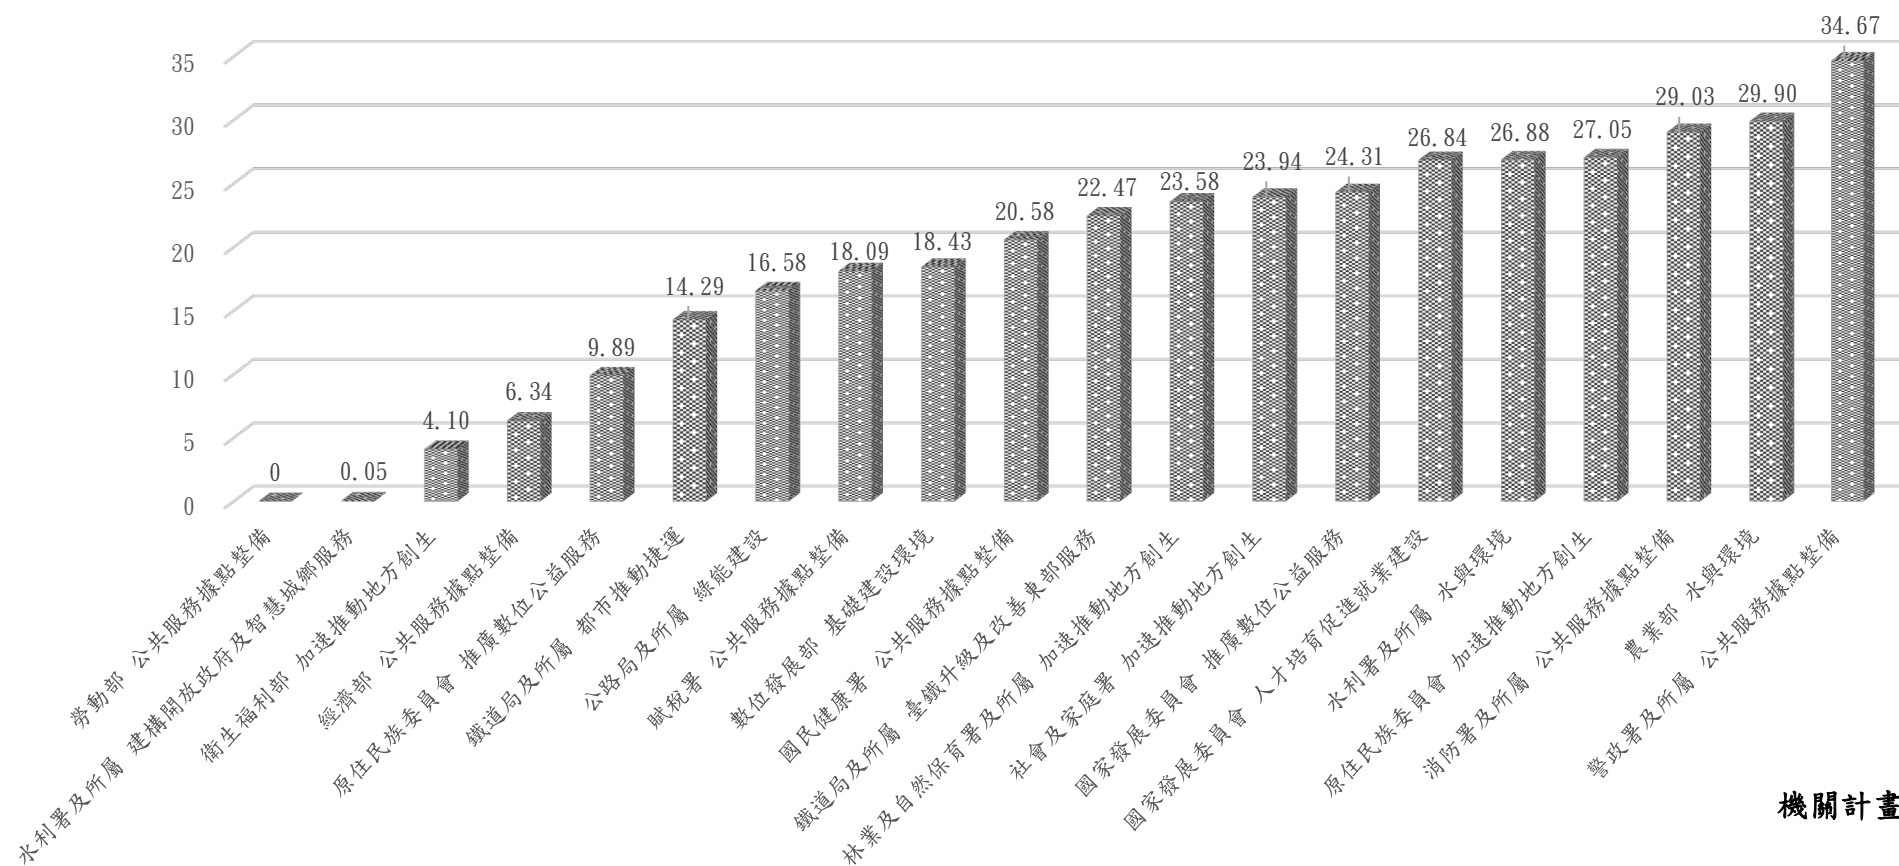

機關計畫
