

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算，執行期間自民國 108 至 109 年度止，分 2 個年度實施，全部歲出預算數 2,229 億餘元，全數以舉借債務支應。截至民國 108 年度第 2 季止，執行結果如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至民國 108 年度第 2 季止，累計實現數 5,180 萬餘元，主要係交通部公路總局變賣刨除料收入。

二、歲出

全部歲出預算數 2,229 億餘元，分由總統府、行政院及內政部等 21 個主管機關執行，共計辦理 98 項業務計畫，133 項工作計畫。截至民國 108 年度第 2 季止，累計實現數 226 億餘元，占累計分配預算數 370 億餘元之 61.05%。各主管機關已實現比率¹未達 80%者，計有行政院、客家委員會及所屬、衛生福利部、文化部、農業委員會、原住民族委員會、經濟部、教育部、交通部、財政部、內政部、國立故宮博物院、國家通訊傳播委員會等 13 個機關（詳[附表 1](#)及[附圖 1](#)），各項工作計畫已實現比率未達 80%者，計有 64 項（詳[附表 2](#)及[附圖 2](#)），截至民國 108 年度第 2 季止，累計實現數如加計預付數 47 億餘元，合計 273 億餘元，占累計分配預算數之 73.90%。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數 2,229 億餘元，截至民國 108 年度第 2 季止，累計實現數 30 億元，占累計分配預算數 1,047 億餘元之 2.86%，主要係配合該特別預算歲出經費需求及國庫資金調度辦理。

¹ 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算歲出執行情形表

民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
	合計	222,954	37,056	22,623	61.05			4,759	27,383	73.90
1	行政院	1,066	96	3	3.85	主要係補助地方政府辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，撥付地方政府款項須俟補助案件結案驗收後始轉正實現所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	85	89	92.13
2	客家委員會及所屬	1,187	192	13	6.92	主要係補助地方政府辦理客家浪漫臺三線計畫，地方政府執行進度尚未達經費核銷條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	163	176	91.97
3	衛生福利部	7,302	1,651	259	15.72	主要係整建長照衛福據點計畫，地方政府刻正辦理補助經費納入預算程序及請款作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	40	300	18.19
4	文化部	15,436	2,129	645	30.33	主要係補助地方政府辦理再造歷史現場專案計畫，因部分市縣政府辦理工程進度未符預期或重新提送修正計畫；暨重建臺灣藝	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	455	1,101	51.72

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						術史計畫受臺中市政府辦理臺中州廳園區修復工程工期延後而無法辦理所致。				
5	農業委員會	7,405	1,078	339	31.51	主要係漁業署補助市縣政府辦理漁港區域水岸環境改善及綠美化等工程，部分工程已發包尚未請款或尚待發包，致補助款核撥進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	152	492	45.60
6	原住民族委員會	1,515	459	191	41.74	主要係補助地方政府辦理原住民部落營造—文化綜合服務據點友善空間整建案，尚在辦理計畫之審核作業，相關經費尚未核撥所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1	192	42.03
7	經濟部	59,236	8,493	5,012	59.01	主要係水利署辦理石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫，受隧道抽坍、天候欠佳等因素影響，及辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，因部分地方政府未及請領補助款等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,749	6,761	79.61
8	教育部	19,118	5,335	3,459	64.84	主要係營造休閒運動環境計畫，部分地方政府工程	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	14	3,474	65.12

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						進度落後所致。	形。			
9	交通部	56,950	9,090	5,932	65.27	主要係臺鐵南迴鐵路電氣化計畫，因廠商估驗計價進度落後，工程預付款未如期辦理轉正所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,855	7,788	85.68
10	財政部	766	142	95	67.29	主要係補助地方稅務機關與財政部及所屬汰換老舊資訊設備，暨辦理強化資訊系統資安防護作業等，未及時完成核銷程序所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	44	139	98.41
11	內政部	33,338	5,211	3,728	71.54	主要係營建署補助地方政府辦理提升道路品質計畫、縣市管河川及區域排水整體改善計畫，或因地方政府尚在辦理規劃設計、發包、完工結算等作業，或因部分工程遭遇地下管線、多次流標及豪雨影響等因素所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	60	3,788	72.70
12	國立故宮博物院	197	37	27	73.18	主要係建置多元跨域無牆博物館與數位平台協作及數位資產轉化等子計畫尚未完成驗收所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	27	73.18
13	國家通訊傳播	754	101	78	76.98	主要係辦理普及偏鄉寬頻	審計部將賡續追	21	99	98.06

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
	委員會					接取基礎建設計畫，預付受補助單位款項尚未辦理轉正所致。	蹤後續辦理情形。			
14	環境保護署	5,052	762	650	85.33			67	718	94.23
15	原子能委員會	196	22	20	88.80			0.03	20	88.95
16	科技部	12,338	2,084	1,998	95.87			46	2,045	98.11
17	金融監督管理委員會	14	8	8	98.42			0.1	8	99.82
18	總統府	804	152	152	99.62			—	152	99.62
19	國家發展委員會	120	6	5	99.98			—	5	99.98
20	法務部	89	—	—	—			—	—	—
21	國軍退除役官兵輔導委員會	60	—	—	—			—	—	—

註：1. 本表係依據各機關民國108年6月份中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於民國108年8月底及9月底上網公布之中央政府總預算半年結算報告、中央政府總預算半年結算查核報告(含附屬單位預算案營業與非營業部分)為準。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附表 2

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算各項工作計畫預算執行情形表

民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：百萬元

排 序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註 2）		累計實現數占累計分 配預算數未達 80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註 3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
合計			222,954	37,056	22,623	61.05			4,759	27,383	73.90
一、軌道建設			41,620	6,398	4,171	65.21			1,096	5,268	82.34
1	鐵道局及所屬	都市推動捷運	623	104	—	—	主要係機場捷運增設 A14 站機電工程標尚 未決標所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
2	鐵道局及所屬	高鐵臺鐵連結 成網	20	2	—	—	主要係高鐵延伸屏東 規劃作業進度延遲所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
3	交通部	都市推動捷運	9,802	92	20	21.74	主要係安坑輕軌系統 暨周邊土地開發計畫 新北市政府未及辦理 請款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	20	21.74
4	鐵道局及所屬	臺鐵升級及改 善東部服務	12,714	3,466	1,898	54.76	主要係臺鐵南迴鐵路 臺東潮州段電氣化工 程建設計畫因估驗進 度未達核銷標準所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	959	2,857	82.43
5	林務局	中南部觀光鐵 路	433	9	6	65.87	主要係阿里山林業鐵 路設施設備安全提升 計畫，部分工程已發	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	6	65.87

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							包尚待估驗付款或尚待發包所致。				
6	交通部	臺鐵升級及改善東部服務	7,382	851	644	75.78	主要係票務系統整合再造計畫核心系統建置案及票務網路建置案驗收及計價時程延遲所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	644	75.78
7	交通部	高鐵臺鐵連結成網	1,174	130	107	82.41			—	107	82.41
8	鐵道局及所屬	鐵路立體化及通勤提速	9,084	1,742	1,495	85.82			137	1,632	93.69
9	交通部	中南部觀光鐵路	305	—	—	—			—	—	—
10	鐵道局及所屬	中南部觀光鐵路	55	—	—	—			—	—	—
11	交通部	鐵路立體化及通勤提速	24	—	—	—			—	—	—
二、水環境建設			58,155	8,866	5,036	56.81			1,533	6,570	74.11
1	農業委員會	水與環境	147	40	—	—	主要係東港溪流域畜牧業污染改善計畫，刻正辦理計畫研提作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
2	公路總局及所屬	水與安全	360	2	—	—	主要係省道橋梁改建計畫受民眾陳情影響所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
3	漁業署及所屬	水與環境	931	456	24	5.43	主要係補助市縣政府辦理漁港區域水岸環境改善及綠美化等工程，部分工程已發包尚未請款或尚待發包，致補助款核撥進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	24	5.43
4	水利署及所屬	水與環境	5,649	480	99	20.64	主要係水利署辦理全國水環境改善計畫，部分補助計畫尚在辦理發包作業中，暨部分地方政府未及請領補助款等所致。	審計部業就預算執行落後情形函請水利署督促檢討改進。	273	372	77.61
5	觀光局及所屬	水與環境	600	0.1	0.04	24.44	主要係審核補助計畫所須現勘出差旅費等支出較預計數少。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	0.04	24.44
6	水土保持局	水與發展	2,489	236	83	35.25	主要係辦理水土保持及山坡地治理工程，因部分工程計畫尚處於規劃、設計、發包等階段所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	148	231	98.08
7	水利署及所屬	水與安全	13,950	2,274	834	36.70	主要係水利署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，部分地方政府未及請領補助款等所致。	審計部業就預算執行落後情形函請水利署督促檢討改進。	829	1,664	73.15

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
8	林務局	水與發展	1,078	147	66	45.28	主要係辦理國有林治理工程，因部分工程計畫尚在規劃設計或辦理發包作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	3	70	47.81
9	水利署及所屬	水與發展	18,178	2,512	1,661	66.13	主要係水利署辦理石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫、加強水庫集水區保育治理計畫等，因隧道抽坍、天候欠佳及部分工程發包期程延後等所致。	審計部業就預算執行落後情形函請水利署督促檢討改進。	278	1,940	77.23
10	營建署及所屬	水與安全	5,635	1,280	881	68.87	主要係補助地方政府辦理水與安全計畫，部分工程遭遇地下事業管線抵觸、用地未取得、多次流標或連日豪雨影響等因素所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	881	68.87
11	環境保護署	水與發展	299	34	32	91.76			—	32	91.76
12	環境保護署	水與環境	4,100	634	594	93.81			—	594	93.81
13	農業委員會	水與安全	1,960	153	147	96.06			—	147	96.06
14	營建署及所屬	水與環境	1,960	612	609	99.44			0.01	609	99.44

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
15	營建署及所屬	水與發展	818	1	1	99.95			—	1	99.95
三、綠能建設			11,405	2,349	2,132	90.75			5	2,137	90.96
1	交通部	完備綠能技術 及建設	1,350	560	431	77.04	主要係臺中港離岸風 電產業專區計畫臺灣 港務股份有限公司未 及辦理請款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	431	77.04
2	能源局	加速綠能科學 城建置	2,196	615	537	87.23			—	537	87.23
3	核能研究所	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	196	22	20	88.80			0.03	20	88.95
4	公路總局及所 屬	加速綠能科學 城建置	674	148	142	95.98			5	147	99.36
5	能源局	完備綠能技術 及建設	2,140	36	35	97.68			—	35	97.68
6	標準檢驗局及 所屬	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	250	56	55	98.35			—	55	98.35
7	科技部	加速綠能科學 城建置	2,822	503	503	100.00			—	503	100.00
8	能源局	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	1,160	278	278	100.00			—	278	100.00
9	營建署及所屬	加速綠能科學 城建置	490	95	95	100.00			—	95	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
10	中央研究院	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	125	32	32	100.00			—	32	100.00
四、數位建設			27,230	5,769	4,096	71.01			567	4,664	80.85
1	農業委員會	推動資安基礎 建設	77	10	—	—	主要係雲端行政資訊 系統建置採購案，因 前置作業需時，致執 行進度未如預期。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
2	營建署及所屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	31	3	—	—	主要係委託專業服務 案於108年4月11日 始決標所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
3	交通部	推動資安基礎 建設	17	0.3	0.007	2.00	主要係建構公教體系 綠能雲端資訊中心計 畫，綠能雲端資料中 心規劃服務案招標作 業延遲所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	0.007	2.00
4	行政院	推動資安基礎 建設	1,066	96	3	3.85	主要係補助地方政府 辦理強化政府基層機 關資安防護及區域聯 防計畫，撥付地方政 府款項須俟補助案件 結案驗收後始轉正實 現所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	85	89	92.13
5	內政部	推動資安基礎 建設	568	17	2	14.17	主要係補助地方政府 汰換全國戶役政系統 資訊設備案，因規劃	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	1	3	20.82

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							作業費時及依決標單 價重新調整地方政府 補助金額所致。				
6	國家通訊傳播 委員會	保障寬頻人權	430	22	3	14.24	主要係辦理普及偏鄉 寬頻接取基礎建設計 畫，預付受補助單位 款項尚未辦理轉正所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	18	21	95.28
7	消防署及所屬	推動資安基礎 建設	260	6	0.9	14.78	主要係補助國家災害 防救科技中心辦理災 害告警細胞廣播平臺 維運計畫等，須俟廠 商補送文件後，始能 辦理核銷請款作業所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	1	2	45.13
8	教育部	推動資安基礎 建設	607	246	41	16.69	主要係部分地方政府 尚未請撥建構綠能雲 端資料中心之補助款 所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	41	16.69
9	水利署及所屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	327	45	8	18.06	主要係水利署辦理建 構民生公共物聯網計 畫，部分案件流標， 或決標時程較預計落 後等所致。	審計部業就 預算執行落 後情形函請 水利署督促 檢討改進。	—	8	18.06
10	影視及流行音 樂產業局	發展數位文創	773	102	19	18.68	主要係超高畫質電視 節目製作及新媒體跨 平臺創意影音節目製	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	34	53	52.39

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							作等補助案，尚未完 成驗收所致。				
11	消防署及所屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	137	1	0.2	23.68	主要係災害防救資訊 系統整合計畫—專案 辦公室委外服務案， 第3期第1階段經費 因分配數不足，由數 位建設—推動資安基 礎建設項下預付，俟 7月分配後再予轉 正，致執行進度落 後。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	0.2	23.68
12	文化部	發展數位文創	2,087	358	87	24.32	主要係推動超高畫質 電視內容升級前瞻計 畫撥付財團法人公共 電視文化事業基金會 之補助款刻正執行 中，尚未完成經費核 銷所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	223	311	86.80
13	環境保護署	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	653	93	23	25.40	主要係補助地方政府 執行環境品質感測器 布建計畫，地方政府 執行進度尚未達經費 核銷條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	67	91	98.01
14	中小企業處	建構開發政府 及智慧城鄉服 務	396	60	19	33.00	主要係委辦計畫執行 進度未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	40	60	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
15	水利署及所屬	推動資安基礎 建設	128	20	7	37.64	主要係水利署辦理強化國家資安基礎建設計畫，因建置資料備份備援中心採購案招標作業延遲，及相關軟、硬體採購案尚未驗收完成等所致。	審計部業就預算執行落後情形函請水利署督促檢討改進。	—	7	37.64
16	國民及學前教育署	建設下世代科研與智慧學習環境	1,378	585	235	40.28	主要係甫於6月核定補助計畫經費，未及於6月底前撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	235	40.28
17	農業委員會	建構開放政府及智慧城鄉服務	200	23	9	40.47	主要係辦理精進灌溉節水管理推廣建置計畫，因計畫審查及工程設計需時所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	9	40.47
18	科技部	建構開放政府及智慧城鄉服務	593	33	17	51.19	主要係合約規定撥付國家實驗研究院及災害防救中心之部分補助計畫預付款，未達核銷標準所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	16	33	100.00
19	科技部中部科學工業園區管理局及所屬	建設下世代科研與智慧學習環境	428	48	25	52.62	主要係創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案，得標廠商因故終止契約，重新辦理招標作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	25	52.62

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
20	教育部	保障寬頻人權	140	76	49	64.84	主要係依受補助單位執行進度撥款，尚未撥付第2期補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	49	64.84
21	財政資訊中心	推動資安基礎建設	737	142	95	67.29	主要係補助地方稅務機關與財政部及所屬汰換老舊資訊設備，及辦理強化資訊系統之資安防護作業，未及完成核銷程序所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	44	139	98.41
22	國立臺灣史前文化博物館	發展數位文創	47	7	5	69.46	主要係史前館點字數位有聲書製作等案件仍辦理中，尚未完成驗收付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	5	69.46
23	衛生福利部	保障寬頻人權	98	22	15	69.98	主要係提升偏鄉衛生所(室)及巡迴醫療點網路品質計畫，部分受補助地方政府計畫尚辦理審查或撥款程序中所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	15	69.98
24	科技部南部科學工業園區管理局及所屬	建設下世代科研與智慧學習環境	475	59	42	72.10	主要係園區智慧機器人創新自造基地計畫補助實施要點於108年5月甫核定，尚在辦理獎補助案件徵求事宜中，影響計畫執行進度所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.02	42	72.13

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
25	國立故宮博物院	故宮重要文物數位化基礎建設及公共化教育應用計畫	197	37	27	73.18	主要係建置多元跨域無牆博物館與數位平台協作及數位資產轉化等子計畫尚未完成驗收所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	27	73.18
26	林務局	推動資安基礎建設	29	3	2	74.20	主要係辦理節能電腦機房基礎設施規劃建置案，因前置作業需時，致執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	2	74.20
27	國立傳統藝術中心	發展數位文創	19	0.9	0.7	85.43			—	0.7	85.43
28	標準檢驗局及所屬	推動資安基礎建設	29	0.1	0.08	88.00			—	0.08	88.00
29	科技部	建設下世代科研與智慧學習環境	3,041	272	242	88.93			30	272	100.00
30	教育部	建設下世代科研與智慧學習環境	4,072	2,230	1,990	89.26			—	1,990	89.26
31	中央氣象局	推動資安基礎建設	49	13	11	92.22			—	11	92.22
32	國史館	發展數位文創	75	8	7	92.98			—	7	92.98
33	原住民族委員會	保障寬頻人權	196	41	38	94.82			—	38	94.82

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
34	國家通訊傳播 委員會	推動資安基礎 建設	324	79	75	94.90			3	78	98.85
35	國立臺灣博物 館	發展數位文創	37	2	2	95.83			—	2	95.83
36	文化部	推動資安基礎 建設	79	7	6	97.72			0.06	6	98.65
37	中央氣象局	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	1,093	3	2	97.84			—	2	97.84
38	工業局	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	4,450	764	749	97.97			—	749	97.97
39	國家圖書館	保障寬頻人權	0.1	0.06	0.05	98.33			—	0.05	98.33
40	金融監督管理 委員會	推動資安基礎 建設	14	8	8	98.42			0.1	8	99.82
41	中小企業處	保障寬頻人權	151	21	21	99.51			—	21	99.51
42	國立臺灣工藝 研究發展中心	發展數位文創	9	1	1	99.51			—	1	99.51
43	經濟部	推動資安基礎 建設	173	35	35	99.94			—	35	99.94
44	國家發展委員 會	推動資安基礎 建設	120	6	5	99.98			—	5	99.98
45	中央研究院	建設下世代科 研與智慧學習 環境	588	108	108	100.00			—	108	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
46	經濟部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	99	21	21	100.00			—	21	100.00
47	科技部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務（撥充行政 院國家科學技 術發展基金辦 理）	116	18	18	100.00			—	18	100.00
48	中央研究院	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	16	3	3	100.00			—	3	100.00
49	移民署	保障寬頻人權	45	0.6	0.6	100.00			—	0.6	100.00
50	衛生福利部	推動資安基礎 建設	176	—	—	—			—	—	—
51	法務部	推動資安建設	79	—	—	—			—	—	—
52	警政署及所屬	推動資安基礎 建設	71	—	—	—			—	—	—
53	國軍退除役官 兵輔導委員會	推動資安基礎 建設	60	—	—	—			—	—	—
54	加工出口區管 理處及所屬	推動資安基礎 建設	29	—	—	—			—	—	—
55	關務署及所屬	推動資安基礎 建設	29	—	—	—			—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
56	水土保持局	推動資安基礎 建設	29	—	—	—			—	—	—
57	農糧署及所屬	推動資安基礎 建設	29	—	—	—			—	—	—
58	國立公共資訊 圖書館	保障寬頻人權	10	—	—	—			—	—	—
59	智慧財產局	推動資安基礎 建設	9	—	—	—			—	—	—
60	臺灣高等檢察 署	推動資安基礎 建設	9	—	—	—			—	—	—
五、城鄉建設			71,975	11,139	5,174	46.45			1,545	6,719	60.32
1	國民健康署	公共服務據點 整備	754	162	—	—	主要係整建長照衛福 據點計畫補助地方政 府修建衛生所工程， 地方政府刻正辦理補 助經費納入預算程序 及請款作業所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	40	40	25.20
2	消防署及所屬	公共服務據點 整備	399	54	0.8	1.54	主要係公有危險建築 補強重建—地方消防 廳舍配合法定預算調 整各計畫核定金額， 致請款落後。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	52	53	97.53
3	經濟部	公共服務據點 整備	588	105	5	5.65	主要係公有危險建築 補強重建—公有零售 市場計畫，部分補助 地方政府經費，因納	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	4	10	10.10

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							入預算作業費時，未 及送審並請領補助款 等所致。				
4	客家委員會及 所屬	客家浪漫臺三 線	1,187	192	13	6.92	主要係補助地方政府 辦理客家浪漫臺三線 計畫，地方政府執行 進度尚未達經費核銷 條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	163	176	91.97
5	衛生福利部	公共服務據點 整備	3,598	807	60	7.45	主要係整建長照衛福 據點計畫補助地方政 府修建社區活動中心 及公有閒置空間，地 方政府刻正辦理補助 經費納入預算程序及 請款作業所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	60	7.45
6	中小企業處	開發在地型產 業園區	1,893	228	34	15.17	主要係補助市縣政府 辦理城鄉特色產業園 區補助計畫，發包作 業進度未如預期所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	82	117	51.29
7	體育署	營造休閒運動 環境	6,456	1,108	210	18.99	主要係補助臺中市足 球運動休閒園區興建 工程，因基地狀況及 交通因素變更興建位 置所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	0.03	210	18.99
8	文化資產局	文化生活圈建 設	4,900	696	189	27.25	主要係補助地方政府 辦理再造歷史現場專	審計部將賡 續追蹤後續	—	189	27.25

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數（註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
							案計畫，因部分市縣政府辦理工程進度未符預期或重新提送修正計畫所致。	辦理情形。			
9	公路總局及所屬	改善停車問題	3,650	360	116	32.32	主要係補助地方政府興建停車場案件，工程發包作業延遲所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	233	349	97.14
10	文化部	文化生活圈建設	6,897	921	314	34.13	主要係重建臺灣藝術史計畫受臺中市政府辦理臺中州廳園區修復工程工期延後而無法辦理所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	196	511	55.47
11	原住民族委員會	原民部落營造	1,319	418	152	36.52	主要係補助地方政府辦理原住民部落營造－文化綜合服務據點友善空間整建案，尚在辦理計畫之審核作業，相關經費尚未核撥所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1	154	36.85
12	社會及家庭署	公共服務據點整備	658	127	47	37.67	主要係公有危險建築補強重建計畫，地方政府刻正辦理規劃設計招標作業，尚未申請核撥補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	47	37.67
13	加工出口區管理處及所屬	開發在地型產業園區	1,996	95	44	46.20	主要係加工出口區高雄園區辦理標準廠房	審計部將賡續追蹤後續	—	44	46.20

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							暨聯合辦公大樓興建統包工程，因配合工地現況、各項建築標章請領及細部設計作業費時等，影響執行進度等所致。	辦理情形。			
14	營建署及所屬	提升道路品質	12,740	1,935	980	50.68	主要係補助地方政府辦理提升道路品質計畫，因追加預算、規劃設計、發包及完工決算作業中，致執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	3	984	50.87
15	國立臺灣史前文化博物館	文化生活圈建設	392	17	9	52.01	主要係卑南遺址公園景觀步道改善工程案因變更採購內容重新公告招標所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	9	52.01
16	工業局	開發在地型產業園區	4,736	657	395	60.13	主要係辦理108年清查全國未登記工廠規劃及管理計畫，因部分市縣政府未及提供納入預算證明資料，影響補助款核銷進度等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	240	635	96.71
17	國立臺灣博物館	文化生活圈建設	98	5	3	65.01	主要係因二次戰後臺灣經典建築設計圖說數位化影像掃描案尚未完成驗收付款所	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	3	65.01

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							致。				
18	公路總局及所屬	提升道路品質	7,969	1,614	1,062	65.78	主要係補助地方政府案件進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	520	1,583	98.04
19	國立臺灣工藝研究發展中心	文化生活圈建設	47	7	5	72.39	主要係典藏庫房整建工程變更設計展延工期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	5	72.39
20	體育署	校園社區化改造	179	65	54	83.28			3	57	88.32
21	國立臺灣美術館及所屬	文化生活圈建設	47	0.2	0.1	85.00			—	0.1	85.00
22	內政部	公共服務據點整備	2,274	266	235	88.22			—	235	88.22
23	國民及學前教育署	校園社區化改造	1,234	330	295	89.33			—	295	89.33
24	教育部	校園社區化改造	49	25	22	91.76			—	22	91.76
25	營建署及所屬	城鎮之心工程	5,880	506	493	97.62			0.9	494	97.81
26	警政署及所屬	公共服務據點整備	2,025	430	425	98.84			0.3	425	98.92
六、少子化友善育兒空間建設			2,219	590	101	17.14			—	101	17.14
1	社會及家庭署	少子化友善育兒空間建設	1,454	440	47	10.74	主要係建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，地方政府刻正辦理。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	47	10.74

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							理議會同意先行墊付 作業，尚未申請核撥 補助款所致。				
2	國民及學前教 育署	少子化友善育 兒空間建設	764	150	53	35.93	主要係受補助單位執 行情形尚未達撥款條 件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	53	35.93
七、食品安全建設			561	92	88	96.24			—	88	96.24
1	食品藥物管理 署	食品安全建設	561	92	88	96.24			—	88	96.24
八、人才培育促進就業建設			9,785	1,850	1,821	98.46			11	1,832	99.07
1	工業局	人才培育促進 就業建設	700	183	167	91.31			—	167	91.31
2	教育部	人才培育促進 就業建設	1,495	518	505	97.58			11	516	99.77
3	科技部	年輕學者養成 （撥充行政院 國家科學技術 發展基金辦 理）	2,295	656	656	100.00			—	656	100.00
4	科技部	推動國際產學 聯盟（撥充行 政院國家科學 技術發展基金 辦理）	950	295	295	100.00			—	295	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
5	科技部	重點產業高階 人才培訓與就 業（撥充行政 院國家科學技 術發展基金辦 理）	780	134	134	100.00			—	134	100.00
6	科技部	青年科技創新 創業基地建置 （撥充行政院 國家科學技術 發展基金辦 理）	393	60	60	100.00			—	60	100.00
7	科技部	領袖學者助攻 方案（撥充行 政院國家科學 技術發展基金 辦理）	442	2	2	100.00			—	2	100.00
8	國民及學前教 育署	人才培育促進 就業建設	2,729	—	—	—			—	—	—

註：1. 本表係依據各機關民國108年6月份中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於民國108年8月底及9月底上網公布之中央政府總預算半年結算報告、中央政府總預算半年結算查核報告（含附屬單位預算案營業與非營業部分）為準。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。


3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按各建設計畫累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附圖 1

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算歲出已實現比率未達 80% 主管機關統計圖

民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

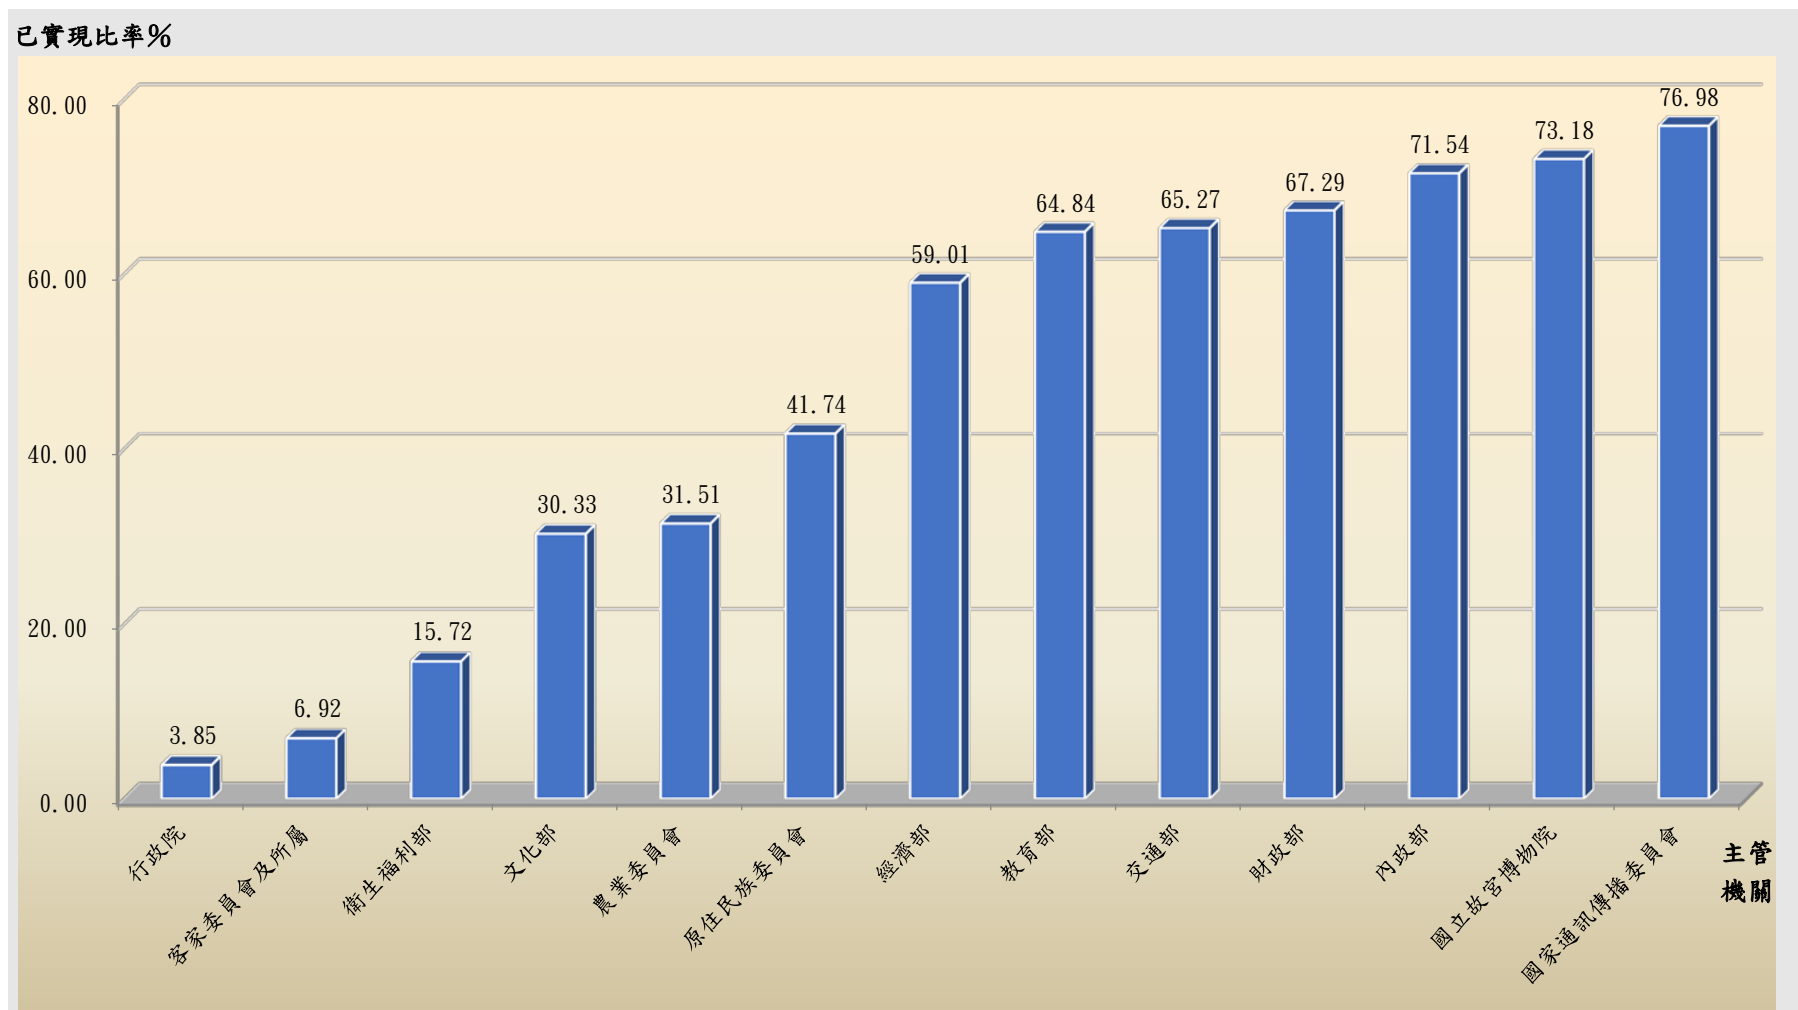

附圖 2

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算歲出各項工作計畫預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

