

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算，執行期間自 110 至 111 年度止，分 2 個年度實施，全部歲出預算數 2,298 億餘元，全數以舉借債務支應。截至 110 年度第 4 季止，執行情形如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至 110 年度第 4 季止，累計實現數 1 億 8,402 萬餘元，主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫軌道車輛租金收入。

二、歲出

全部歲出預算數 2,298 億餘元，分由總統府、行政院及內政部等 20 個主管機關執行，共計辦理 109 項業務計畫，166 項工作計畫。截至 110 年度第 4 季止，累計實現數 977 億餘元，占累計分配預算數 1,240 億餘元之 78.79%。各主管機關已實現比率¹未達 80%者，計有行政院、客家委員會及所屬、衛生福利部、國家發展委員會、國立故宮博物院、財政部、農業委員會、文化部、交通部、原住民族委員會、環境保護署及海洋委員會等 12 個機關（詳附表 1、附圖 1），各項工作計畫已實現比率未達 80%者，計有 95 項（詳附表 2、附圖 2），截至 110 年度第 4 季止，累計實現數如加計預付數 90 億餘元，合計 1,068 億餘元，占累計分配預算數之 86.12%。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數 2,298 億餘元，截至 110 年度第 4 季止，累計實現數 180 億元，占累計分配預算數 1,240 億餘元之 14.51%，主要係配合該特別預算歲出經費需求及國庫資金調度辦理。

¹ 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算歲出執行情形

110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
	合計	229,830	124,059	97,752	78.79			9,083	106,836	86.12
1	行政院	809	409	—	—	主要係「臺灣資安卓越深耕－資安卓越中心計畫」分由行政院、科技部、經濟部及教育部共同執行，因各該部會子計畫協調評估進度未如預期，延遲計畫執行，相關預付之款項將於各計畫結案時轉正實現等，致影響預算實現率。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	384	384	93.89
2	客家委員會及所屬	1,088	129	22	17.70	主要係補助桃園市政府辦理客家博覽會及客庄藝術季等策展籌備項目，因執行進度尚未達經費核銷條件所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請客家委員會研謀具體改善措施。	—	22	17.70
3	衛生福利部	5,665	2,095	500	23.88	主要係食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫，工程採	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	22	522	24.95

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						購多次流標所致。				
4	國家發展委員會	1,780	843	212	25.20	主要係辦理促進 5G 及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫，尚未完成經費核銷，暨辦理加速推動地方創生相關委辦事項，執行時程調整等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	217	430	51.03
5	國立故宮博物院	207	98	35	36.48	主要係數位典藏智能化及虛實整合數位展示與 5G 數位人文國家隊飛向新世界等計畫，相關採購案承商尚未請款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	35	36.48
6	財政部	251	125	50	40.21	主要係財政資訊中心推動雲端發票數位服務計畫委外服務案及稅務好幫手委外建置案，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響尚未完成驗收付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	50	40.21
7	農業委員會	6,573	3,197	1,482	46.36	主要係辦理水土保持及山坡地治理工程，因多次豪大雨無法施工，及阿里山	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	380	1,862	58.25

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						林業鐵路車輛購置計畫，尚未完成審查等所致。				
8	文化部	5,560	2,762	1,524	55.20	主要係補助地方政府辦理美術館與藝文館舍建置及升級、再造歷史現場等計畫，因受國際原料缺貨或發包作業不順，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	408	1,933	70.00
9	交通部	59,285	26,084	16,170	61.99	主要係嘉義市區鐵路高架化及桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展等計畫，因工程採購多次流標或預付款未達轉正標準，致經費執行進度未如預期。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部研謀具體改善措施。	4,859	21,029	80.62
10	原住民族委員會	1,862	856	573	66.98	主要係補助地方政府辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫，部分地方政府尚未請撥經費所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	573	66.98
11	環境保護署	970	532	387	72.87	主要係補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，因工程流標或驗收爭議未決，致執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	11	399	75.07

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
12	海洋委員會	1,000	1,000	774	77.41	主要係辦理海域遊憩活動安全動態資訊系統建置計畫，相關採購案受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，致工期延長或用地及水土保持申報作業延宕。	審計部業就預算執行落後情形，函請海洋委員會研謀具體改善措施。	29	803	80.37
13	總統府	264	132	106	80.82			—	106	80.82
14	內政部	20,666	9,498	7,889	83.06			—	7,889	83.06
15	經濟部	62,526	32,545	27,284	83.83			2,476	29,761	91.44
16	教育部	33,422	27,191	24,934	91.70			110	25,045	92.11
17	原子能委員會	420	210	193	91.91			2	195	92.87
18	國家通訊傳播委員會	17,530	10,973	10,397	94.75			17	10,414	94.90
19	科技部	9,905	5,363	5,200	96.95			163	5,363	100

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
20	公共工程委員會	41	12	12	100.00			—	12	100.00

- 註：1. 本表係依據各機關 110 年 12 月份中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。
2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。
3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。
4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附表 2

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算各項工作計畫預算執行情形

110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：百萬元

排 序	辦 理 機 關	工 作 計 畫 名 稱	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 （ 註 2 ）		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 落 後 原 因	審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 （ 註 3 ）	累 計 實 現 數 + 預 付 數	
					金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
合 計			229,830	124,059	97,752	78.79			9,083	106,836	86.12
一、軌道建設			40,197	17,708	10,784	60.90			2,958	13,743	77.61
1	鐵道局及所屬	都市推動捷運	531	142	—	—	主要係機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫工程決標較原訂時程延遲所致。	審計部將廣續追蹤後續辦理情形。	30	30	21.11
2	交通部	臺鐵升級及改善東部服務	3,449	569	77	13.59	主要係臺鐵電務智慧化提升計畫項下高壓分群裝置計價延遲所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部督促檢討改進。	—	77	13.59
3	交通部	中南部觀光鐵路	613	282	86	30.81	主要係集集支線基礎設施改善計畫土木統包工程迄 110 年底始	審計部業就預算執行落後情形，函	—	86	30.81

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							決標，影響預算執行所致。	請交通部督促檢討改進。			
4	鐵道局及所屬	軌道規劃作業	358	182	64	35.56	主要係臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業進度落後所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	64	35.56
5	林務局	中南部觀光鐵路	1,342	646	306	47.48	主要係阿里山森林鐵路42號隧道計畫工程進度落後，及阿里山林業鐵路車輛購置計畫尚在審查中所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	77	384	59.45
6	鐵道局及所屬	臺鐵升級及改善東部服務	6,439	3,742	2,134	57.04	主要係臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫，各項工程尚未完成驗收作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	619	2,753	73.59
7	鐵道局及所屬	鐵路立體化及通勤提速	10,765	5,222	3,162	60.57	主要係嘉義市區鐵路高架化計畫部分工程多次流標或臨軌作業僅能夜間施工，致經	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,199	4,362	83.54

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							費執行進度落後。				
8	交通部	都市推動捷運	16,694	6,923	4,951	71.52	主要係桃園都會區大 眾捷運系統航空城捷 運線暨土地整合發展 計畫工程預付款未達 核銷轉正標準所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改 進。	1,031	5,983	86.43
9	交通部	高鐵臺鐵連結 成網	5	—	—	—			—	—	—
二、水環境建設			52,382	26,071	20,992	80.52			2,463	23,456	89.97
1	漁業署及所 屬	水與環境	200	100	2	2.08	主要係受補助市縣政 府請款資料，尚待審 核後撥款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	2.08
2	漁業署及所 屬	水與安全	564	356	66	18.72	主要係補助市縣政府 計畫未達撥款條件， 尚未請款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	66	18.72
3	水利署及所 屬	水與環境	2,000	1,000	310	31.06	主要係補助地方政府辦 理全國水環境改善計 畫，部分案件尚未發 包，或尚未核銷所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	71	382	38.25

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
4	環境保護署	水與發展	150	122	50	41.10	主要係補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，因工程流標，或驗收爭議未決，款項未能如期撥付所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	50	41.10
5	觀光局及所屬	水與環境	200	100	45	45.59	主要係相關計畫審查作業受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，改以視訊會議方式辦理，差旅業務費等支出較預計減少，及部分全國水環境改善計畫-遊憩據點案件係與經濟部水利署共同補助地方政府辦理，優先以水利署經費支應所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	45	45.59
6	水土保持局	水與發展	710	410	221	54.08	主要係辦理水土保持及山坡地治理工程因多次豪大雨無法施工，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	139	361	88.12

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
7	水土保持局	水與安全	1,093	468	267	57.16	主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫因多次豪大雨無法施工，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	159	427	91.17
8	林務局	水與安全	276	137	89	65.14	主要係竹崎鄉金獅村牛稠溪區域排水治理工程，因發包時程延宕，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	89	65.14
9	環境保護署	水與環境	400	200	142	71.47	主要係補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，因工程流標，或驗收爭議未決，款項未能如期撥付所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	142	71.47
10	國家海洋研究院	水與環境	643	643	471	73.30	主要係辦理採購案，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響致工期需延長、用地及水土保持申報作業延宕等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	471	73.30

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	營建署及所屬	水與環境	200	100	76	76.32	主要係高雄市政府辦理愛河沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫，尚未完成檢據核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	76	76.32
12	水利署及所屬	水與安全	16,450	8,900	6,873	77.24	主要係補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，部分案件尚未發包，或尚未核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,637	8,511	95.63
13	林務局	水與發展	650	350	278	79.55	主要係部分工程因豪雨停工展期，尚未驗收付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	278	79.55
14	海巡署及所屬	水與環境	350	350	296	84.70			29	326	93.15
15	營建署及所屬	水與安全	5,650	2,350	2,071	88.13			—	2,071	88.13
16	海洋委員會	水與環境	7	7	6	90.76			—	6	90.76
17	水利署及所屬	水與發展	21,872	10,189	9,438	92.63			425	9,864	96.81

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
18	農田水利署	水與安全	665	137	133	96.98			—	133	96.98
19	公路總局及 所屬	水與安全	300	150	150	100.00			—	150	100.00
三、綠能建設			7,838	4,455	3,918	87.95			95	4,014	90.10
1	中央地質調 查所	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	144	74	23	30.98	主要係空中重力探測 設備購置，進度未如 預期所致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	12	35	47.81
2	公路總局及 所屬	完備綠能技術 及建設	160	80	31	39.35	主要係智慧電動巴士 DMIT—智慧自駕公路 創新移動服務營造計 畫招標作業期程延後 所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改進。	23	55	68.75
3	營建署及所 屬	加速綠能科學 城建置	133	133	80	60.56	係計畫賸餘款。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	80	60.56
4	中央研究院	加速綠能科學 城建置	139	69	44	64.08	主要係「建置分散式 區域規模之大型儲能 系統，推動綠能產業 發展計畫」相關儲能	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	44	64.08

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							系統設備採購案驗收 作業尚在辦理中所 致。				
5	公路總局及 所屬	加速綠能科學 城建置	346	178	120	67.51	主要係科學城低碳智 慧環境基礎建置-聯 外道路建置計畫，相 關工程預付款未如期 辦理轉正所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改進。	57	178	100.00
6	能源局	完備綠能技術 及建設	675	287	202	70.42	主要係部分計畫尚未 完成驗收或招標作業 未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	202	70.42
7	工業局	完備綠能技術 及建設	690	390	291	74.69	主要係因規劃建置訓 練場域位於金屬中心 高雄園區受中油污染 場址範圍內，需向環 保署申請土地利用許 可，其審查作業受新 型冠狀病毒肺炎 (COVID-19)疫情影響 因而延遲，致財物採 購委託代辦作業執行	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	291	74.69

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							時程落後。				
8	標準檢驗局 及所屬	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	800	402	300	74.85	主要係儲能系統安全 檢測試驗室新建統包 工程採購及離岸風電 相關檢測設備採購 案，進度未如預期所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	300	74.85
9	核能研究所	完備綠能技術 及建設	420	210	193	91.91			2	195	92.87
10	科技部	加速綠能科學 城建置	3,164	1,934	1,934	100.00			—	1,934	100.00
11	經濟部	完備綠能技術 及建設	590	340	340	100.00			—	340	100.00
12	科技部	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	440	220	220	100.00			—	220	100.00
13	能源局	加速綠能科學 城建置	137	137	137	100.00			—	137	100.00
四、數位建設			44,304	24,445	20,905	85.52			1,107	22,012	90.05
1	行政院	基礎建設環境	809	409	—	—	主要係「臺灣資安卓	審計部將賡	384	384	93.89

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							越深耕-資安卓越中心計畫」分由行政院、科技部、經濟部及教育部共同執行，相關預付款項須俟各計畫結案後核銷所致。	續追蹤後續 辦理情形。			
2	原住民族委員會	推廣數位公益服務	20	10	—	—	主要係辦理臺灣原住民族重大歷史事件影片拍攝及託播勞務採購案，因歷經多次協調該採購案預算經費來源，迄於110年12月方完成決標所致。	審計部將賡續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
3	文化部	基礎建設環境	31	8	—	—	主要係文化部公有雲計畫諮詢輔導及租賃案、藝文活動報名暨管理系統案委外作業因需求複雜延遲公告招標，致執行率落後。	審計部將賡續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
4	內政部	基礎建設環境	41	24	0.01	0.05	主要係配合國家發展委員會提供公有雲環	審計部將賡續追蹤後續	—	0.01	0.05

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							境各項系統資料移轉 所需規格之前置作 業，辦理軟體更新及 系統增修採購案發包 作業執行未如預期所 致。	辦理情形。			
5	交通部	推廣數位公益 服務	396	198	11	5.68	主要係 5G 帶動智慧 交通技術與服務創新 及產業發展計畫核定 時程延遲所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改 進。	—	11	5.68
6	消防署及所 屬	推廣數位公益 服務	428	203	16	8.30	主要係受新型冠狀病 毒肺炎（COVID-19） 疫情影響相關建置案 未及完成，經費執行 情形落後所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	16	8.30
7	中央氣象局	基礎建設環境	1,000	500	62	12.54	主要係強化氣象資訊 基礎建設計畫部分採 購案受新型冠狀病毒 肺炎（COVID-19）疫情 影響，廠商製造及備	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改	—	62	12.54

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							貨期程延長所致。	進。			
8	鐵道局及所屬	推廣數位公益服務	120	50	8	16.96	主要係推動 5G 提升智慧交通服務效能與安全計畫-強化鐵道運輸安全工作計畫書核定時程，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響延後所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	8	16.96
9	國立故宮博物院	推廣數位公益服務	147	68	16	24.00	主要係 5G 數位人文國家隊飛向新世界等計畫採購案尚未請款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	16	24.00
10	財政資訊中心	基礎建設環境	179	91	22	24.28	主要係財政資訊中心推動雲端發票數位服務計畫委外服務案及稅務好幫手委外建置案，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，尚未完成驗收付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	22	24.28

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	農業委員會	基礎環境建設	62	29	7	24.51	主要係「多時期遙測影像資料立方處理計畫」及「全國農田坵塊圖整合編修計畫」甫完成審查，尚未辦理經費核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	7	24.51
12	警政署及所屬	推廣數位公益服務	591	286	80	28.10	主要係警消微波通訊系統移頻更新委託規劃設計暨監造服務案因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，整體執行期程順延所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	80	28.10
13	國家發展委員會	推廣數位公益服務	544	247	85	34.44	主要係辦理促進5G及人工智慧導入智慧城市物聯網創新應用補助計畫尚未完成核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	134	219	88.79
14	文化部	推廣數位公益服務	682	327	113	34.79	主要係影音場域建置及推廣計畫，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	159	273	83.56

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							延長補助案受理時間，或配合整體業務執行需要，辦理契約變更，款項延後撥付所致。				
15	消防署及所屬	建構開放政府及智慧城鄉服務	90	45	16	35.69	主要係廠商核銷作業未及完成，致經費執行情形落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	16	35.69
16	消防署及所屬	基礎建設環境	191	91	35	38.72	主要係補助國家災害防救科技中心經費尚未完成核銷作業，致經費執行情形落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	35	38.72
17	動植物防疫檢疫局及所屬	推廣數位公益服務	22	11	4	40.73	主要係「屠宰衛生檢查數位管理服務及查核系統」招標進度落後所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	4	40.73
18	農糧署及所屬	推廣數位公益服務	14	7	3	45.47	主要係智慧化鳳梨理集貨管理系統計畫採購案，執行期程跨年度，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	3	45.47

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
19	衛生福利部	推廣數位公益 服務	281	140	70	50.13	主要係偏遠地區遠距 醫療建置計畫受補助 單位尚未申請撥付補 助款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	70	50.13
20	中小企業處	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	140	60	31	52.65	主要係預付中小企業 行動智慧應用計畫補 助款核銷進度未如預 期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	25	56	94.32
21	交通部	5G 基礎公共建 設	60	30	16	54.89	主要係 5G/B5G 電信 資源整備及通訊網路 發展研究計畫廠商未 及請款所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改進。	—	16	54.89
22	農業委員會	推廣數位公益 服務	210	107	62	58.13	主要係「智慧農業擴 散計畫」部分補助案 受新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情影 響，申請展期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	4	66	61.88
23	國立故宮博 物院	發展數位文創 普及高畫質服 務	60	30	19	64.96	主要係數位典藏智能 化及虛實整合數位展 示等計畫採購案尚未	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	19	64.96

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							請款所致。				
24	中央健康保險署	推廣數位公益服務	12	6	4	67.27	主要係110年虛擬健保卡就醫模式試辦方案委辦案未完成期末報告審查，尚未辦理驗收核銷作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	4	67.27
25	食品藥物管理署	推廣數位公益服務	6	3	2	69.06	主要係委辦計畫經費尚未完成結報所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	2	69.06
26	國家通訊傳播委員會	縮短5G偏鄉數位落差	773	384	300	78.13	主要係補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺委外服務案，受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情因素調降委外服務需求所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	17	317	82.62
27	中小企業處	產業數位轉型	1,490	750	587	78.40	主要係預付引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫補助款核銷進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	160	748	99.83

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
28	文化部	發展數位文創 普及高畫質服 務	210	105	83	79.16	主要係國家文化記憶 庫計畫部分專案合作 及補助案件展延執行 期程，經費尚未撥付 所致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	4	87	83.07
29	教育部	縮短5G偏鄉數 位落差	500	250	204	81.78			6	210	84.34
30	關務署及所 屬	基礎建設環境	72	34	28	82.81			—	28	82.81
31	科技部	5G 基礎公共建 設	550	250	213	85.33			36	250	100.00
32	科技部	基礎建設環境	1,203	610	528	86.60			81	610	100.00
33	教育部	數位人才淬煉	436	210	185	88.39			2	188	89.55
34	臺中區農業 改良場	推廣數位公益 服務	10	5	4	90.41			—	4	90.41
35	中央氣象局	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	166	83	75	90.82			—	75	90.82
36	原住民族委 員會	縮短5G偏鄉數 位落差	150	100	91	91.64			—	91	91.64

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
37	環境保護署	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	371	184	169	91.67			11	181	97.99
38	國立臺灣美 術館及所屬	推廣數位公益 服務	37	22	20	91.86			—	20	91.86
39	經濟部	基礎建設環境	31	11	10	92.44			—	10	92.44
40	國家發展委 員會	基礎建設環境	43	39	37	94.46			—	37	94.46
41	工業局	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	895	360	340	94.61			—	340	94.61
42	國家通訊傳 播委員會	推廣數位公益 服務	166	56	53	95.01			—	53	95.01
43	科技部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	640	320	304	95.03			15	320	100.00
44	經濟部	產業數位轉型	6,197	3,639	3,469	95.35			34	3,504	96.28
45	國家通訊傳 播委員會	5G 基礎公共建 設	16,591	10,533	10,043	95.35			—	10,043	95.35

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
46	科技部	產業數位轉型	1,258	651	622	95.54			29	651	100.00
47	工業局	基礎建設環境	24	11	11	95.77			—	11	95.77
48	標準檢驗局 及所屬	推廣數位公益 服務	50	15	14	96.09			—	14	96.09
49	高雄區農業 改良場	推廣數位公益 服務	10	5	4	96.47			—	4	96.47
50	教育部	基礎建設環境	496	100	96	96.95			—	96	96.95
51	林務局	推廣數位公益 服務	12	6	5	97.13			—	5	97.13
52	農業試驗所	推廣數位公益 服務	18	9	8	97.58			—	8	97.58
53	運輸研究所	推廣數位公益 服務	27	12	11	98.24			—	11	98.24
54	工業局	推廣數位公益 服務	1,020	545	537	98.61			—	537	98.61
55	國史館	推廣數位公益 服務	79	39	38	99.01			—	38	99.01
56	國民及學前 教育署	數位人才淬煉	154	82	81	99.01			—	81	99.01

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
57	中央研究院	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	46	24	23	99.25			—	23	99.25
58	工業局	產業數位轉型	1,670	848	842	99.30			—	842	99.30
59	國民及學前 教育署	基礎建設環境	500	250	249	99.65			—	249	99.65
60	智慧財產局	基礎建設環境	36	15	15	99.87			—	15	99.87
61	公路總局及 所屬	基礎建設環境	197	12	11	99.87			—	11	99.87
62	中小企業處	推廣數位公益 服務	125	60	59	99.89			—	59	99.89
63	農業試驗所	基礎建設環境	22	11	11	99.96			—	11	99.96
64	工業局	數位人才淬鍊	580	280	279	99.98			—	279	99.98
65	環境檢驗所	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	48	25	25	100.00			—	25	100.00
66	經濟部	推廣數位公益 服務	320	160	160	100.00			—	160	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
67	經濟部	5G 基礎公共建 設	180	90	90	100.00			—	90	100.00
68	科技部	數位人才淬煉	150	78	78	100.00			—	78	100.00
69	公路總局及 所屬	推廣數位公益 服務	123	68	68	100.00			—	68	100.00
70	經濟部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	124	62	62	100.00			—	62	100.00
71	鐵道局及所 屬	基礎環境建設	101	21	21	100.00			—	21	100.00
72	交通部	基礎建設環境	202	17	17	100.00			—	17	100.00
73	公共工程委 員會	基礎建設環境	41	12	12	100.00			—	12	100.00
74	標準檢驗局 及所屬	基礎建設環境	14	2	2	100.00			—	2	100.00
五、城鄉建設			76,563	47,434	38,447	81.05			2,364	40,811	86.04
1	公路總局及 所屬	加速推動地方 創生	100	50	—	—	主要係加速推動地方 創生計畫配合國家發 展委員會核定補助案	審計部業就 預算執行落 後情形，函	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							件期程延後所致。	請交通部督 促檢討改進。			
2	原住民族委 員會	加速地方創生	60	30	—	—	主要係須經地方政府 申請及行政院地方創 生會報工作會議同 意，核定期程較晚所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
3	觀光局及所 屬	加速推動地方 創生	40	20	—	—	主要係加速推動地方 創生計畫，受新型冠 狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情影 響，補助案件核定期 程延後所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
4	漁業署及所 屬	加速推動地方 創生	175	100	0.005	0.01	主要係補助市縣政府 計畫尚在審查中所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	0.005	0.01
5	農糧署及所 屬	加速推動地方 創生	85	50	0.4	0.80	主要係補助屏東縣政 府辦理屏東縣農業國 際化標準包裝加工計 畫，受新型冠狀病毒 肺炎(COVID-19)疫情	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	0.4	0.80

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							影響，致執行進度未 如預期。				
6	水土保持局	加速推動地方 創生	430	250	2	1.03	主要係補助市縣政府 辦理計畫尚未核定所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	1.03
7	衛生福利部	公共服務據點 整備	1,469	426	8	2.10	主要係整建長照衛福 據點計畫，部分案件 工程招標作業進度落 後，及地方政府申請 補助案件數未如預期 等所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	20	28	6.80
8	消防署及所 屬	公共服務據點 整備	166	68	2	2.98	主要係補助地方政府 辦理廳舍拆除重建工 程尚未完成核銷作 業，致經費執行情形 落後。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	2.98
9	體育署	校園社區化改 造	244	85	3	3.68	主要係補助地方政府 興整建學校草地運動 場等計畫，部分案件 已撥款尚未完成核結 作業所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請體育署研 謀具體改善 措施。	81	84	99.35

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
10	經濟部	公共服務據點 整備	280	60	2	4.06	主要係公有危險建築 補強重建-公有零售 市場計畫，因部分地 方政府納入預算、發 包採購、規劃設計等 期程延遲所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	4.06
11	交通部	推動觀光升級	1,268	483	19	4.10	主要係海洋觀光計畫 因東岸串接工程設計 延宕，未能如期決標 所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改進。	233	253	52.44
12	客家委員會 及所屬	加速推動地方 創生	40	20	1	7.00	主要係行政院地方會 報工作會議實際核定 時程較晚所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	1	7.00
13	文化部	加速推動地方 創生	140	70	8	12.07	主要係補助地方政府 及民間團體執行跨年 度地方創生計畫，撥 付第1期款列暫付 數，後續將俟計畫執 行完畢後辦理轉正。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	59	67	96.58

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
14	加工出口區 管理處及所 屬	開發在地型產 業園區	306	156	20	13.21	主要係「高雄園區標 準廠房暨聯合辦公大 樓興建統包工程」受 新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫 情 影 響，尚未驗收結算所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	20	13.21
15	衛生福利部	加速推動地方 創生	300	150	22	15.23	主要係加速推動地方 創生計畫之地方創生 長照衛福據點整備， 經國發會核定案件補 助經費較分配數減少 所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	22	15.23
16	國民健康署	公共服務據點 整備	100	25	4	16.03	主要係補助地方政府 辦理「銀髮健身俱樂 部補助計畫」，部分 縣市未達撥款條件所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	2	6	26.35
17	鐵道局及所 屬	推動觀光升級	127	30	5	16.50	主要係臺鐵車站美學 與功能提升計畫委託 設計監造技術服務 案，因招標作業不	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	25	30	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							順，致影響預算執行 進度。				
18	客家委員會 及所屬	客庄 369 幸福	1,048	109	21	19.67	主要係補助桃園市政 府辦理世界客家博覽 會及客庄藝術季等策 展籌備項目，因該府 執行進度尚未達經費 核銷條件所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	21	19.67
19	體育署	充實全民運動 環境	4,200	2,400	497	20.72	主要係補助地方政府 案件，部分工程履約 期限跨年度、作業延 遲或多次流廢標等， 致執行進度未如預 期。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請體育署研 謀具體改善 措施。	—	497	20.72
20	國家發展委 員會	加速推動地方 創生	703	306	66	21.79	主要係辦理加速推動 地方創生相關委辦事 項執行時程調整所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	3	70	22.90
21	中小企業處	加速推動地方 創生	60	30	9	30.33	主要係配合國發會地 方創生運作機制，地 方政府提案進度未如 預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	9	30.33

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
22	文化資產局	加速推動地方 創生	60	30	11	37.94	主要係受補助單位辦 理招標等作業，尚未 請款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	0.7	12	40.55
23	內政部	公共服務據點 整備	539	166	72	43.81	主要係補助地方政府 辦理辦公廳舍及村里 活動中心建築補強重 建計畫，納入預算程 序及規劃設計發包作 業延遲所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	72	43.81
24	警政署及所 屬	公共服務據點 整備	530	281	126	45.02	主要係苗栗縣警察局 苗栗分局等5件耐震 補強案件已達第一階 段請款條件，惟收據 開立有誤退回修正， 未及於年底撥款所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	126	45.02
25	營建署及所 屬	加速推動地方 創生	100	50	25	51.00	主要係配合國發會審 查地方創生計畫進 度，及地方政府辦理 工程施作及請款作業 進度未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	25	51.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
26	原住民族委員會	推動原住民族多元產業發展2.0	800	300	168	56.26	主要係補助地方政府辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫，部分市縣政府尚未請領經費所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	168	56.26
27	文化部	文化生活圈建設	3,347	1,699	956	56.32	主要係補助國家電影及視聽文化中心辦理重建臺灣藝術史計畫尚在審核中，未及撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	163	1,120	65.97
28	文化資產局	文化生活圈建設	1,000	460	289	63.03	主要係補助地方政府辦理再造歷史現場計畫，各市縣政府刻正辦理採購備標或發包作業事宜，尚未請領補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	21	311	67.68
29	公路總局及所屬	改善停車問題	9,639	4,914	3,429	69.79	主要係改善停車問題計畫工程進度未達經費轉正核銷標準所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部督促檢討改進。	1,484	4,914	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
30	觀光局及所屬	推動觀光升級	2,356	1,025	732	71.51	主要係財務計畫於110年7月28日始獲行政院核定，影響執行進度所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	6	739	72.19
31	工業局	開發在地型產業園區	4,142	2,942	2,172	73.84	主要係補助地方政府「彰濱離岸風電運維基地計畫」及「仁武產業園區計畫」等案，因發包作業及土地取得時程延宕影響工程進度，未及於110年底前達成預定進度及撥款條件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	94	2,267	77.06
32	原住民族委員會	原民部落營造	832	416	312	75.22	主要係補助地方政府辦理部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫，因地方政府未及請款作業，及部落之心示範點建置補助計畫為跨年度執行且單一案件金額龐大，故審查核定期程	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	312	75.22

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							較晚等所致。				
33	營建署及所屬	城鎮之心工程	2,006	1,000	783	78.33	主要係競爭型及政策型計畫審查及核定之前置作業期程較長，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	783	78.33
34	青年發展署	加速推動地方創生	100	40	31	79.04	主要係補助地方政府案件，納入開放政府協作機制，修正計畫執行期程所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	8	39	99.67
35	中小企業處	開發在地型產業園區	684	328	263	80.37			12	275	84.04
36	公路總局及所屬	提升道路品質	3,500	1,000	853	85.37			146	1,000	100.00
37	社會及家庭署	公共服務據點整備	56	23	20	87.33			—	20	87.33
38	國民及學前教育署	人才培育促進就業建設	2,476	1,047	999	95.41			—	999	95.41
39	營建署及所屬	提升道路品質	10,000	4,700	4,502	95.81			—	4,502	95.81

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
40	國民及學前 教育署	公立高級中等 以下學校電力 系統改善暨冷 氣裝設	23,000	22,051	21,954	99.56			—	21,954	99.56
41	國立臺灣史前 文化博物館	文化生活圈建 設	52	41	41	100.00			—	41	100.00
六、少子化友善育兒空間建設			1,814	612	166	27.15			—	166	27.15
1	社會及家庭 署	因應少子化友 善育兒空間建 設	1,814	612	166	27.15	主要係建構 0-2 歲兒 童社區公共托育計 畫，部分案件工程進 度未如預期，或工程 履約期限跨年度，地 方政府未及申請撥款 或辦理核銷所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	166	27.15
七、食品安全建設			1,625	708	200	28.32			—	200	28.32
1	食品藥物管 理署	食品安全建設	1,625	708	200	28.32	主要係食品藥物管理 署辦理現代化食品藥 物國家級實驗大樓暨 行政及教育訓練大樓 興建計畫，相關工程	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	200	28.32

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							採購多次流標所致。				
八、人才培育促進就業建設			5,103	2,623	2,336	89.07			94	2,431	92.67
1	國家發展委員會	人才培育促進 就業建設	490	250	23	9.25	主要係辦理推動雙語 國家業務等委辦案， 尚未完成結案事宜所 致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	80	103	41.25
2	經濟部	人才培育促進 就業建設	9	4	3	77.54	主要係計畫經費撥款 進度未如預期所致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	3	77.54
3	中小企業處	人才培育促進 就業建設	146	73	65	89.54			—	65	89.54
4	教育部	人才培育促進 就業建設	1,306	669	626	93.56			11	638	95.33
5	國立教育廣播電臺	人才培育促進 就業建設	10	5	4	93.68			—	4	93.68
6	工業局	人才培育促進 就業建設	606	303	295	97.57			2	298	98.41
7	加工出口區管 理處及所屬	人才培育促進 就業建設	35	17	17	98.85			—	17	98.85

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
8	科技部	人才培育促進 就業建設	2,500	1,300	1,300	100.00			—	1,300	100.00

註：1. 本表係依據各機關110年12月份中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算會計報告（收支執行狀況月報表）編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。


4. 本表係按各建設計畫累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附圖 1

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算歲出已實現比率未達 80% 之主管機關

110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

已實現比率%

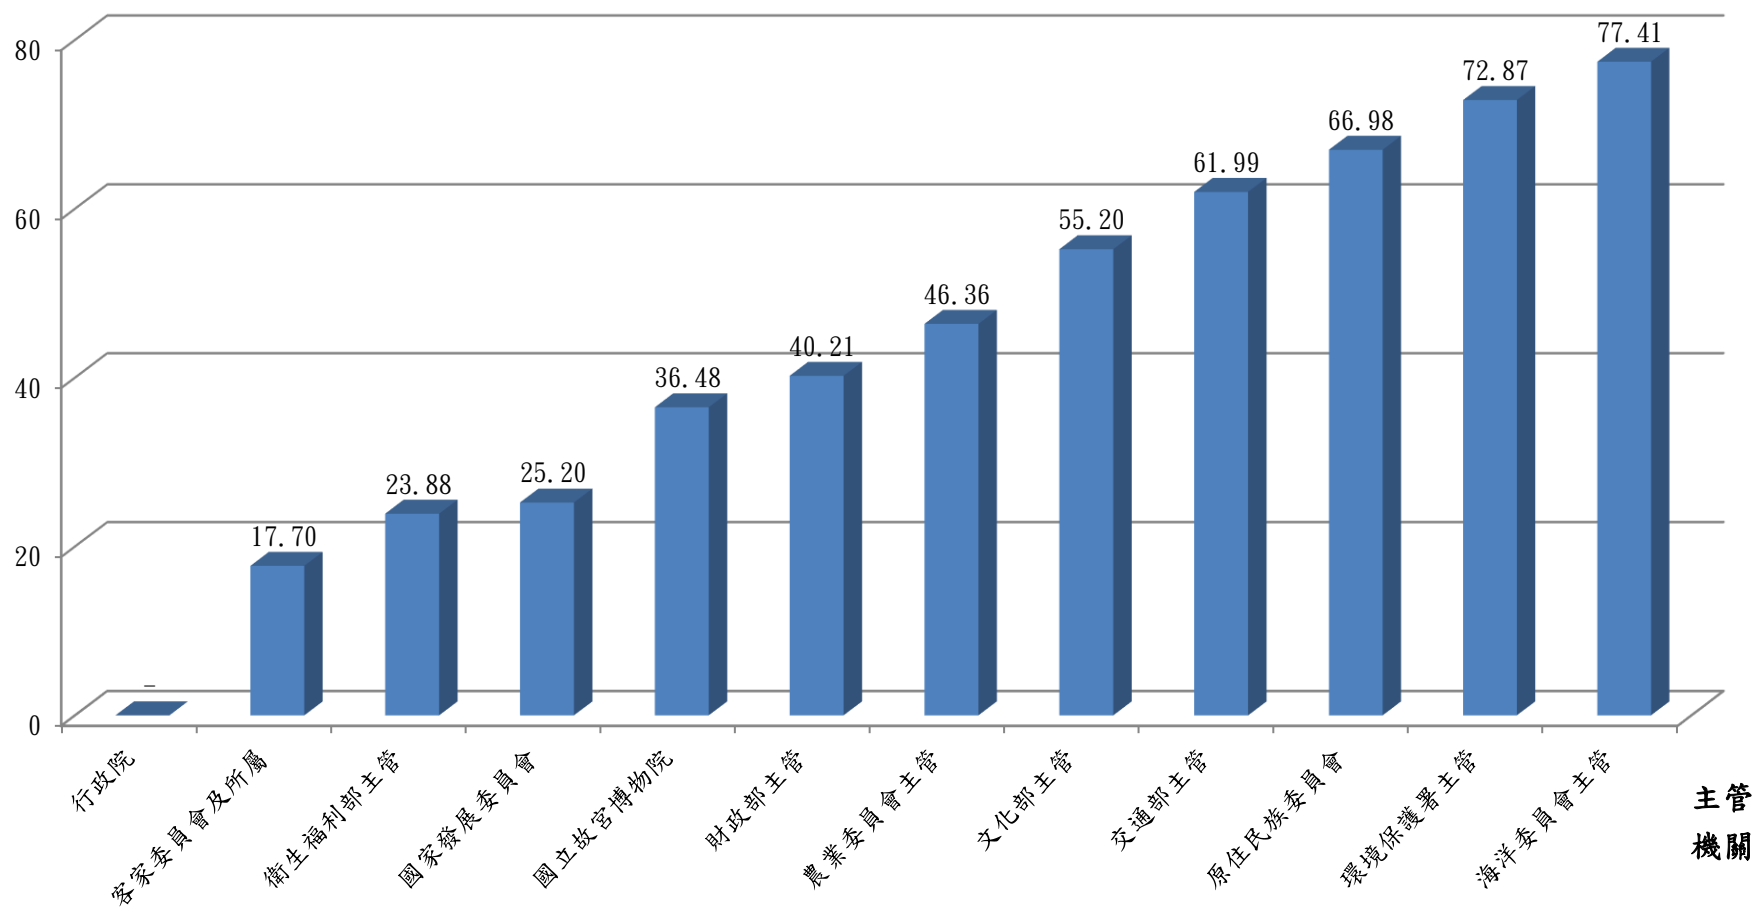

附圖 2

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算歲出各項工作計畫預算實現率最低之前 20 項計畫

110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

已實現比率%

