

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫經費執行情形

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫計 217 項，分屬 18 個主管機關¹，年計畫經費 4,043 億餘元，截至第 3 季止，年累計分配經費 2,234 億餘元，年累計執行數 2,324 億餘元，年分配經費執行率 104.03%，其中國立故宮博物院未達 80%；各項計畫年分配經費執行率未達 80%者，有 25 項計畫；總分配經費執行率未達 80%者，有 14 項計畫。各主管機關經費執行情形等詳細資料²列示如後。

- 各主管機關經費執行情形（詳附表1、附圖1）
- 年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形（詳附表2）
- 年分配經費執行率最低之前20項計畫明細（詳附圖2）
- 總分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖3）

¹係指計畫主管機關，以下同。

²各項執行情形係依據公共工程委員會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就經費執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關經費執行情形

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管 計畫 項數	年計畫 經費 (1)	年累計 分配經費 (2)	實現數 (3)	已執行 應付未付數 (4)	節餘數 (5)	預付數 (6)	年累計 執行數 (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	年分配經費 執行率 (%) (7)/(2)×100
合 計		217	404,336	223,480	185,245	28,333	136	18,770	232,485	104.03
1	國立故宮博物院	1	503	328	163	12	-	59	235	71.71
2	海洋委員會	3	324	161	71	74	-	0	145	90.39
3	經濟部	53	172,853	82,520	57,769	19,396	117	223	77,506	93.92
4	農業委員會	23	15,757	9,784	7,121	2,089	9	9	9,229	94.33
5	環境保護署	5	3,707	2,616	1,590	946	4	-	2,540	97.09
6	客家委員會	2	833	664	579	76	-	-	656	98.76
7	國防部	6	2,116	1,157	1,189	-	-	0	1,189	102.76
8	內政部	10	23,645	19,264	19,148	641	1	26	19,818	102.87
9	國家發展委員會	1	277	252	21	-	-	239	261	103.39
10	文化部	17	5,119	3,012	2,965	130	0	83	3,179	105.52
11	科技部	4	13,673	5,720	5,123	968	3	-	6,096	106.57
12	法務部	2	449	340	106	43	-	220	370	108.79
13	交通部	47	149,367	90,135	81,841	3,350	0	16,769	101,961	113.12
14	原住民族委員會	4	1,629	883	953	64	-	-	1,017	115.19
15	教育部	27	7,051	3,133	2,480	184	-	1,121	3,786	120.82
16	國軍退除役官兵輔導委員會	8	6,647	3,405	3,921	350	-	16	4,288	125.94
17	勞動部	1	42	6	4	4	0	-	8	130.05
18	衛生福利部	3	336	90	193	-	-	-	193	214.20

註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

2. 年計畫經費係指全年計畫可支用經費，包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金等。


3. 本表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

4. 國防部、原住民族委員會、國軍退除役官兵輔導委員會及衛生福利部實現數大於年累計分配經費，係部分計畫執行進度超前，主辦機關（基金）調整經費支應所致。

附圖 1

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關經費執行情形

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

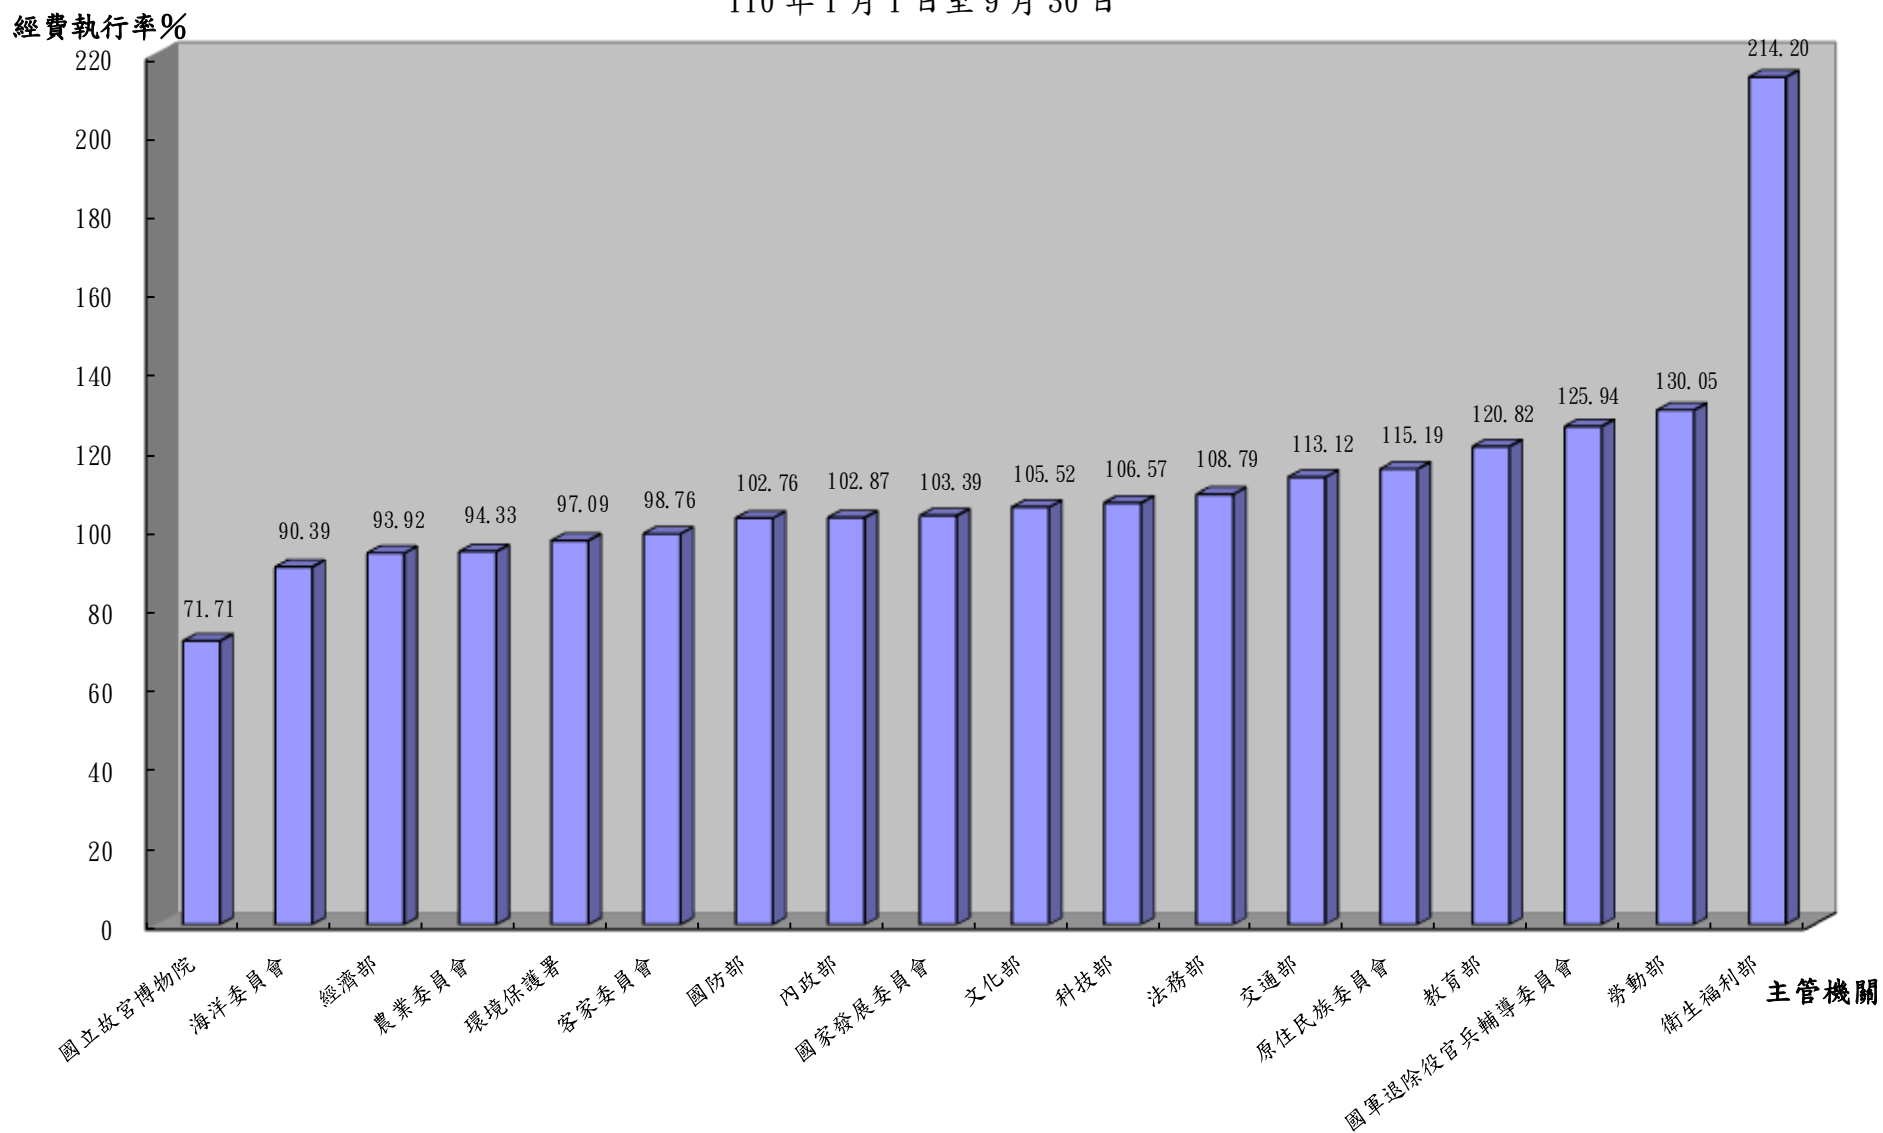

附表2

**監督110年度公共工程委員會列管5千萬元以上公共建設計畫
年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形**

110年1月1日至9月30日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
1	農業委員會	農業委員會漁業署	「彰化漁港」開發案近程(可開港營運)計畫	10401-11012	1,462,932	行政院	增加國家土地資源、節省漁民海上油料成本、改善漁民收入、增加就業機會等。	281,875	281,875	-	-	1,462,932	1,181,057	80.73	因廠商遭假扣押，工程停工所致。	業就農業委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
2	教育部	教育部	國立清華大學「藝術學院大樓新建工程」	10710-11306	699,938	行政院	新藝術學院將在音樂及藝術雙領域持續追求專業卓越，並培訓學生勇於嘗試豐富的創作、展演型態及美學風格。	150,000	90,000	1	0.00	100,000	10,001	10.00	因工程招標流標所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
3	國防部	國防部軍備局	資安園區中長期計畫	10906-11512	5,312,370	行政院	打造資安菁英人才培育基地。	76,630	75,380	4,872	6.46	75,380	4,872	6.46	因辦理預算動支程序延遲所致。	業就國防部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
4	經濟部	經濟部工業局	全國循環點點專區試點材料產暨新循環產業設置計畫	10601-11712	104,701,621	行政院	建立循環園區評估指標、資源再生產品及技術應用研究、推動在地產業升級轉型、推動大林蒲地區遷村等。	23,020,159	3,254,668	223,782	6.88	3,638,422	482,049	13.25	因地方民眾及環保團體要求須完成「遷村計畫書」，再進行園區設置，故暫緩辦理環境影響評估公開說明會等所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
5	教育部	教育部	國立臺灣大學醫學院附設東址外牆更新工程	10801-11402	1,212,824	行政院	提升臺大醫院服務品質形象，徹底解決既有東址外牆日益老化掉落之問題，讓民眾可安心就醫。	171,812	45,812	3,434	7.50	62,000	19,622	31.65	因工程招標流標所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
6	農業委員會	農業委員會	因應氣候變遷之耐逆境設施建置中長程計畫（110-113年）	11001-11312	1,415,000	行政院	可提升我國農業科技水準，促進農漁畜業轉型升級，進而發展永續產業等。	292,994	158,653	23,368	14.73	158,653	23,368	14.73	因工程尚未決標所致。	業就農業委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
7	文化部	國立傳統藝術中心	「跨藝匯流・傳統入心」-國藝中心傳統藝術共建設跨域加值發展計畫	10401-11112	2,442,401	行政院	串聯並發揮臺灣戲曲中心、宜蘭傳藝園區、高雄傳藝園區三地據點之特性，並兼具跨域加值，資源共享的經濟效能。	114,310	102,085	22,341	21.88	2,421,176	2,341,432	96.71	因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，部分展演及教育推廣活動取消等所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
8	交通部	屏東縣政府(交通部補助單位)	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	10907-11112	190,130	行政院	打造鹽埔漁港客貨運專區成為兼顧漁業、交通、觀光的複合式新港區。	123,430	8,661	2,447	28.25	8,661	2,447	28.25	因工程招標流標所致。	業就該案落後情形函請交通部督促屏東縣政府積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
9	文化部	文化部	空總臺灣當代文化實驗場二期整體發展計畫(109-116年)	10901-11612	320,251	行政院	建構臺灣文化主體性、以文化創造力帶動社會創新、創造臺灣文化與國際社會的交流與對話及提升產業加值效益。	100,702	20,000	5,775	28.88	239,549	225,324	94.06	因工程施工發現遺址而停工並解約所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
10	教育部	教育部	建構合作共享的公共圖書館系統個案計畫	10801-11312	2,715,945	行政院	健全公圖營運體制，強化整體營運效能；打造中心館舍亮點，形塑終身學習典範等。	468,886	100,000	29,891	29.89	393,028	322,919	82.16	因部分地方政府尚未辦理撥款，或工程尚未決標所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
11	教育部	教育部	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	10205-11212	6,704,473	行政院	協助我國生醫產業發展、建立與IT產業合作研發健康照護的軟硬體、響應新政府六大行動推動生技產業等	798,330	558,831	170,390	30.49	4,706,909	4,318,468	91.75	因第二期研究大樓新建工程招標多次流標所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
12	國防部	國防部軍醫局	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	10801-11312	1,757,000	行政院	提升醫院急重症處置能力及醫療服務品質，並緩解臺中市各醫學中心急診待床狀況等。	40,242	7,100	2,364	33.30	10,928	6,192	56.66	因工程招標多次流標所致。	業就國防部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
13	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫	10901-11212	1,019,243	行政院	擴大服務對象，榮家資源可高度使用，並提高自費就養率，以符合全民共享國家資源之正義原則等。	59,839	18,003	7,848	43.59	18,174	8,019	44.12	因所屬榮家辦理技術服務廠商招標及規劃設計作業延遲所致。	業就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
14	經濟部	台灣糖業股份有限公司	農業循環豬場改建投資計畫	10710-11212	10,740,790	行政院	預計可年育成502,996頭上市肉豬與外售57,600頭保育豬，投資報酬率為4.64%。	5,114,500	3,357,006	1,818,380	54.17	4,543,806	3,005,180	66.14	因第1期統包工程細部設計，廠商提送進度延遲等所致。	業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關經濟部查明處理，並報告監察院。
15	經濟部	台灣電力股份有限公司	台中電廠新建燃氣機組計畫	10703-11612	118,061,691	行政院	投資收回年限19.8年，現值報酬率2.07%，資金成本率1.80%，淨現值35億元。	20,531,166	10,688,020	5,860,545	54.83	17,606,755	12,779,280	72.58	因海域環境影響評估尚未通過，影響工程開工所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
16	經濟部	台灣電力股份有限公司	台中發電廠第5-10號機空污改善計畫	10805-11412	14,560,167	行政院	藉由設備效能提升，降低空氣污染物質排放，總體效益之現值投報率可達8.75%，投資回收年限9.3年，淨現值為108.7億元。	2,139,470	122,964	72,844	59.24	287,368	237,248	82.56	因設備採購案決標時程較預計落後所致。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
17	教育部	教育部	進修教育推廣大樓新建工程	10207-11206	191,000	教育部	促進土地有效利用，強化學校與社區聯繫，提高宿舍供給率。	60,000	38,000	22,737	59.83	53,000	37,737	71.20	因建造執照及水土保持計畫變更，延誤擋土牆施工等所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。


排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
18	文化部	國家人權博物館	國家人權博物館工程計畫	10501-11412	2,167,064	行政院	透過博物館的展示及相關活動，讓參訪者認知得來不易的民主價值與民主生活方式的珍貴性與重要性。	334,954	212,542	133,356	62.74	691,277	612,091	88.54	因預算書圖審核作業落後所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
19	交通部	臺北市政府(交通部補助單位)	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫-信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫	09902-11312	4,747,746	行政院	目標年旅行時間成本節省約1,283.5百萬元、公車營運成本節省約316.1百萬元、肇事成本節省約14.9百萬元等。	707,851	512,528	350,462	68.38	2,675,843	2,513,777	93.94	因地質不佳，影響潛盾機掘進工率所致。	業就該案落後情形函請交通部督促臺北市政府積極處理。
20	交通部	臺東縣政府(交通部補助單位)	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	10501-11212	717,030	行政院	改善漁船及交通船混雜作業所造成之擁擠及管理困擾，期盼達到「明確分隔漁商港區並共用港口」之目標。	311,883	233,256	161,592	69.28	348,185	276,521	79.42	因受他案工程施工影響，港內設施興建作業進度落後所致。	業就該案落後情形函請交通部督促臺東縣政府積極處理。
21	經濟部	台灣中油股份有限公司	L10502 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	10507-11212	66,011,854	行政院	投資收回年限26.2年，現值報酬率4.81%，淨現值91億元。	12,133,563	7,867,963	5,482,308	69.68	23,792,215	21,406,560	89.97	因建港及圍堤造地工程受外推方案影響，僅能施作原環境影響評估核定範圍之北防波堤相關作業所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
22	國立故宮博物院	國立故宮博物院	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	10701-11512	9,294,926	行政院	增加展場面積與文物展出空間、提升故宮典藏與研究空間之品質等。	503,757	328,867	235,816	71.71	2,081,838	1,988,787	95.53	因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，申請建築執照作業延遲，及部分展覽活動取消等所致。	業就國立故宮博物院所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
23	海洋委員會	海洋委員會巡署	臺中港海巡基地新建工程計畫	10401-11012	841,024	行政院	建構現代化、多面向、多功能、高效率及臺中港區指標性海事執法據點等。	118,641	109,736	82,045	74.77	832,119	804,428	96.67	因廳舍工程辦理契約變更，及部分設備採購尚未完成所致。	業就該案落後情形函請海洋委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
24	經濟部	經濟部國際貿易局	興建桃園會展中心	10601-11412	4,114,110	行政院	增加展覽攤位約600攤，有效協助出口廠商爭取海外訂單，帶動出口成長等。	1,093,050	729,871	568,299	77.86	783,149	621,577	79.37	因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響勞工出工意願所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
25	教育部	教育部	國立臺灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程	10601-11003	298,750	教育部	改善教學及研究環境、擴充實驗空間、增加教室空間。	55,045	40,000	31,268	78.17	283,705	274,973	96.92	因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響使用執照現勘及驗收作業所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
26	內政部	內政部營建署	都市更新發展計畫(108-111年)	10801-11112	1,790,000	行政院	改善老舊建築耐震能力，營造安全居住空間；活化公有閒置資產，促進地區經濟發展；健全都市機能，提升城市競爭力。	190,047	63,333	58,365	92.16	928,277	277,012	29.84	因補助地方政府辦理都市更新先期規劃，遭遇土地權屬機關整合、都市計畫回饋、招商計畫擬定、民眾陳情及文資認定等因素影響所致。	業就內政部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

註：本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

附圖 2

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 年分配經費執行率最低之前 20 項計畫明細

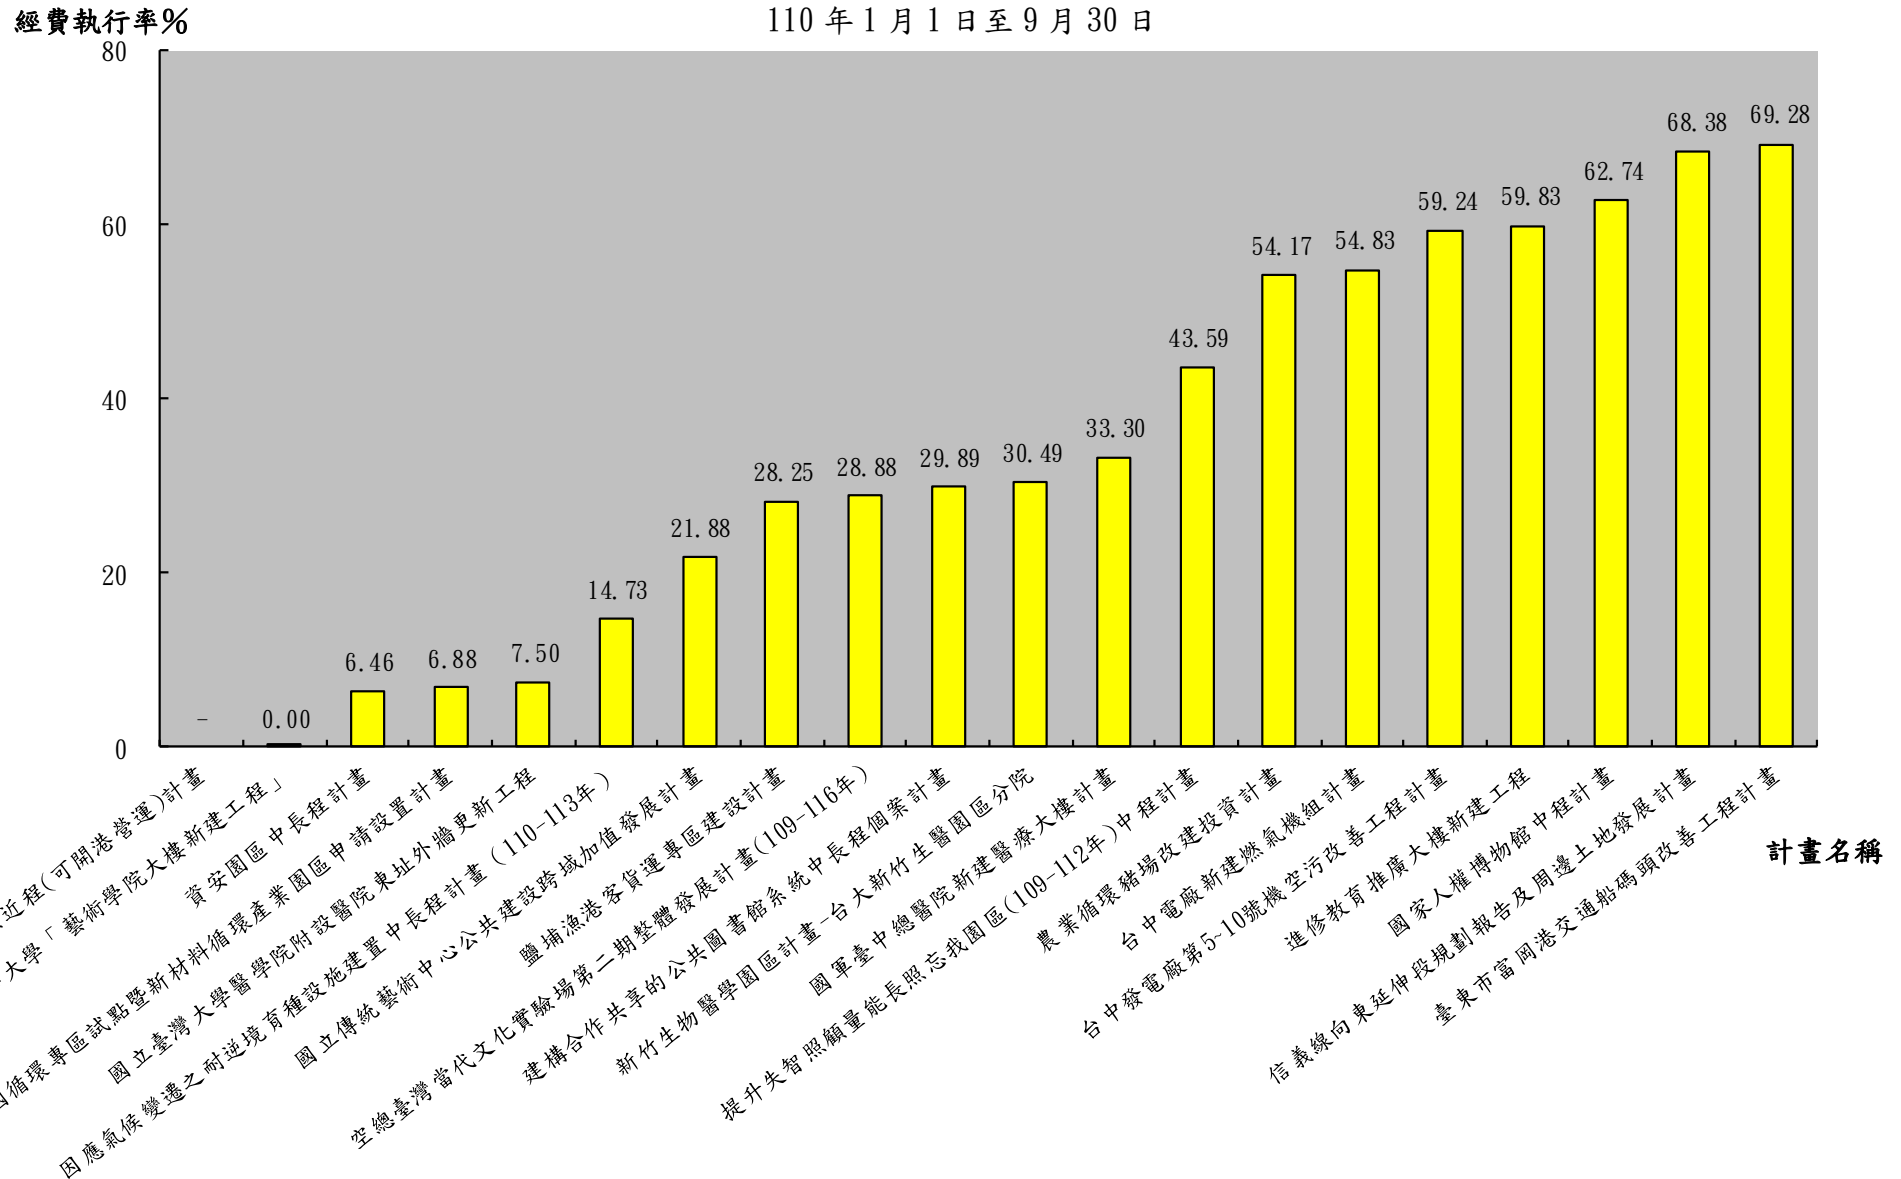

附圖 3

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 總分配經費執行率未達 80%計畫明細

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

