

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算，執行期間自 112 至 113 年度止，分 2 個年度實施，全部歲出預算數 2,098 億餘元，全數以舉借債務支應。截至 112 年度第 2 季止，執行情形如次：

### 一、歲入

歲入未編列預算，截至 112 年度第 2 季止，累計實現數 4,297 萬餘元，主要係交通部公路總局、內政部營建署等刨除料變賣收入及廠商違約罰款。

### 二、歲出

全部歲出預算數 2,098 億餘元，分由總統府、國家發展委員會及內政部等 19 個主管機關執行，共計辦理 141 項業務計畫，192 項工作計畫。截至 112 年度第 2 季止，累計實現數 218 億餘元，占累計分配預算數 348 億餘元之 62.84%。各主管機關已實現比率<sup>1</sup>未達 80%者，計有客家委員會及所屬、國家發展委員會、財政部、衛生福利部、教育部、環境保護署、交通部、農業委員會、文化部、原住民族委員會及經濟部等 11 個機關（詳附表 1、[附圖 1](#)），各項工作計畫已實現比率未達 80%者，計有 90 項（詳附表 2、[附圖 2](#)），截至 112 年度第 2 季止，累計實現數如加計預付數 53 億餘元，合計 272 億餘元，占累計分配預算數之 78.22%。

### 三、債務之舉借

債務之舉借預算數 2,098 億餘元，截至 112 年度第 2 季止，尚無實現數，該特別預算歲出經費需求，由國庫先行統籌調度。

---

<sup>1</sup> 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

## 監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出執行情形

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

| 排序 | 主管機關     | 預算數     | 累計分配預算數 | 累計實現數(註2) |           | 累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因                                              | 審計部處理情形         | 預付數(註3) | 累計實現數+預付數 |           |
|----|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
|    |          |         |         | 金額        | 占累計分配預算數% |                                                                     |                 |         | 金額        | 占累計分配預算數% |
|    | 合計       | 209,832 | 34,810  | 21,875    | 62.84     |                                                                     |                 | 5,352   | 27,227    | 78.22     |
| 1  | 客家委員會及所屬 | 866     | 495     | 4         | 0.84      | 主要係撥付桃園市政府辦理世界客家博覽會執行進度尚未達經費核銷條件所致。                                 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 448     | 453       | 91.34     |
| 2  | 國家發展委員會  | 2,821   | 374     | 109       | 29.24     | 主要係推廣數位公益服務之亞洲矽谷相關委託案委辦協議書尚未完成，及雙語政策行政法人設置條例尚未經立法院審議通過，相關經費無法支用等所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 139     | 249       | 66.62     |
| 3  | 財政部      | 333     | 1       | 0.5       | 30.99     | 主要係關務署及所屬因盤點資安軟硬體環境配置及業務需求耗時較久，尚未完成採購作業所致。                          | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —       | 0.5       | 30.99     |
| 4  | 衛生福利部    | 4,484   | 648     | 208       | 32.13     | 主要係辦理建構0—2歲兒童社區公共托育計畫，部分案件尚未完成招標作業，或執行進度未達撥款條件所致。                   | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 109     | 317       | 49.01     |
| 5  | 教育部      | 12,312  | 2,913   | 1,150     | 39.49     | 主要係部分補助計畫尚未核定所致。                                                    | 審計部將賡續追蹤後續      | 73      | 1,223     | 42.00     |

| 排序 | 主管機關    | 預算數    | 累計分配預算數 | 累計實現數(註2) |           | 累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因                                                                             | 審計部處理情形         | 預付數(註3) | 累計實現數+預付數 |           |
|----|---------|--------|---------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
|    |         |        |         | 金額        | 占累計分配預算數% |                                                                                                    |                 |         | 金額        | 占累計分配預算數% |
|    |         |        |         |           |           |                                                                                                    | 辦理情形。           |         |           |           |
| 6  | 環境保護署   | 1,152  | 134     | 65        | 49.04     | 主要係與地方政府合辦空氣品質及水質感測器，因執行進度尚未達經費核銷條件所致。                                                             | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 59      | 125       | 93.27     |
| 7  | 交通部     | 69,978 | 8,705   | 4,320     | 49.63     | 主要係花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，預付之用地取得作業費尚未完成核銷、設計技術服務廠商尚在辦理估驗款計價及土建工程未有廠商投標等，暨鐵道技術研究及驗證中心計畫，部分土建工程流標或尚待公告招標等所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 1,831   | 6,152     | 70.67     |
| 8  | 農業委員會   | 6,598  | 1,148   | 635       | 55.31     | 主要係林務局追日景觀車廂購置案招標進度未如預期，及林鐵車輛購置辦理後續擴充中；暨水保局土石流潛勢溪坑溝災害防治工程尚未完成核銷作業所致。                               | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 71      | 706       | 61.52     |
| 9  | 文化部     | 5,512  | 1,078   | 642       | 59.59     | 主要係補助辦理超高畫質內容創新應用等計畫尚未簽約，撥付經費進度不如預期所致。                                                             | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 119     | 762       | 70.69     |
| 10 | 原住民族委員會 | 1,738  | 372     | 238       | 64.14     | 主要係補助地方政府辦理推                                                                                       | 審計部將賡           | 23      | 261       | 70.32     |

| 排序 | 主管機關       | 預算數    | 累計分配預算數 | 累計實現數(註2) |           | 累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因                                 | 審計部處理情形         | 預付數(註3) | 累計實現數+預付數 |           |
|----|------------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
|    |            |        |         | 金額        | 占累計分配預算數% |                                                        |                 |         | 金額        | 占累計分配預算數% |
|    |            |        |         |           |           | 動原住民族多元產業發展2.0計畫及部落之心示範點建置計畫，尚未達撥款或核銷條件所致。             | 續追蹤後續辦理情形。      |         |           |           |
| 11 | 經濟部        | 58,810 | 12,540  | 9,069     | 72.32     | 主要係水利署辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫部分委辦計畫已符合請款條件，尚未完成請款核銷作業，影響執行進度所致。 | 審計部將廣續追蹤後續辦理情形。 | 2,072   | 11,142    | 88.85     |
| 12 | 數位發展部      | 15,867 | 1,605   | 1,303     | 81.16     |                                                        |                 | 123     | 1,426     | 88.85     |
| 13 | 內政部        | 23,267 | 3,821   | 3,203     | 83.82     |                                                        |                 | 242     | 3,445     | 90.17     |
| 14 | 國立故宮博物院    | 59     | 3       | 2         | 85.27     |                                                        |                 | —       | 2         | 85.27     |
| 15 | 原子能委員會     | 377    | 48      | 41        | 86.69     |                                                        |                 | 0.01    | 41        | 86.73     |
| 16 | 總統府        | 194    | 29      | 27        | 92.77     |                                                        |                 | 0.1     | 27        | 93.14     |
| 17 | 國家科學及技術委員會 | 5,400  | 887     | 850       | 95.87     |                                                        |                 | 36      | 887       | 100.00    |
| 18 | 公共工程委員會    | 42     | —       | —         | —         |                                                        |                 | —       | —         | —         |
| 19 | 勞動部        | 14     | —       | —         | —         |                                                        |                 | —       | —         | —         |

註：1. 本表係依據各機關112年6月份中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附表 2

## 監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算各項工作計畫預算執行情形

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

| 排<br>序 | 辦理機關   | 工作計畫名稱      | 預算數     | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註 2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達 80%<br>落後原因                                                      | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註 3） | 累計實現數+預付數 |               |
|--------|--------|-------------|---------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|
|        |        |             |         |             | 金額         | 占累計分配<br>預算數% |                                                                                      |                 |              | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 合計     |        |             | 209,832 | 34,810      | 21,875     | 62.84         |                                                                                      |                 | 5,352        | 27,227    | 78.22         |
| 一、軌道建設 |        |             | 53,730  | 6,907       | 3,054      | 44.22         |                                                                                      |                 | 1,226        | 4,280     | 61.97         |
| 1      | 鐵道局及所屬 | 都市推動捷運      | 977     | 9           | —          | —             | 主要係辦理機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫,因供電及通訊系統之設計尚未完成估驗計價所致。                                   | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —            | —         | —             |
| 2      | 鐵道局及所屬 | 臺鐵升級及改善東部服務 | 6,736   | 1,538       | 286        | 18.61         | 主要係辦理花東地區鐵路雙軌電氣化計畫,部分工程承商尚未申請預付款、或預撥地方政府之用地取得作業費尚待核銷、或設計技術服務廠商尚於估驗請款作業中等,預算執行未如預期所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 43           | 329       | 21.41         |

| 排序 | 辦理機關 | 工作計畫名稱      | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                            | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|------|-------------|--------|-------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |      |             |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                           |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 3  | 林務局  | 中南部觀光鐵路     | 2,315  | 324         | 71        | 21.90         | 主要係追日景觀車廂購置案多次招標未決，於6月甫完成決標；暨林鐵車輛購置甫完成後續擴充簽約，執行進度未如預期所致。                  | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 71        | 21.90         |
| 4  | 交通部  | 臺鐵升級及改善東部服務 | 5,891  | 140         | 34        | 24.36         | 主要係臺鐵電務智慧化提升計畫，環島光纖網路傳輸系統及導電軌工程尚在辦理驗收，及號誌聯鎖更新統包工程規劃設計所需期程較長等所致。           | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 34        | 24.36         |
| 5  | 交通部  | 都市推動捷運      | 22,144 | 1,167       | 555       | 47.56         | 主要係臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫及萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期工程)，工程進度及請款時程落後等所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 555       | 47.56         |

| 排序 | 辦理機關   | 工作計畫名稱     | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                                            | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |        |            |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                                           |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 6  | 鐵道局及所屬 | 鐵路立體化及通勤提速 | 14,855 | 3,687       | 2,074     | 56.27         | 主要係辦理臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，因桃園市政府捷運工程局代辦臺鐵桃園車站地下結構工程款，尚在辦理請撥作業所致。                            | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 1,183       | 3,258     | 88.37         |
| 7  | 鐵道局及所屬 | 軌道規劃作業     | 132    | 36          | 27        | 76.91         | 主要係高鐵延伸屏東規劃作業經行政院於112年1月3日原則同意，依環境影響評估公開說明會意見研擬替代方案進行補充評估後，納入綜合規劃，正循序賡續辦理相關作業，執行進度未如預期所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 27        | 76.91         |
| 8  | 交通部    | 中南部觀光鐵路    | 350    | 5           | 5         | 100.00        |                                                                                           |                 | —           | 5         | 100.00        |
| 9  | 經濟部    | 中南部觀光鐵路    | 250    | —           | —         | —             |                                                                                           |                 | —           | —         | —             |
| 10 | 交通部    | 高鐵臺鐵連結成網   | 76     | —           | —         | —             |                                                                                           |                 | —           | —         | —             |

| 排<br>序  | 辦<br>理<br>機<br>關 | 工<br>作<br>計<br>畫<br>名<br>稱 | 預<br>算<br>數 | 累<br>計<br>分<br>配<br>預<br>算<br>數 | 累<br>計<br>實<br>現<br>數<br>（<br>註<br>2<br>） |                                           | 累<br>計<br>實<br>現<br>數<br>占<br>累<br>計<br>分<br>配<br>預<br>算<br>數<br>未<br>達<br>80%<br>落<br>後<br>原<br>因 | 審<br>計<br>部<br>處<br>理<br>情<br>形 | 預<br>付<br>數<br>（<br>註<br>3<br>） | 累<br>計<br>實<br>現<br>數<br>+<br>預<br>付<br>數 |                                           |
|---------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                  |                            |             |                                 | 金<br>額                                    | 占<br>累<br>計<br>分<br>配<br>預<br>算<br>數<br>% |                                                                                                    |                                 |                                 | 金<br>額                                    | 占<br>累<br>計<br>分<br>配<br>預<br>算<br>數<br>% |
| 二、水環境建設 |                  |                            | 45,064      | 10,351                          | 6,845                                     | 66.13                                     |                                                                                                    |                                 | 1,957                           | 8,803                                     | 85.05                                     |
| 1       | 水利署及所屬           | 水與環境                       | 594         | 48                              | 17                                        | 35.37                                     | 主要係部分地方政府執行案件，已符合請款條件，尚未完成請款核銷作業所致。                                                                | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。                 | 20                              | 37                                        | 77.16                                     |
| 2       | 林務局              | 水與安全                       | 237         | 35                              | 14                                        | 41.10                                     | 主要係工程發包多次流標，甫完成發包作業，執行進度未如預期所致。                                                                    | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。                 | 0.04                            | 14                                        | 41.22                                     |
| 3       | 水利署及所屬           | 水與安全                       | 17,357      | 2,084                           | 872                                       | 41.83                                     | 主要係部分工程用地取得需與民眾溝通，影響工程進度及預算執行所致。                                                                   | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。                 | 926                             | 1,798                                     | 86.27                                     |
| 4       | 農業委員會            | 水與環境                       | 96          | 17                              | 8                                         | 49.79                                     | 主要係工程刻正辦理前置作業，執行進度未如預期所致。                                                                          | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。                 | —                               | 8                                         | 49.79                                     |
| 5       | 水土保持局            | 水與安全                       | 1,229       | 155                             | 84                                        | 54.37                                     | 主要係土石流潛勢溪坑溝災害防治工程，尚未完成核銷作業所致。                                                                      | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。                 | 68                              | 152                                       | 98.33                                     |
| 6       | 營建署及所屬           | 水與安全                       | 5,379       | 1,131                           | 733                                       | 64.78                                     | 主要係部分市縣政府請款作業進度未如預期所致。                                                                             | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。                 | 151                             | 885                                       | 78.20                                     |

| 排序     | 辦理機關    | 工作計畫名稱 | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                   | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|--------|---------|--------|--------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|        |         |        |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                  |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 7      | 水利署及所屬  | 水與發展   | 18,383 | 6,391       | 4,645     | 72.68         | 主要係部分地方政府執行案件，已符合請款條件，尚未完成請款核銷作業，或採購案件未能如期決標等所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 790         | 5,436     | 85.06         |
| 8      | 漁業署及所屬  | 水與環境   | 149    | 56          | 46        | 83.61         |                                                  |                 | —           | 46        | 83.61         |
| 9      | 環境保護署   | 水與環境   | 199    | 47          | 44        | 92.40         |                                                  |                 | —           | 44        | 92.40         |
| 10     | 漁業署及所屬  | 水與安全   | 382    | 98          | 94        | 96.39         |                                                  |                 | —           | 94        | 96.39         |
| 11     | 營建署及所屬  | 水與環境   | 99     | 24          | 24        | 97.17         |                                                  |                 | —           | 24        | 97.17         |
| 12     | 觀光局及所屬  | 水與環境   | 200    | 56          | 56        | 99.94         |                                                  |                 | —           | 56        | 99.94         |
| 13     | 農田水利署   | 水與安全   | 651    | 149         | 149       | 99.97         |                                                  |                 | —           | 149       | 99.97         |
| 14     | 公路總局及所屬 | 水與安全   | 104    | 55          | 55        | 100.00        |                                                  |                 | —           | 55        | 100.00        |
| 三、綠能建設 |         |        | 12,648 | 1,734       | 1,589     | 91.65         |                                                  |                 | 9           | 1,599     | 92.19         |
| 1      | 環境保護署   | 綠能建設   | 530    | 3           | —         | —             | 主要係補助地方政府案件因執行進度尚未達經費核銷條件所致。                     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | —         | —             |

| 排序 | 辦理機關         | 工作計畫名稱        | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                            | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|--------------|---------------|-----|-------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |              |               |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                           |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 2  | 公路總局及<br>所屬  | 完備綠能技術<br>及建設 | 96  | 21          | 3         | 13.75         | 主要係智慧自駕公路<br>創新移動服務營造計<br>畫委託內政部代辦採<br>購案，甫於 112 年 6<br>月 14 日完成簽約所<br>致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 3         | 13.75         |
| 3  | 林務局          | 綠能建設          | 57  | 13          | 2         | 14.64         | 主要係補助計畫未完<br>成核定作業，尚未撥<br>付款項所致。                                          | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 2         | 14.64         |
| 4  | 花蓮區農業<br>改良場 | 綠能建設          | 8   | 2           | 0.7       | 30.58         | 主要係部分計畫未達<br>撥款條件，尚未請款<br>所致。                                             | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 0.7       | 30.58         |
| 5  | 水產試驗所        | 綠能建設          | 70  | 15          | 7         | 46.44         | 主要係澎湖馬公試驗<br>場新建工程尚未達可<br>利用程度，實驗室設<br>備採購作業未能如期<br>進行所致。                 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 0.7         | 7         | 50.91         |
| 6  | 林業試驗所        | 綠能建設          | 105 | 40          | 18        | 46.73         | 主要係部分設備採購<br>計畫未達撥款條件，<br>尚未請款所致。                                         | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 18        | 46.73         |
| 7  | 農業試驗所        | 綠能建設          | 145 | 23          | 13        | 57.98         | 主要係試驗所需用品<br>採購辦理驗收作業中<br>所致。                                             | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 13        | 57.98         |

| 排序 | 辦理機關         | 工作計畫名稱 | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                             | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|--------------|--------|-----|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |              |        |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                            |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 8  | 農業委員會        | 綠能建設   | 83  | 14          | 8         | 62.41         | 主要係部分計畫未完<br>成核定作業，尚未撥<br>付款項所致。                           | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 8         | 62.41         |
| 9  | 茶業改良場        | 綠能建設   | 7   | 1           | 1         | 66.26         | 主要係計畫未達撥款<br>條件，尚未請款所致。                                    | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 1         | 66.26         |
| 10 | 國家發展委<br>員會  | 綠能建設   | 198 | 16          | 11        | 70.36         | 主要係經重新規劃改<br>以既有官網公開淨零<br>公正轉型相關資訊，<br>原規劃設備採購案暫<br>不執行所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 11        | 70.36         |
| 11 | 漁業署及所<br>屬   | 綠能建設   | 98  | 32          | 25        | 76.58         | 主要係部分執行單位<br>進度已達撥款條件，<br>尚未請款所致。                          | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 25        | 76.58         |
| 12 | 能源局          | 綠能建設   | 485 | 131         | 109       | 83.53         |                                                            |                         | —           | 109       | 83.53         |
| 13 | 苗栗區農業<br>改良場 | 綠能建設   | 2   | 0.7         | 0.6       | 84.14         |                                                            |                         | —           | 0.6       | 84.14         |
| 14 | 中央地質調<br>查所  | 綠能建設   | 419 | 50          | 42        | 84.69         |                                                            |                         | 6           | 48        | 97.23         |
| 15 | 核能研究所        | 綠能建設   | 377 | 48          | 41        | 86.69         |                                                            |                         | 0.01        | 41        | 86.73         |
| 16 | 中央地質調<br>查所  | 綠能建設   | 159 | 25          | 22        | 87.17         |                                                            |                         | 2           | 24        | 95.78         |

| 排序 | 辦理機關          | 工作計畫名稱         | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因 | 審計部處<br>理情形 | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|---------------|----------------|-----|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|    |               |                |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                |             |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 17 | 標準檢驗局<br>及所屬  | 綠能建設           | 632 | 49          | 43        | 88.46         |                                |             | 0.01        | 43        | 88.48         |
| 18 | 中央研究院         | 綠能建設           | 85  | 16          | 14        | 89.07         |                                |             | 0.1         | 14        | 89.76         |
| 19 | 臺東區農業<br>改良場  | 綠能建設           | 2   | 0.7         | 0.6       | 90.43         |                                |             | —           | 0.6       | 90.43         |
| 20 | 運輸研究所         | 加速推動地方<br>創生計畫 | 94  | 13          | 12        | 93.73         |                                |             | —           | 12        | 93.73         |
| 21 | 農糧署及所<br>屬    | 綠能建設           | 153 | 30          | 28        | 93.99         |                                |             | —           | 28        | 93.99         |
| 22 | 高雄區農業<br>改良場  | 綠能建設           | 3   | 0.8         | 0.8       | 95.18         |                                |             | —           | 0.8       | 95.18         |
| 23 | 農業藥物毒<br>物試驗所 | 綠能建設           | 5   | 1           | 1         | 95.25         |                                |             | —           | 1         | 95.25         |
| 24 | 桃園區農業<br>改良場  | 綠能建設           | 7   | 1           | 1         | 95.95         |                                |             | —           | 1         | 95.95         |
| 25 | 建築研究所         | 綠能建設           | 697 | 38          | 36        | 96.13         |                                |             | —           | 36        | 96.13         |
| 26 | 臺南區農業<br>改良場  | 綠能建設           | 11  | 4           | 3         | 96.88         |                                |             | —           | 3         | 96.88         |
| 27 | 工業局           | 綠能建設           | 114 | 10          | 10        | 99.75         |                                |             | —           | 10        | 99.75         |
| 28 | 工業局           | 綠能建設           | 543 | 94          | 94        | 99.92         |                                |             | —           | 94        | 99.92         |
| 29 | 臺中區農業<br>改良場  | 綠能建設           | 5   | 1           | 1         | 99.92         |                                |             | —           | 1         | 99.92         |

| 排序     | 辦理機關           | 工作計畫名稱                     | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                                                           | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|--------|----------------|----------------------------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|        |                |                            |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                                                          |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 30     | 能源局            | 綠能建設                       | 4,691  | 900         | 900       | 100.00        |                                                                                                          |                         | —           | 900       | 100.00        |
| 31     | 經濟部            | 綠能建設                       | 1,514  | 128         | 128       | 100.00        |                                                                                                          |                         | —           | 128       | 100.00        |
| 32     | 國家科學及<br>技術委員會 | 綠能建設                       | 270    | 1           | 1         | 100.00        |                                                                                                          |                         | —           | 1         | 100.00        |
| 33     | 公路總局及<br>所屬    | 公共充電樁設<br>置及區域充電<br>需求評估計畫 | 970    | —           | —         | —             |                                                                                                          |                         | —           | —         | —             |
| 四、數位建設 |                |                            | 38,042 | 5,587       | 4,204     | 75.24         |                                                                                                          |                         | 483         | 4,688     | 83.90         |
| 1      | 資通安全署          | 基礎建設環境                     | 1,570  | 232         | —         | —             | 主要係國家資通安全<br>研究院甫於 112 年 2<br>月份揭牌，及補助地<br>方政府計畫於 112 年<br>5 月完成審核並函復<br>同意備查，始撥付補<br>助款項，執行率未如<br>預期所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 98          | 98        | 42.33         |
| 2      | 農田水利署          | 建構開放政府<br>及智慧城鄉服<br>務      | 39     | 5           | —         | —             | 主要係智慧灌溉技術<br>於新竹灌區之研究與<br>應用採購案招標作業<br>延遲所致。                                                             | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | —         | —             |

| 排序 | 辦理機關    | 工作計畫名稱        | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                               | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|---------|---------------|-----|-------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |         |               |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                              |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 3  | 水利署及所屬  | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 102 | 26          | 0.01      | 0.04          | 主要係採購案件預付款未達核銷轉正條件所致。                                        | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 25          | 25        | 99.85         |
| 4  | 中央健康保險署 | 推廣數位公益服務      | 12  | 1           | 0.005     | 0.26          | 主要係辦理 112 年虛擬健保卡政策推展與創新應用模式計畫，為完備虛擬健保卡政策推動重點及策略，採購作業較預計落後所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 0.005     | 0.26          |
| 5  | 交通部     | 推廣數位公益服務      | 395 | 50          | 6         | 12.60         | 主要係 5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫，因申請補助案件眾多，尚在進行審查，核定及簽約撥款時程延後所致。  | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 6         | 12.60         |
| 6  | 國家發展委員會 | 推廣數位公益服務      | 990 | 248         | 41        | 16.87         | 主要係亞洲矽谷相關委託案委辦協議書尚未完成所致。                                     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 109         | 151       | 60.91         |

| 排序 | 辦理機關      | 工作計畫名稱        | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                             | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|-----------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |           |               |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                            |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 7  | 數位發展部     | 縮短5G偏鄉數位落差    | 910   | 1           | 0.2       | 17.50         | 主要係強化偏鄉地區行動寬頻網路數位韌性與近用之基礎設施建置計畫，支應專案辦公室履約價金等費用尚未完成所致。      | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 0.2       | 17.50         |
| 8  | 國立臺灣歷史博物館 | 發展數位文創普及高畫質服務 | 258   | 50          | 9         | 18.97         | 主要係分攤文化部國家文化記憶庫2.0計畫相關系統維運經費，尚待核銷轉正所致。                     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 32          | 41        | 83.17         |
| 9  | 文化部       | 推廣數位公益服務      | 1,348 | 250         | 51        | 20.77         | 主要係補助辦理超高畫質內容創新應用等計畫尚未簽約，撥付經費進度不如預期所致。                     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 12          | 64        | 25.63         |
| 10 | 鐵道局及所屬    | 推廣數位公益服務      | 135   | 30          | 7         | 24.89         | 主要係推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫，因試驗場域分項計畫尚在辦理基礎功能使用需求確認中，尚未撥付補助款所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 0.02        | 7         | 24.98         |

| 排序 | 辦理機關                | 工作計畫名稱                | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                             | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|---------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |                     |                       |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                            |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 11 | 環境保護署               | 建構開放政府<br>及智慧城鄉服<br>務 | 397 | 83          | 21        | 26.02         | 主要係與地方政府合<br>辦空氣品質及水質感<br>測器，因執行進度尚未<br>達經費核銷條件所致。         | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 59          | 81        | 97.12         |
| 12 | 關務署及所<br>屬          | 基礎建設環境                | 39  | 1           | 0.5       | 30.99         | 主要係因盤點資安軟<br>硬體環境配置及業務<br>需求耗時較久，尚未<br>完成採購作業所致。           | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 0.5       | 30.99         |
| 13 | 農業委員會               | 基礎建設環境                | 42  | 5           | 1         | 34.36         | 主要係部分計畫刻正<br>辦理審查作業，尚未<br>撥付款項所致。                          | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 1         | 34.36         |
| 14 | 動植物防疫<br>檢疫局及所<br>屬 | 推廣數位公益<br>服務          | 29  | 4           | 1         | 38.64         | 主要係屠宰衛生檢查<br>數位管理與人工智慧<br>檢查研析計畫刻正辦<br>理審查作業，尚未撥<br>付款項所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 1         | 38.64         |
| 15 | 國立臺灣美<br>術館及所屬      | 推廣數位公益<br>服務          | 29  | 1           | 0.7       | 40.96         | 主要係沉浸式展演空<br>間展演案公開徵件尚<br>未完成，執行進度未<br>如預期所致。              | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 0.7       | 40.96         |

| 排序 | 辦理機關         | 工作計畫名稱         | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                                         | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|--------------|----------------|-----|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |              |                |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                                        |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 16 | 標準檢驗局<br>及所屬 | 推廣數位公益<br>服務   | 49  | 0.06        | 0.02      | 43.08         | 主要係整合智慧讀表<br>平台發展計畫預付款<br>未達核銷轉正條件所<br>致。                                              | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 0.03        | 0.06      | 95.38         |
| 17 | 國民及學前<br>教育署 | 基礎建設環境         | 645 | 237         | 104       | 44.08         | 主要係部分受補助單<br>位尚未請款所致。                                                                  | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 104       | 44.08         |
| 18 | 教育部          | 縮短5G偏鄉數<br>位落差 | 446 | 178         | 85        | 47.83         | 主要係部分補助計畫<br>尚未核定所致。                                                                   | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 85        | 47.83         |
| 19 | 農業試驗所        | 基礎建設環境         | 15  | 1           | 1         | 53.24         | 主要係勞務採購進度<br>延宕所致。                                                                     | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 1         | 53.24         |
| 20 | 數位發展部        | 基礎建設環境         | 597 | 24          | 13        | 54.56         | 主要係應變或戰時應<br>用新興科技強化通訊<br>網路數位韌性計畫之<br>補助案，為國內非同<br>步低軌衛星之首案，<br>相關補助作業執行進<br>度未如預期所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 13        | 54.56         |

| 排序 | 辦理機關       | 工作計畫名稱        | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|------------|---------------|-----|-------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |            |               |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                               |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 21 | 衛生福利部      | 推廣數位公益服務      | 327 | 55          | 30        | 54.79         | 主要係辦理原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，為精進平臺系統功能，採購作業需時研議所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 30        | 54.79         |
| 22 | 國民及學前教育署   | 數位人才淬煉        | 107 | 52          | 33        | 63.43         | 主要係部分受補助單位尚未請款所致。                                             | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 33        | 63.43         |
| 23 | 國家科學及技術委員會 | 5G 基礎公共建設     | 818 | 50          | 32        | 64.24         | 主要係海纜及 5G 雲端聯網中心建置計畫，骨幹光纖建置之高鐵管道租金，尚待交通部鐵道局完成審核作業後覈實支付所致。     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 18          | 50        | 100.00        |
| 24 | 消防署及所屬     | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 87  | 4           | 3         | 70.76         | 主要係辦理災害防救智慧應變系統功能增修案，尚未完成驗收所致。                                | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 3         | 70.76         |
| 25 | 經濟部        | 基礎建設環境        | 25  | 4           | 3         | 72.27         | 主要係 112 年單一入口存取控管機制擴增暨外網網域整併建置                                | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 3         | 72.27         |

| 排序 | 辦理機關           | 工作計畫名稱                | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                         | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|----------------|-----------------------|-------|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |                |                       |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                        |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
|    |                |                       |       |             |           |               | 案執行進度落後，未及<br>完成撥款作業所致。                                                |                         |             |           |               |
| 26 | 教育部            | 數位人才淬煉                | 356   | 109         | 79        | 73.06         | 主要係部分補助計畫<br>尚未核定所致。                                                   | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 79        | 73.06         |
| 27 | 中央氣象局          | 建構開放政府<br>及智慧城鄉服<br>務 | 142   | 5           | 3         | 73.47         | 主要係南區氣象中心<br>地震展示空間布置更<br>新採購案，因疫情解<br>封致產業蓬勃復甦，<br>市場人力短缺，招商<br>不順所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 3         | 73.47         |
| 28 | 農業試驗所          | 建構開放政府<br>及智慧城鄉服<br>務 | 6     | 0.7         | 0.5       | 83.03         |                                                                        |                         | —           | 0.5       | 83.03         |
| 29 | 國立故宮博<br>物院    | 發展數位文創<br>普及高畫質服<br>務 | 59    | 3           | 2         | 85.27         |                                                                        |                         | —           | 2         | 85.27         |
| 30 | 智慧財產局          | 基礎建設環境                | 30    | 6           | 5         | 89.73         |                                                                        |                         | —           | 5         | 89.73         |
| 31 | 國家科學及<br>技術委員會 | 產業數位轉型                | 918   | 182         | 165       | 90.32         |                                                                        |                         | 17          | 182       | 100.00        |
| 32 | 教育部            | 基礎建設環境                | 691   | 225         | 204       | 90.59         |                                                                        |                         | —           | 204       | 90.59         |
| 33 | 高雄區農業<br>改良場   | 推廣數位公益<br>服務          | 6     | 1           | 1         | 91.70         |                                                                        |                         | —           | 1         | 91.70         |
| 34 | 經濟部            | 產業數位轉型                | 6,336 | 1,121       | 1,029     | 91.84         |                                                                        |                         | 80          | 1,110     | 99.00         |

| 排序 | 辦理機關     | 工作計畫名稱        | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因 | 審計部處<br>理情形 | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|----------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|    |          |               |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                |             |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 35 | 工業局      | 基礎建設環境        | 15    | 3           | 3         | 92.05         |                                |             | —           | 3         | 92.05         |
| 36 | 中央氣象局    | 基處建設環境        | 339   | 13          | 12        | 93.17         |                                |             | —           | 12        | 93.17         |
| 37 | 消防署及所屬   | 推廣數位公益服務      | 304   | 3           | 3         | 93.25         |                                |             | —           | 3         | 93.25         |
| 38 | 桃園區農業改良場 | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 8     | 2           | 2         | 93.39         |                                |             | —           | 2         | 93.39         |
| 39 | 原住民族委員會  | 縮短5G偏鄉數位落差    | 100   | 11          | 10        | 93.76         |                                |             | —           | 10        | 93.76         |
| 40 | 數位發展部    | 5G基礎公共建設      | 7,406 | 300         | 282       | 94.06         |                                |             | —           | 282       | 94.06         |
| 41 | 桃園區農業改良場 | 推廣數位公益服務      | 2     | 0.5         | 0.5       | 94.18         |                                |             | —           | 0.5       | 94.18         |
| 42 | 數位產業署    | 產業數位轉型        | 2,852 | 578         | 546       | 94.38         |                                |             | 21          | 567       | 98.03         |
| 43 | 數位產業署    | 5G基礎公共建設      | 229   | 71          | 68        | 95.82         |                                |             | —           | 68        | 95.82         |
| 44 | 工業局      | 推廣數位公益服務      | 603   | 148         | 142       | 95.98         |                                |             | 5           | 147       | 99.51         |
| 45 | 中央研究院    | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 40    | 9           | 9         | 96.45         |                                |             | —           | 9         | 96.45         |
| 46 | 農業委員會    | 推廣數位公益服務      | 210   | 31          | 30        | 97.16         |                                |             | —           | 30        | 97.16         |

| 排序 | 辦理機關           | 工作計畫名稱                | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因 | 審計部處<br>理情形 | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|----------------|-----------------------|-------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|    |                |                       |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                |             |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 47 | 農業試驗所          | 推廣數位公益<br>服務          | 15    | 0.8         | 0.8       | 97.40         |                                |             | —           | 0.8       | 97.40         |
| 48 | 標準檢驗局<br>及所屬   | 基礎建設環境                | 9     | 2           | 2         | 97.41         |                                |             | —           | 2         | 97.41         |
| 49 | 畜產試驗所          | 數位建設                  | 5     | 0.4         | 0.4       | 97.50         |                                |             | —           | 0.4       | 97.50         |
| 50 | 國家科學及<br>技術委員會 | 建構開放政府<br>及智慧城鄉服<br>務 | 510   | 36          | 35        | 97.55         |                                |             | 0.8         | 36        | 100.00        |
| 51 | 數位產業署          | 數位人才淬煉                | 476   | 101         | 99        | 97.59         |                                |             | 2           | 101       | 99.95         |
| 52 | 消防署及所<br>屬     | 基礎建設環境                | 158   | 8           | 8         | 97.84         |                                |             | —           | 8         | 97.84         |
| 53 | 國史館            | 推廣數位公益<br>服務          | 69    | 3           | 3         | 99.16         |                                |             | —           | 3         | 99.16         |
| 54 | 運輸研究所          | 推廣數位公益<br>服務          | 22    | 3           | 3         | 99.24         |                                |             | —           | 3         | 99.24         |
| 55 | 臺中區農業<br>改良場   | 推廣數位公益<br>服務          | 5     | 0.6         | 0.6       | 99.40         |                                |             | —           | 0.6       | 99.40         |
| 56 | 交通部            | 基礎建設環境                | 284   | 52          | 52        | 99.44         |                                |             | —           | 52        | 99.44         |
| 57 | 數位產業署          | 建構開放政府<br>及智慧城鄉服<br>務 | 1,078 | 192         | 192       | 99.56         |                                |             | 0.3         | 192       | 99.74         |

| 排序 | 辦理機關       | 工作計畫名稱        | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因 | 審計部處<br>理情形 | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|    |            |               |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                |             |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 58 | 漁業署及所屬     | 推廣數位公益服務      | 18    | 5           | 5         | 99.82         |                                |             | —           | 5         | 99.82         |
| 59 | 公路總局及所屬    | 基礎建設環境        | 460   | 76          | 76        | 99.87         |                                |             | —           | 76        | 99.87         |
| 60 | 中小企業處      | 推廣數位公益服務      | 198   | 59          | 59        | 99.92         |                                |             | —           | 59        | 99.92         |
| 61 | 工業局        | 產業數位轉型        | 1,529 | 258         | 258       | 99.96         |                                |             | —           | 258       | 99.96         |
| 62 | 國家科學及技術委員會 | 基礎建設環境        | 1,069 | 149         | 149       | 100.00        |                                |             | —           | 149       | 100.00        |
| 63 | 數位產業署      | 推廣數位公益服務      | 617   | 64          | 64        | 100.00        |                                |             | —           | 64        | 100.00        |
| 64 | 鐵道局及所屬     | 基礎建設環境        | 256   | 64          | 64        | 100.00        |                                |             | —           | 64        | 100.00        |
| 65 | 國家科學及技術委員會 | 數位人才淬煉        | 150   | 37          | 37        | 100.00        |                                |             | —           | 37        | 100.00        |
| 66 | 經濟部        | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 110   | 24          | 24        | 100.00        |                                |             | —           | 24        | 100.00        |
| 67 | 公路總局及所屬    | 推廣數位公益服務      | 82    | 5           | 5         | 100.00        |                                |             | —           | 5         | 100.00        |
| 68 | 文化部        | 基礎建設環境        | 15    | 1           | 1         | 100.00        |                                |             | —           | 1         | 100.00        |
| 69 | 內政部        | 基礎建設環境        | 18    | 0.7         | 0.7       | 100.00        |                                |             | —           | 0.7       | 100.00        |

| 排序     | 辦理機關    | 工作計畫名稱   | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因         | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|--------|---------|----------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|        |         |          |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                        |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 70     | 警政署及所屬  | 推廣數位公益服務 | 555    | —           | —         | —             |                                        |                 | —           | —         | —             |
| 71     | 財政資訊中心  | 基礎建設環境   | 186    | —           | —         | —             |                                        |                 | —           | —         | —             |
| 72     | 公共工程委員會 | 基礎建設環境   | 42     | —           | —         | —             |                                        |                 | —           | —         | —             |
| 73     | 原住民族委員會 | 推廣數位公益服務 | 15     | —           | —         | —             |                                        |                 | —           | —         | —             |
| 74     | 國家發展委員會 | 基礎建設環境   | 3      | —           | —         | —             |                                        |                 | —           | —         | —             |
| 五、城鄉建設 |         |          | 47,313 | 7,704       | 4,921     | 63.87         |                                        |                 | 1,556       | 6,477     | 84.07         |
| 1      | 消防署及所屬  | 公共服務據點整備 | 451    | 103         | —         | —             | 主要係補助地方政府辦理消防廳舍拆除重建工程尚未完成發包作業所致。       | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 90          | 90        | 87.50         |
| 2      | 體育署     | 校園社區化改造  | 255    | 66          | —         | —             | 主要係部分受補助計畫預付款尚待核銷轉正所致。                 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 65          | 65        | 99.79         |
| 3      | 農業委員會   | 加速推動地方創生 | 80     | 16          | —         | —             | 主要係補助國姓鄉農會辦理穀倉活化再利用計畫未完成核定作業，尚未撥付款項所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | —         | —             |

| 排序 | 辦理機關     | 工作計畫名稱       | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|----------|--------------|-----|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |          |              |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                               |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 4  | 林務局      | 加速推動地方<br>創生 | 80  | 7           | —         | —             | 主要係補助屏東縣牡丹鄉公所計畫因請款文件未完成審核，尚未撥付款項所致。           | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | —         | —             |
| 5  | 觀光局及所屬   | 加速推動地方<br>創生 | 96  | 3           | —         | —             | 主要係補助地方政府辦理地方創生計畫案件，因活動尚在辦理中，未及核銷請款，經費執行落後所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | —         | —             |
| 6  | 農糧署及所屬   | 加速推動地方<br>創生 | 99  | 7           | 0.01      | 0.20          | 主要係補助關山鎮地方創生計畫，因發包作業多次流標，執行進度未如預期所致。          | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 0.01      | 0.20          |
| 7  | 客家委員會及所屬 | 客庄369幸福      | 838 | 481         | 3         | 0.63          | 主要係撥付桃園市政府辦理世界客家博覽會，執行進度尚未達經費核銷條件所致。          | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 437         | 440       | 91.33         |
| 8  | 衛生福利部    | 公共服務據點<br>整備 | 658 | 85          | 2         | 2.60          | 主要係辦理整建長照衛福據點計畫，部分補助案件招標作業或工程進度落後，未達撥款條件所致。   | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 2         | 2.60          |

| 排序 | 辦理機關           | 工作計畫名稱       | 預算數 | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                   | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|----------------|--------------|-----|-------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |                |              |     |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                  |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 9  | 國民及學前<br>教育署   | 校園社區化改<br>造  | 430 | 96          | 2         | 2.60          | 主要係部分補助計畫<br>尚未核定所致。                             | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 2         | 2.60          |
| 10 | 水土保持局          | 加速推動地方<br>創生 | 99  | 35          | 1         | 4.78          | 主要係補助地方政府<br>計畫，部分尚未發包<br>或未達撥款條件，尚<br>未請款所致。    | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 2           | 4         | 11.83         |
| 11 | 教育部            | 公共服務據點<br>整備 | 250 | 26          | 1         | 5.70          | 主要係部分補助計畫<br>尚未核定所致。                             | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 1         | 5.70          |
| 12 | 原住民族委<br>員會    | 加速推動地方<br>創生 | 84  | 14          | 1         | 6.85          | 主要係補助地方政府<br>案件，尚未達撥款條<br>件所致。                   | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 1         | 6.85          |
| 13 | 國民健康署          | 公共服務據點<br>整備 | 287 | 30          | 2         | 8.00          | 主要係辦理銀髮健身<br>俱樂部補助計畫，尚<br>待地方政府納編預算<br>與採購器材等所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 9           | 11        | 39.26         |
| 14 | 客家委員會<br>及所屬   | 加速推動地方<br>創生 | 28  | 14          | 1         | 8.02          | 主要係補助地方政府<br>案件執行進度尚未達<br>經費核銷條件所致。              | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 11          | 12        | 91.89         |
| 15 | 國立臺灣美<br>術館及所屬 | 加速推動地方<br>創生 | 39  | 6           | 0.5       | 8.63          | 主要係新竹及彰化生<br>活美學館辦理臺灣飲<br>食文化結合地方創生              | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 0.1         | 0.7       | 11.16         |

| 排序 | 辦理機關 | 工作計畫名稱       | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                                                                 | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|------|--------------|-------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |      |              |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                                                                |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
|    |      |              |       |             |           |               | 策展及輔導案，配合<br>主管機關決議修正執<br>行內容，執行進度未<br>如預期所致。                                                                  |                         |             |           |               |
| 16 | 經濟部  | 公共服務據點<br>整備 | 368   | 38          | 4         | 11.67         | 主要係補助地方政府<br>辦理公有零售市場補<br>強或拆除重建工程計<br>畫，部分工程因尚在<br>辦理用地變更、規劃<br>設計及攤商協調等程<br>序，未及完成工程發<br>包作業，執行進度未<br>如預期所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 4         | 11.67         |
| 17 | 交通部  | 推動觀光升級       | 711   | 161         | 30        | 19.04         | 主要係海洋觀光計<br>畫，預付補助款項未<br>達核銷轉正標準所<br>致。                                                                        | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 88          | 119       | 74.21         |
| 18 | 體育署  | 充實全民運動<br>環境 | 1,799 | 435         | 84        | 19.40         | 主要係部分受補助地<br>方政府工程履約期程<br>跨年度、採購多次流<br>（廢）標或作業延遲<br>等所致。                                                       | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 0.06        | 84        | 19.41         |

| 排序 | 辦理機關    | 工作計畫名稱          | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                  | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |         |                 |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                 |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 19 | 營建署及所屬  | 加速推動地方創生        | 90    | 6           | 1         | 31.87         | 主要係地方創生城鄉風貌營造計畫審查及核定之前置作業期程較長，執行進度未如預期所致。       | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 1         | 31.87         |
| 20 | 原住民族委員會 | 推動原住民族多元產業發展2.0 | 597   | 107         | 40        | 37.59         | 主要係補助地方政府辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫，尚未達撥款或核銷條件所致。      | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 23          | 63        | 59.01         |
| 21 | 公路總局及所屬 | 加速推動地方創生        | 60    | 6           | 2         | 38.22         | 主要係因請款文件尚未完成審核所致。                               | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 2           | 4         | 73.36         |
| 22 | 文化部     | 加速推動地方創生        | 165   | 40          | 17        | 42.59         | 主要係2023年臺灣美食展攤位承租採購案尚未完成撥款作業，及部分補助案請款資料尚待補正等所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 10          | 27        | 68.01         |
| 23 | 警政署及所屬  | 公共服務據點整備        | 1,308 | 111         | 51        | 46.11         | 主要係補助地方警察廳舍拆除重建及耐震補強工程案，因工程                     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 51        | 46.11         |

| 排序 | 辦理機關        | 工作計畫名稱        | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|-------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|    |             |               |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                               |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
|    |             |               |       |             |           |               | 流標、行政審查作業<br>延宕等因素，影響補<br>助款撥付期程所致。           |                         |             |           |               |
| 24 | 中小企業處       | 開發在地型產<br>業園區 | 510   | 140         | 66        | 47.37         | 主要係城鄉新創產業<br>補助計畫預付款未達<br>核銷轉正條件所致。           | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 65          | 132       | 94.43         |
| 25 | 公路總局及<br>所屬 | 改善停車問題        | 7,300 | 401         | 199       | 49.59         | 主要係補助部分地方<br>政府工程款尚未轉正<br>所致。                 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 202         | 401       | 100.00        |
| 26 | 公路總局及<br>所屬 | 提升道路品質        | 4,762 | 926         | 588       | 63.47         | 主要係補助部分地方<br>政府工程款尚未轉正<br>所致。                 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 311         | 899       | 97.05         |
| 27 | 青年發展署       | 加速推動地方<br>創生  | 79    | 22          | 14        | 66.10         | 主要係各項補助案尚<br>在執行中，預付款尚<br>未轉正所致。              | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 7           | 22        | 98.61         |
| 28 | 工業局         | 開發在地型產<br>業園區 | 2,752 | 564         | 377       | 66.85         | 主要係辦理開發在地<br>型產業園區計畫，工<br>程預付款未達核銷轉<br>正條件所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 136         | 513       | 90.98         |
| 29 | 營建署及所<br>屬  | 城鎮之心工程        | 2,118 | 57          | 42        | 72.89         | 主要係競爭型及政策<br>型計畫審查及核定之                        | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 42        | 72.89         |

| 排序 | 辦理機關        | 工作計畫名稱   | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因      | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|-------------|----------|-------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|    |             |          |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                     |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
|    |             |          |       |             |           |               | 前置作業期程較長，執行進度未如預期所致。                |                 |             |           |               |
| 30 | 文化部         | 文化生活圈建設  | 2,022 | 428         | 313       | 73.11         | 主要係補助辦理博物館及地方文化館升級等計畫，預付款尚待依進度轉正所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 39          | 353       | 82.41         |
| 31 | 國立臺灣史前文化博物館 | 文化生活圈建設  | 49    | 6           | 4         | 73.44         | 主要係科學考古廳統包工程採購案，第一階段工作項目尚未完成驗收付款所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 4         | 73.44         |
| 32 | 國家發展委員會     | 加速推動地方創生 | 721   | 72          | 54        | 75.43         | 主要係補助地方政府案件因執行時程調整未及時修正計畫，請款作業延後所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 13          | 68        | 94.36         |
| 33 | 原住民族委員會     | 原民部落營造   | 942   | 239         | 187       | 78.20         | 主要係補助地方政府部落之心示範點建置計畫，尚未達撥款條件所致。     | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 187       | 78.20         |
| 34 | 國立臺灣文學館     | 文化生活圈建設  | 15    | 8           | 6         | 80.49         |                                     |                 | —           | 6         | 80.49         |

| 排序 | 辦理機關                | 工作計畫名稱        | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因 | 審計部處<br>理情形 | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|---------------------|---------------|--------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|    |                     |               |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                |             |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 35 | 加工出口區<br>管理處及所<br>屬 | 開發在地型產<br>業園區 | 534    | 117         | 95        | 81.45         |                                |             | 13          | 108       | 92.57         |
| 36 | 文化資產局               | 文化生活圈建<br>設   | 1,497  | 264         | 219       | 82.86         |                                |             | 23          | 242       | 91.73         |
| 37 | 文化資產局               | 加速推動地方<br>創生  | 71     | 19          | 16        | 88.43         |                                |             | 1           | 18        | 94.53         |
| 38 | 觀光局及所<br>屬          | 推動觀光升級        | 1,786  | 155         | 139       | 89.95         |                                |             | —           | 139       | 89.95         |
| 39 | 內政部                 | 公共服務據點<br>整備  | 1,084  | 155         | 140       | 90.54         |                                |             | —           | 140       | 90.54         |
| 40 | 鐵道局及所<br>屬          | 推動觀光升級        | 516    | 19          | 17        | 94.27         |                                |             | —           | 17        | 94.27         |
| 41 | 營建署及所<br>屬          | 提升道路品質        | 10,912 | 2,174       | 2,156     | 99.18         |                                |             | —           | 2,156     | 99.18         |
| 42 | 中小企業處               | 加速推動地方<br>創生  | 73     | 10          | 10        | 99.98         |                                |             | —           | 10        | 99.98         |
| 43 | 社會及家庭<br>署          | 公共服務據點<br>整備  | 267    | 19          | 19        | 100.00        |                                |             | —           | 19        | 100.00        |
| 44 | 體育署                 | 公共服務據點<br>整備  | 168    | —           | —         | —             |                                |             | —           | —         | —             |

| 排序                  | 辦理機關        | 工作計畫名稱                | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因                                        | 審計部處<br>理情形             | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|
|                     |             |                       |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                                                       |                         |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 45                  | 賦稅署         | 公共服務據點<br>整備          | 107   | —           | —         | —             |                                                                       |                         | —           | —         | —             |
| 46                  | 衛生福利部       | 加速推動地方<br>創生          | 60    | —           | —         | —             |                                                                       |                         | —           | —         | —             |
| 47                  | 社會及家庭<br>署  | 加速推動地方<br>創生          | 39    | —           | —         | —             |                                                                       |                         | —           | —         | —             |
| 48                  | 環境保護署       | 公共服務據點<br>整備          | 26    | —           | —         | —             |                                                                       |                         | —           | —         | —             |
| 49                  | 勞動部         | 公共服務據點<br>整備          | 14    | —           | —         | —             |                                                                       |                         | —           | —         | —             |
| 六、因應少子化友善育兒空間建<br>設 |             |                       | 1,389 | 305         | 115       | 37.89         |                                                                       |                         | —           | 115       | 37.89         |
| 1                   | 社會及家庭<br>署  | 因應少子化友<br>善育兒空間建<br>設 | 1,389 | 305         | 115       | 37.89         | 主要係辦理建構0—2<br>歲兒童社區公共托育<br>計畫，部分案件尚未<br>完成招標作業，或執<br>行進度未達撥款條件<br>所致。 | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | —           | 115       | 37.89         |
| 七、食品安全建設            |             |                       | 1,441 | 150         | 38        | 25.41         |                                                                       |                         | 100         | 138       | 92.08         |
| 1                   | 食品藥物管<br>理署 | 食品安全建設                | 1,441 | 150         | 38        | 25.41         | 主要係委託營建署代<br>辦現代化食品藥物國<br>家級實驗大樓暨行政<br>及教育訓練大樓興建                      | 審計部將賡<br>續追蹤後續<br>辦理情形。 | 100         | 138       | 92.08         |

| 排序           | 辦理機關     | 工作計畫名稱     | 預算數    | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因         | 審計部處<br>理情形     | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|--------------|----------|------------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
|              |          |            |        |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                        |                 |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
|              |          |            |        |             |           |               | 計畫，尚未完成經費核銷作業所致。                       |                 |             |           |               |
| 八、人才培育促進就業建設 |          |            | 10,202 | 2,067       | 1,105     | 53.48         |                                        |                 | 18          | 1,124     | 54.36         |
| 1            | 國家發展委員會  | 人才培育促進就業建設 | 908    | 37          | 1         | 3.80          | 主要係雙語政策行政法人設置條例尚未經立法院審議通過，相關經費無法支用等所致。 | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | 16          | 18        | 49.18         |
| 2            | 國民及學前教育署 | 人才培育促進就業建設 | 4,810  | 1,321       | 439       | 33.28         | 主要係部分補助計畫尚未核定所致。                       | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 439       | 33.28         |
| 3            | 教育部      | 人才培育促進就業建設 | 2,262  | 141         | 98        | 69.78         | 主要係部分計畫尚未核定所致。                         | 審計部將賡續追蹤後續辦理情形。 | —           | 98        | 69.78         |
| 4            | 國立教育廣播電臺 | 人才培育促進就業建設 | 9      | 1           | 1         | 95.94         |                                        |                 | —           | 1         | 95.94         |
| 5            | 數位產業署    | 人才培育促進就業建設 | 130    | 38          | 36        | 96.41         |                                        |                 | 1           | 38        | 99.82         |
| 6            | 經濟部      | 人才培育促進就業建設 | 5      | 0.8         | 0.8       | 98.97         |                                        |                 | —           | 0.8       | 98.97         |
| 7            | 工業局      | 人才培育促進就業建設 | 285    | 78          | 78        | 99.80         |                                        |                 | —           | 78        | 99.80         |

| 排序 | 辦理機關                | 工作計畫名稱          | 預算數   | 累計分配<br>預算數 | 累計實現數（註2） |               | 累計實現數占累計分<br>配預算數未達80%<br>落後原因 | 審計部處<br>理情形 | 預付數<br>（註3） | 累計實現數+預付數 |               |
|----|---------------------|-----------------|-------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|    |                     |                 |       |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |                                |             |             | 金額        | 占累計分配<br>預算數% |
| 8  | 加工出口區<br>管理處及所<br>屬 | 數位與特殊技<br>術人才發展 | 23    | 3           | 3         | 99.97         |                                |             | —           | 3         | 99.97         |
| 9  | 國家科學及<br>技術委員會      | 人才培育促進<br>就業建設  | 1,665 | 429         | 429       | 100.00        |                                |             | —           | 429       | 100.00        |
| 10 | 中小企業處               | 人才培育促進<br>就業建設  | 99    | 14          | 14        | 100.00        |                                |             | —           | 14        | 100.00        |

註：1. 本表係依據各機關 112 年 6 月份中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算會計報告（收支執行狀況月報表）編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。


4. 本表係按各建設計畫累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附圖 1

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出已實現比率未達 80% 之主管機關

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

已實現比率%

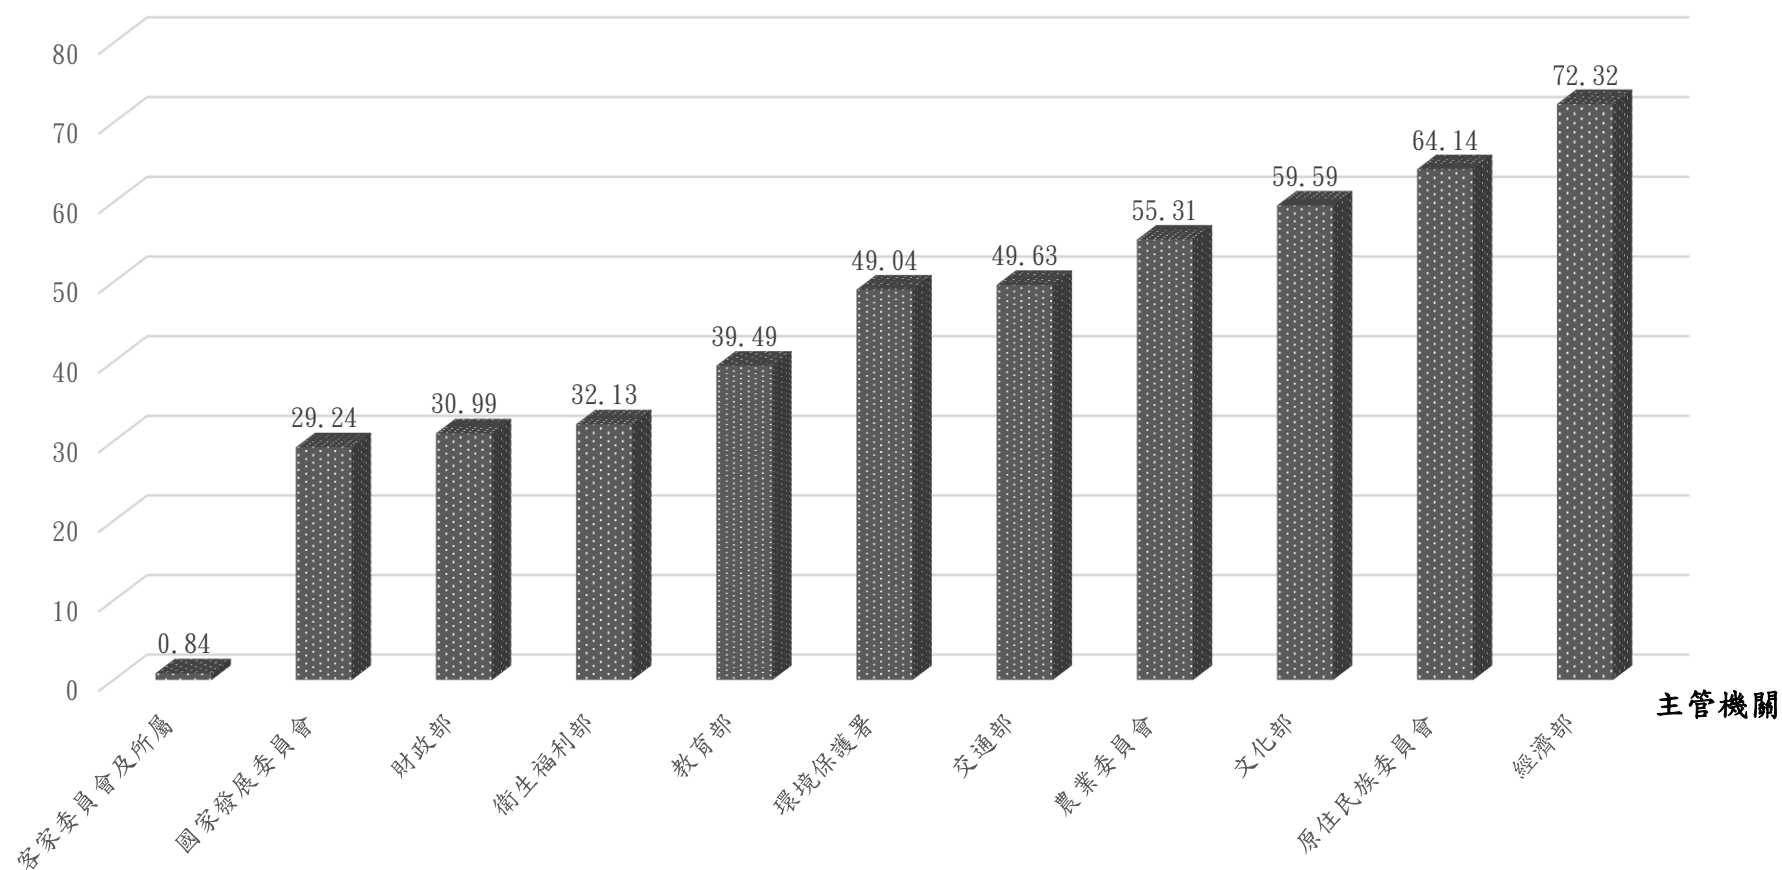

附圖 2

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算歲出各項工作計畫預算實現率最低之前 20 項計畫

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

已實現比率%

