

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫預算執行情形

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫計 199 項¹，分屬 14 個主管機關²，可支用預算數 3,535 億餘元，截至第 3 季止，累計分配預算數 1,983 億餘元，累計執行數 1,936 億餘元，執行率 97.66%，其中教育部及國立故宮博物院等 2 個主管機關執行率未達 80%；各項計畫年度執行率未達 80%者，有 34 項計畫；總累計執行率未達 80%者，有 24 項計畫。各主管機關執行情形等詳細資料³列示如後。

- 各主管機關預算執行情形統計表（附表1）
- 各主管機關預算執行情形統計圖（附圖1）
- 年度預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖2）
- 整體計畫總累計預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖3）
- 年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表（附表2）

¹原列管 197 項，因教育部「國立宜蘭大學活動中心暨游泳池館新建工程」及「國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程」等 2 項計畫民國 105 年度可支用預算數達 1 億元以上，由該部於民國 105 年 4 月 15 日向行政院工程會申請新增列管。

²係指計畫主管機關，以下同。

³各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就預算執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計表

民國 105 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管計畫項數	可支用預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計支用數 (3)	累計應付未付數 (4)	累計結餘數 (5)	累計執行數 (6=3+4+5)	執行率 (%) (6/2)
合 計		199	353,584	198,322	136,377	52,609	4,687	193,673	97.66
1	教育部	20	9,946	4,952	2,653	819	3	3,477	70.21
2	國立故宮博物院	1	1,424	1,070	609	170	-	779	72.83
3	交通部	66	134,704	74,847	47,461	22,104	305	69,872	93.35
4	國軍退除役官兵輔導委員會	5	1,772	1,086	808	205	17	1,030	94.84
5	海岸巡防署	3	754	655	582	17	31	631	96.25
6	環境保護署	2	1,659	792	676	88	6	771	97.23
7	科技部	5	4,662	2,923	2,735	115	25	2,877	98.43
8	國防部	7	2,226	1,425	1,404	30	-	1,434	100.62
9	內政部	17	28,097	15,781	13,908	2,051	18	15,978	101.24
10	客家委員會	2	721	352	353	-	3	356	101.26
11	文化部	11	10,679	6,289	2,999	3,376	0	6,376	101.37
12	經濟部	37	132,115	73,754	50,510	20,623	3,949	75,083	101.80
13	農業委員會	20	24,123	14,159	11,341	2,992	325	14,659	103.53
14	原住民族委員會	3	696	229	332	13	-	345	150.50

註：1.本表係按執行率由最低至最高之順序排列。


2.可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國 105 年度核列預算數，接續之累計分配數、累計執行數等，均係以該可支用預算數進行分配及執行結果。

3.累計執行數包含累計支用數、已執行之應付未付數及結餘數。

4.民國 105 年第 3 季可支用預算數 3,535 億餘元與第 2 季可支用預算數 3,574 億餘元之差異原因為部分計畫修正，調整可支用預算數所致。

附圖 1

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖

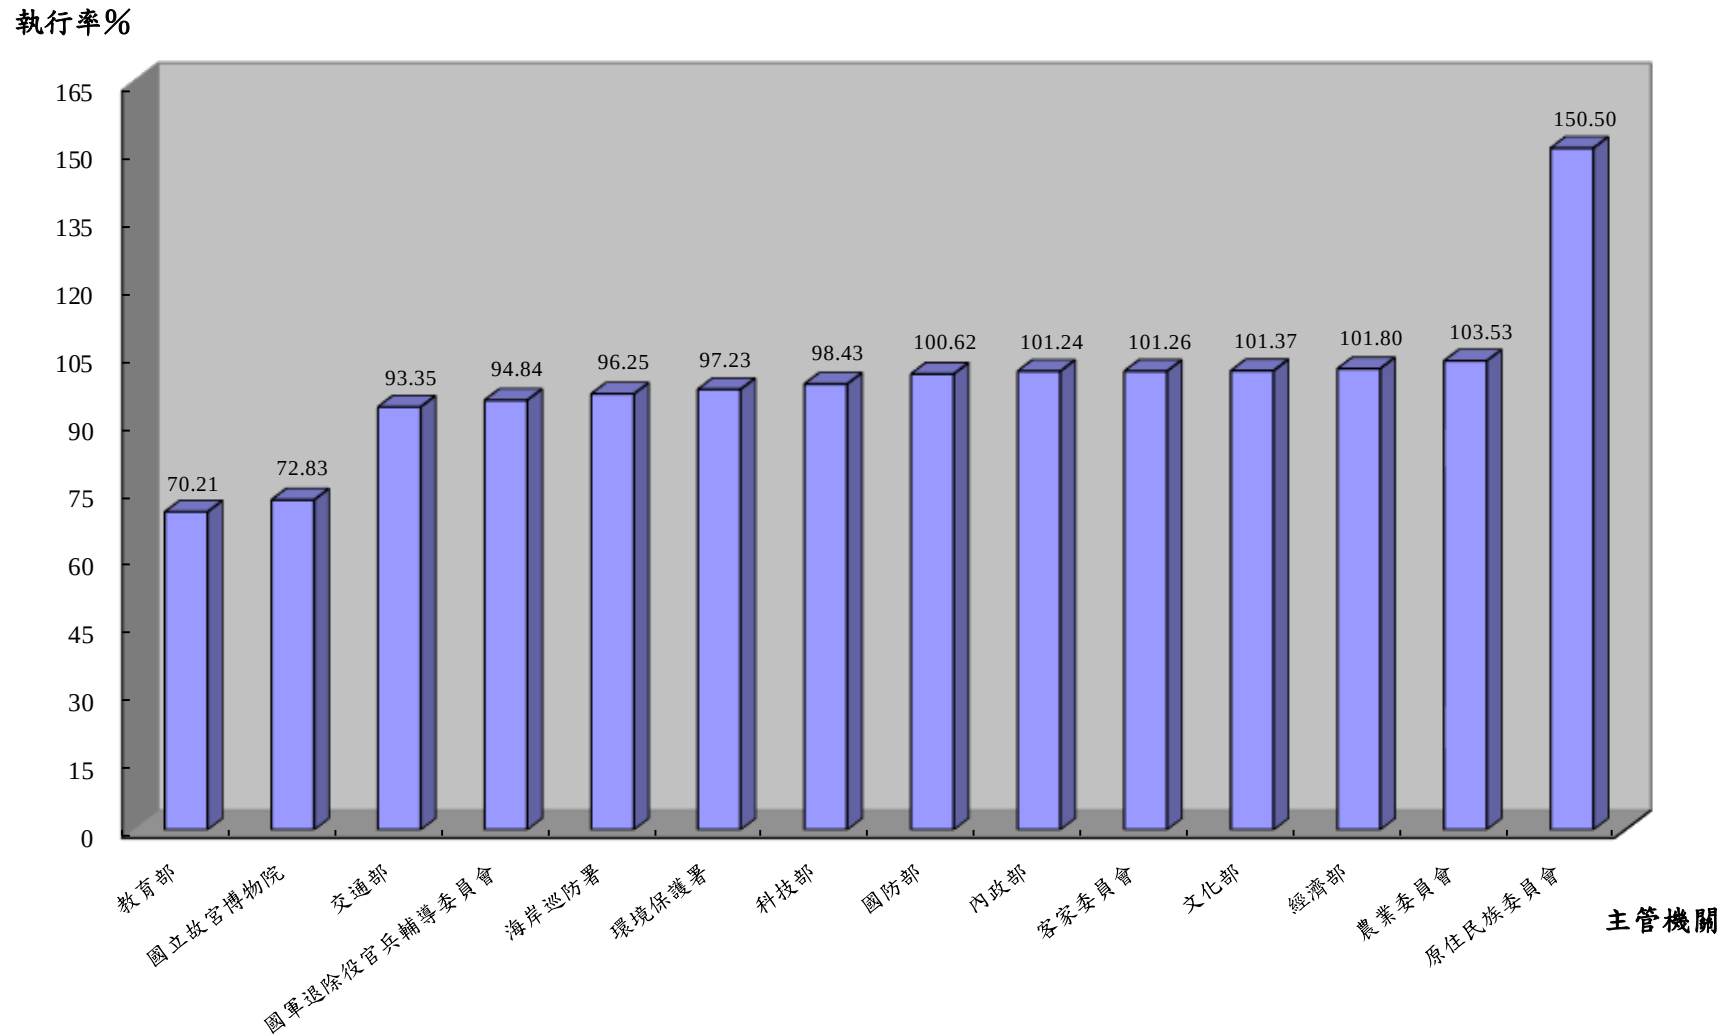


資料截止日期：民國 105 年 9 月 30 日

附圖 2

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫 年度預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

執行率%

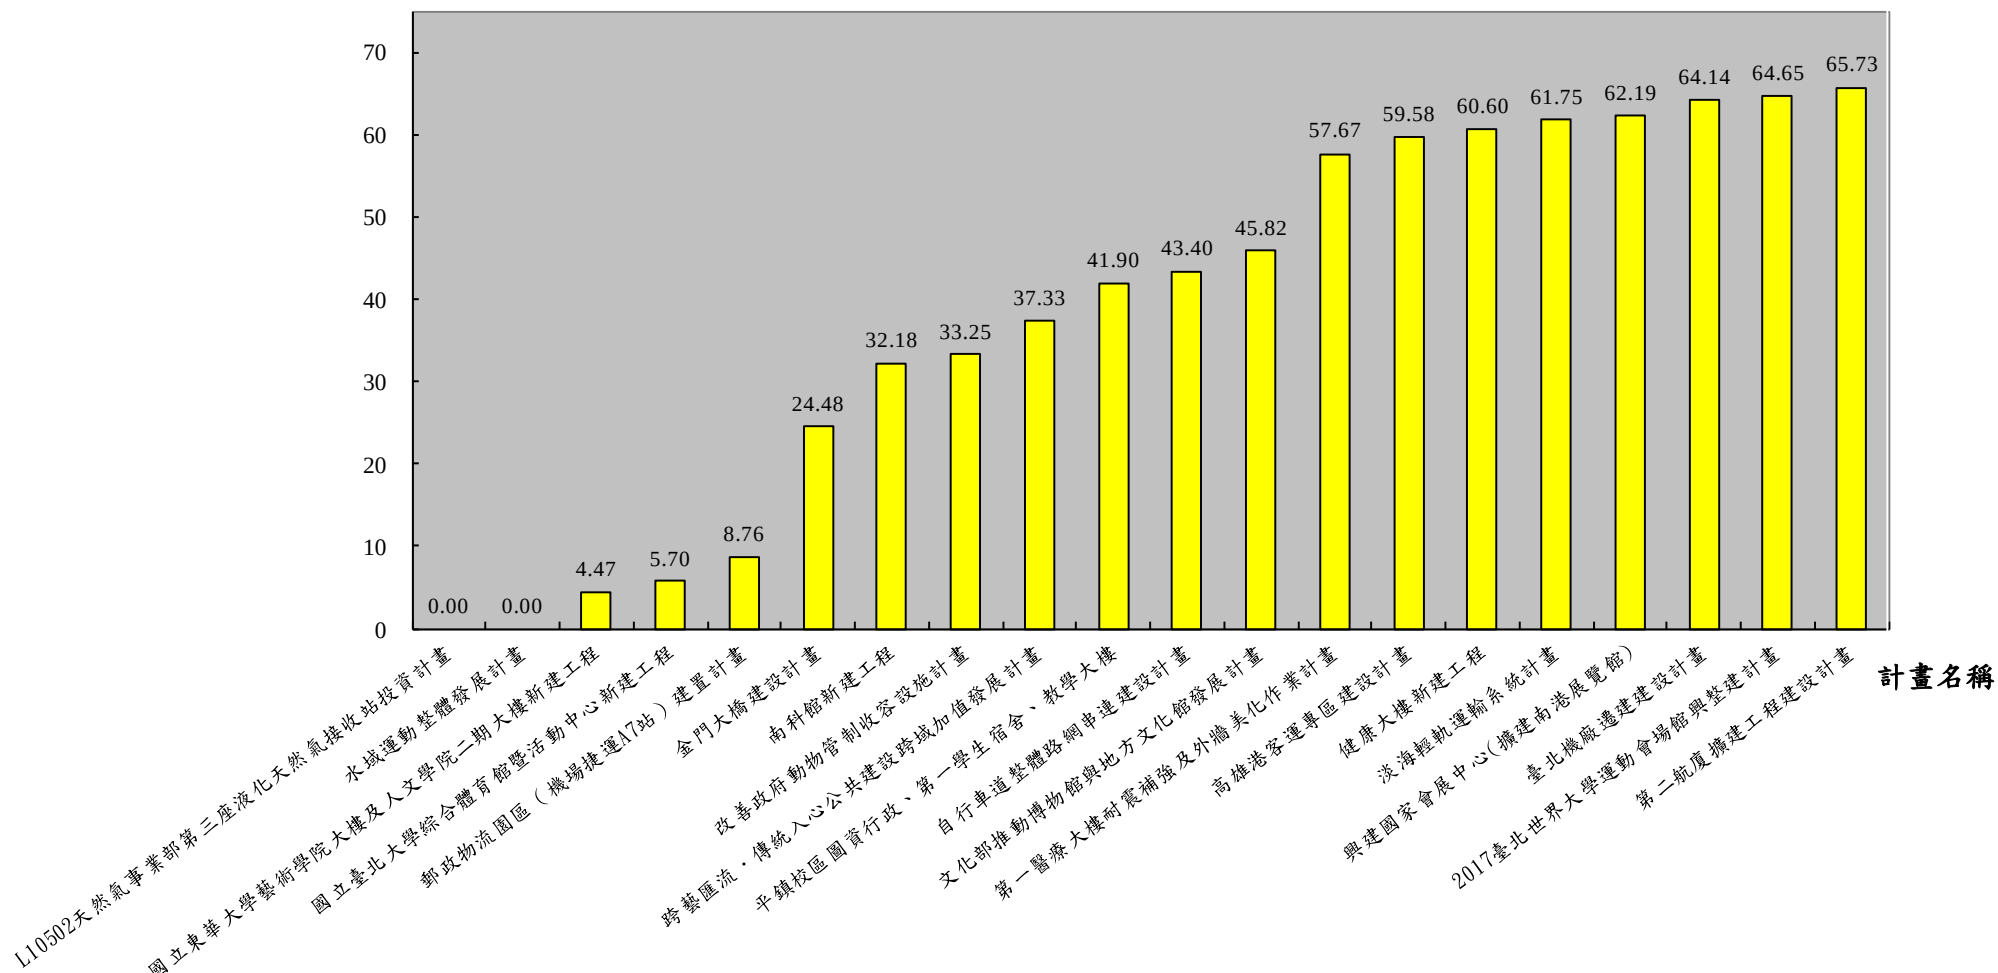


資料截止日期：民國 105 年 9 月 30 日

附圖 3

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫
整體計畫總累計預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

執行率%

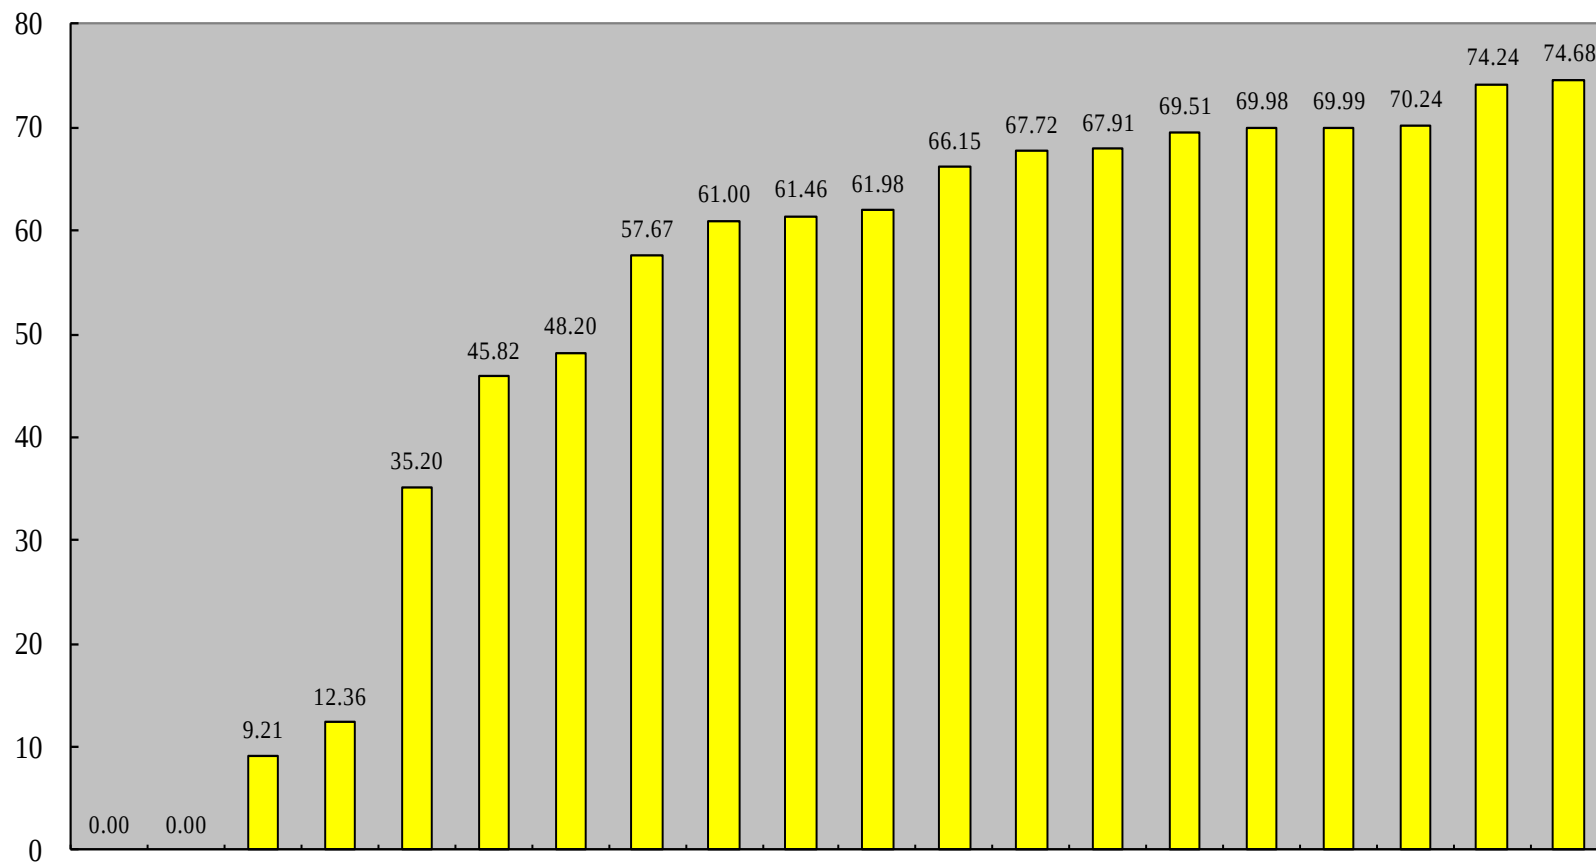

計畫名稱

資料截止日期：民國 105 年 9 月 30 日

附表2

民國105年度行政院工程會列管1億元以上公共建設計畫
年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表

民國105年1月1日至9月30日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額 (1)	可支用 預算數 (2)	累計 分配數 (3)	累計 執行數 (4)	執行率 (%) (4/3)	總累計預 定支用數 (5)	總累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
1	經濟部	中油公司	L10502天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	10507-11412	60,083,562	3,152,210	3,408	0	0.00	3,408	0	0.00	因立法院決議凍結計畫預算，影響計畫前置作業辦理期程及預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	教育部	教育部體育署	水域運動整體發展計畫	10501-10812	1,400,000	350,000	96,000	0	0.00	96,000	0	0.00	因硬體設施無法配合計畫期程完成，經國家發展委員會審議暫緩執行所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
3	教育部	國立東華大學	國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程	09801-10712	792,754	361,404	155,528	6,949	4.47	586,878	438,299	74.68	因承商出工人數不足所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
4	教育部	國立臺北大學	國立臺北大學綜合體育館暨活動中心新建工程	09902-10801	680,000	246,350	180,000	10,255	5.70	193,695	23,950	12.36	因承商遲未請領工程預付款所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
5	交通部	中華郵政股份有限公司	郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	10301-10912	22,118,223	2,507,471	36,091	3,161	8.76	5,351,834	5,007,904	93.57	因本案公共設施、物流中心、北臺灣郵件作業中心委託技術服務案各項使用需求及採購程序延遲所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
6	交通部	金門縣政府（交通部補助單位）	金門大橋建設計畫	09905-10706	7,384,666	2,785,203	1,956,560	478,907	24.48	4,439,889	2,752,063	61.98	因承商違約，代辦機關交通部台灣區國道新建工程局於105年6月29日終止契約所致。	業就該案落後情形函請交通部督促金門縣政府積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
7	文化部	國立臺灣史前文化博物館	南科館新建工程	09702-10512	1,500,000	910,564	656,390	211,209	32.18	1,155,340	710,083	61.46	因鋼構廠製作業進度落後所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
8	農業委員會	農業委員會	改善政府動物管制收容設施計畫	10301-10712	1,231,800	340,238	201,603	67,025	33.25	333,560	203,465	61.00	因工程發包多次流標所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
9	文化部	國立傳統藝術中心	跨藝匯流・傳統入心公共建設跨域增值發展計畫	10401-10912	3,457,800	1,048,066	477,966	178,429	37.33	577,965	278,592	48.20	因部分工程屬歷史建築，受文化資產審議程序影響所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
10	教育部	國立臺北商業大學	平鎮校區圖書行政、第一學生宿舍、教學大樓	09809-10312	1,095,528	8,494	6,000	2,514	41.90	1,090,034	1,084,034	99.45	因公共藝術設置審查作業延誤所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
11	教育部	教育部體育署	自行車道整體路網串連建設計畫	10201-10512	1,350,000	387,711	120,000	52,077	43.40	1,060,640	992,717	93.60	因修正計畫尚未獲行政院核定，105年度預算無法動支所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
12	文化部	文化部	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	10501-11012	2,252,000	299,829	96,581	44,257	45.82	96,581	44,257	45.82	因計畫審查作業延誤所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
13	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會臺中總醫院	第一醫療大樓耐震補強及外牆美化作業計畫	10501-10512	160,000	160,000	47,500	27,392	57.67	47,500	27,392	57.67	因承商預計提送阻尼器為限制進口之大陸產品，須進行更換，致延宕工程進度。	業就該案落後情形函請國軍退除役官兵輔導委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
14	交通部	臺灣港務股份有限公司	高雄港客運高專區建設計畫	09901-10612	4,517,000	494,692	260,000	154,907	59.58	1,503,922	1,175,201	78.14	因辦理基地內油污染土之檢測及外運，致建築主體工程進度落後。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關交通部查明處理，並報告監察院。
15	教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院	健康大樓新建工程	10001-11006	4,731,264	52,701	40,993	24,841	60.60	78,592	62,441	79.45	因地方主管機關臺北市政府要求暫緩拆除工址內之舊有鍋爐房及煙囪等建物，並要求提出保存計畫送審，致計畫執行進度落後。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條第1項規定，通知上級機關教育部查明處理，並報告監察院。
16	交通部	新北市政府(交通部補助單位)	淡海輕軌運輸系統計畫	10202-11412	15,305,599	3,129,031	1,736,378	1,072,238	61.75	3,939,573	3,270,965	83.03	因部分私有土地協議價購作業辦理中，尚未撥付款項所致。	業就該案落後情形函請交通部督促新北市政府積極處理。
17	經濟部	經濟部國際貿易局	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	09707-10708	7,266,400	2,046,550	1,679,849	1,044,750	62.19	4,542,459	3,569,440	81.10	因承商出工人力不足及施工界面複雜，致計畫執行進度與經費支用落後。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關經濟部查明處理，並報告監察院。
18	交通部	交通部臺灣鐵路管理局	臺北機廠遷建設計計畫	09406-10512	15,510,872	1,474,633	354,633	227,454	64.14	14,910,872	13,663,694	91.64	因變更設計程序尚未完成，及受天候影響，致戶外整地工程及軌道工程時程延宕。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
19	教育部	教育部體育署	2017臺北世界大學運動會場館興整建計畫	10210-10612	5,004,560	1,098,352	847,223	547,770	64.65	2,574,663	2,275,210	88.37	因工程發包多次流標所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
20	交通部	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈擴建工程設計計畫	10401-10612	2,047,355	515,372	200,220	131,598	65.73	500,000	475,752	95.15	因配合機場營運及施工人員勞安問題等暫停施工所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
21	交通部	交通部公路總局	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	10301-10912	15,430,000	708,347	569,460	384,310	67.49	932,825	655,215	70.24	因用地都市計畫變更尚未通過，影響後續用地取得發價作業。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
22	內政部	台江國家公園管理處	台江國家公園計畫(105-108)	10501-10812	883,261	175,281	63,913	43,283	67.72	63,913	43,283	67.72	因「台江國家公園管理處遊客中心裝修工程」委託規劃設計及監造技術服務工作案招標廢標及審查會議未通過等所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
23	內政部	墾丁國家公園管理處	墾丁國家公園計畫	10501-10812	933,621	290,693	153,031	103,926	67.91	153,031	103,926	67.91	因船帆石及墾丁牧場公廁用地取得耗時、天候不佳影響工程施作等所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
24	教育部	教育部國民及學前教育署	國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫	10201-10512	8,000,000	2,282,600	1,500,000	1,026,995	68.47	7,217,400	6,744,395	93.45	因補強工程為完工後一次請款及部分市縣因處理風災災損事宜，而影響請款作業。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
25	教育部	教育部體育署	改善國民運動環境計畫	09901-10412	11,660,000	1,883,268	351,915	243,057	69.07	8,958,001	7,818,696	87.28	因工程設計廠商人力不足，遲未能完成發包圖說修正所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
26	教育部	教育部技職司	技專校院設備更新-再造技優計畫	10201-10612	5,000,000	1,300,000	600,000	417,600	69.60	3,300,000	3,112,911	94.33	因計畫審查作業延誤所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
27	內政部	內政部營建署城鄉發展分署	國家重要濕地保育計畫	10001-10512	752,200	194,390	86,200	62,091	72.03	390,281	366,172	93.82	因委辦地方政府經營管理國際級及國家級重要濕地事宜，部分地方政府尚未同意簽約，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
28	國立故宮博物院	國立故宮博物院	故宮南部院區籌建	09201-10512	7,929,069	1,424,178	1,070,158	779,437	72.83	7,550,448	7,259,726	96.15	因主體工程外牆帷幕漏水缺失改善，受颱風及天候影響所致。	業就該案落後情形函請國立故宮博物院研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
29	交通部	交通部鐵路改建工程局	臺南市區鐵路地下化計畫	09809-10605	29,360,000	806,646	211,988	155,858	73.52	1,431,560	946,983	66.15	因北區、東區都市計畫變更作業遭民眾強烈抗爭，影響用地取得作業。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
30	內政部	內政部營建署	國家公園永續發展計畫(105-108)	10501-10812	807,551	169,339	78,269	58,103	74.24	78,269	58,103	74.24	因天候不佳影響工程施作等所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
31	農業委員會	農業委員會漁業署	「彰化漁港」開發案近程(可開港營運)計畫	10401-10612	1,441,800	330,415	231,291	172,797	74.71	256,674	178,414	69.51	因工程基本設計圖說審查時程延誤所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
32	經濟部	台電公司	第七輪變電計畫	9901-11012	236,871,164	13,243,889	7,926,251	6,133,506	77.38	158,061,301	156,268,557	98.87	因輸電線路遭民眾陳情要求遷移等，致預算執行落後。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
33	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會	臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	10001-10611	1,894,814	585,000	360,000	280,455	77.90	1,401,049	1,321,504	94.32	因外牆裝修工程之帷幕與鋁窗材料加工延遲、主體工程第3次變更設計需求大幅更動等因素，影響工進。	業就該案落後情形函請國軍退除役官兵輔導委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
34	交通部	交通部公路總局	東西向快速公路健全路網改善計畫	09801-10512	21,630,200	835,083	490,928	389,480	79.34	19,340,689	19,237,043	99.46	台66線跨越桃81、桃79及台31線等三路口立體化改善工程因承商施工機具、人員不足等問題，影響進度。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
35	農業委員會	農業委員會漁業署	流域綜合治理計畫-水產養殖排水	10306-10812	2,550,000	901,624	406,196	392,119	96.53	637,520	446,179	69.99	因工程設計審查作業延誤所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
36	內政部	內政部	健全地方發展均衡基礎建設計畫	10201-10712	2,000,000	778,816	374,917	373,921	99.73	1,440,679	1,082,625	75.15	因地方政府辦理規劃設計及工程發包等前置作業進度遲緩，影響預算執行進度。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額 (1)	可支用預算數 (2)	累計分配數 (3)	累計執行數 (4)	執行率 (%) (4/3)	總累計預定支用數 (5)	總累計實際執行數 (6)	總累計執行率 (%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
37	交通部	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場跑道整建工程	10301-10702	975,010	962,348	8,401	8,419	100.21	228,890	21,081	9.21	因配合機場營運及降低風險，設計作業配合調整所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
38	交通部	臺灣港務股份有限公司台中港務分公司	臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫	10101-10512	5,927,000	1,520,000	996,400	1,002,933	100.66	5,403,400	4,250,934	78.67	因承商人力不足，及海象與天候等因素影響，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
39	經濟部	台灣自來水股份有限公司	豐原場新設初沉池工程(食水崙溪右岸)	10101-10712	798,574	130,824	27,418	29,643	108.12	429,484	300,569	69.98	因都市計畫變更期程冗長，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
40	經濟部	水利署	金門自大陸引水工程計畫	10308-10512	1,350,000	774,070	224,870	246,360	109.56	719,627	253,328	35.20	因與陸方簽訂購水契約作業延遲，影響後續統包工程設計作業期程，致預算執行落後。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。

註： 1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國105年度核列預算數。

3. 總累計預定支用數係指從計畫開始至當季止之累計分配數。
