

## 民國 107 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫預算執行情形

民國 107 年度行政院工程會列管 5 千萬元<sup>1</sup>以上公共建設計畫計 216 項<sup>2</sup>，分屬 15 個主管機關<sup>3</sup>，可支用預算數 3,708 億餘元，截至第 3 季止，累計分配預算數 2,203 億餘元，累計執行數 2,214 億餘元，執行率 100.50%，其中國立故宮博物院執行率未達 80%；各項計畫年度執行率未達 80%者，有 27 項計畫；總累計執行率未達 80%者，有 15 項計畫。各主管機關執行情形等詳細資料<sup>4</sup>列示如後。

- 各主管機關預算執行情形統計表（附表1）
- 各主管機關預算執行情形統計圖（附圖1）
- 年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表（附表2）
- 年度預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖2）
- 整體計畫總累計預算執行率未達80%計畫明細圖（附圖3）

---

<sup>1</sup>行政院工程會自民國 107 年度起列管重大公共建設計畫門檻由原本的 1 億元下修至 5 千萬元。

<sup>2</sup>民國 107 年第 2 季原列管 212 項，經行政院工程會增加列管經濟部「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」、「台中電廠新建燃氣機組計畫」、「太陽光電第五期計畫」及「協和電廠更新改建計畫」等 4 項計畫。

<sup>3</sup>係指計畫主管機關，以下同。

<sup>4</sup>各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就預算執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

## 民國 107 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計表

民國 107 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：百萬元

| 排序  | 主管機關         | 列管<br>計畫<br>項數 | 可支用<br>預算數<br>(1) | 累計<br>分配數<br>(2) | 累計<br>支用數<br>(3) | 累計<br>應付未付數<br>(4) | 累計<br>結餘數<br>(5) | 累計<br>預付數<br>(6) | 累計<br>執行數<br>(7)=(3)+(4)+(5)+(6) | 執行率<br>(%)<br>(7)/(2)*100 |
|-----|--------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 合 計 |              | 216            | 370,818           | 220,351          | 160,696          | 48,251             | 1,573            | 10,940           | 221,461                          | 100.50                    |
| 1   | 國立故宮博物院      | 1              | 420               | 21               | 11               | -                  | -                | -                | 11                               | 53.86                     |
| 2   | 衛生福利部        | 1              | 173               | 10               | 9                | -                  | -                | -                | 9                                | 85.90                     |
| 3   | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 5              | 961               | 668              | 470              | 128                | -                | -                | 599                              | 89.74                     |
| 4   | 交通部          | 78             | 154,919           | 86,272           | 63,225           | 12,113             | 64               | 9,298            | 84,702                           | 98.18                     |
| 5   | 經濟部          | 49             | 124,387           | 78,484           | 49,744           | 26,438             | 1,028            | 48               | 77,259                           | 98.44                     |
| 6   | 原住民族委員會      | 2              | 717               | 432              | 389              | 38                 | -                | -                | 427                              | 98.90                     |
| 7   | 內政部          | 16             | 26,195            | 17,172           | 14,854           | 2,167              | 40               | -                | 17,061                           | 99.36                     |
| 8   | 客家委員會        | 2              | 559               | 398              | 396              | -                  | -                | -                | 396                              | 99.69                     |
| 9   | 文化部          | 15             | 9,866             | 5,843            | 4,377            | 1,285              | 0                | 252              | 5,915                            | 101.23                    |
| 10  | 環境保護署        | 5              | 2,714             | 1,555            | 1,203            | 417                | 2                | -                | 1,623                            | 104.38                    |
| 11  | 國防部          | 1              | 2,140             | 912              | 883              | 68                 | 4                | -                | 957                              | 104.87                    |
| 12  | 科技部          | 6              | 5,786             | 3,714            | 3,294            | 229                | 370              | 17               | 3,912                            | 105.34                    |
| 13  | 農業委員會        | 17             | 27,040            | 17,173           | 13,800           | 4,853              | 38               | -                | 18,692                           | 108.84                    |
| 14  | 教育部          | 17             | 14,476            | 7,438            | 7,890            | 289                | 22               | 1,306            | 9,509                            | 127.85                    |
| 15  | 海洋委員會        | 1              | 458               | 253              | 144              | 220                | -                | 17               | 382                              | 151.05                    |

註：1. 海洋委員會於民國 107 年 4 月 28 日成立，行政院海岸巡防署更名為海巡署並改隸於該會。

2. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

3. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國 107 年度核列預算數，接續之累計分配數、累計執行數等，均係以該可支用預算數進行分配及執行結果。


4. 累計執行數包含累計支用數、已執行之應付未付數、結餘數及預付數。

5. 民國 107 年第 3 季可支用預算數 3,708 億餘元與第 2 季可支用預算數 3,687 億餘元之差異原因為部分計畫修正調整可支用預算數及新增列管計畫所致。

附圖 1

民國 107 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖

民國 107 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

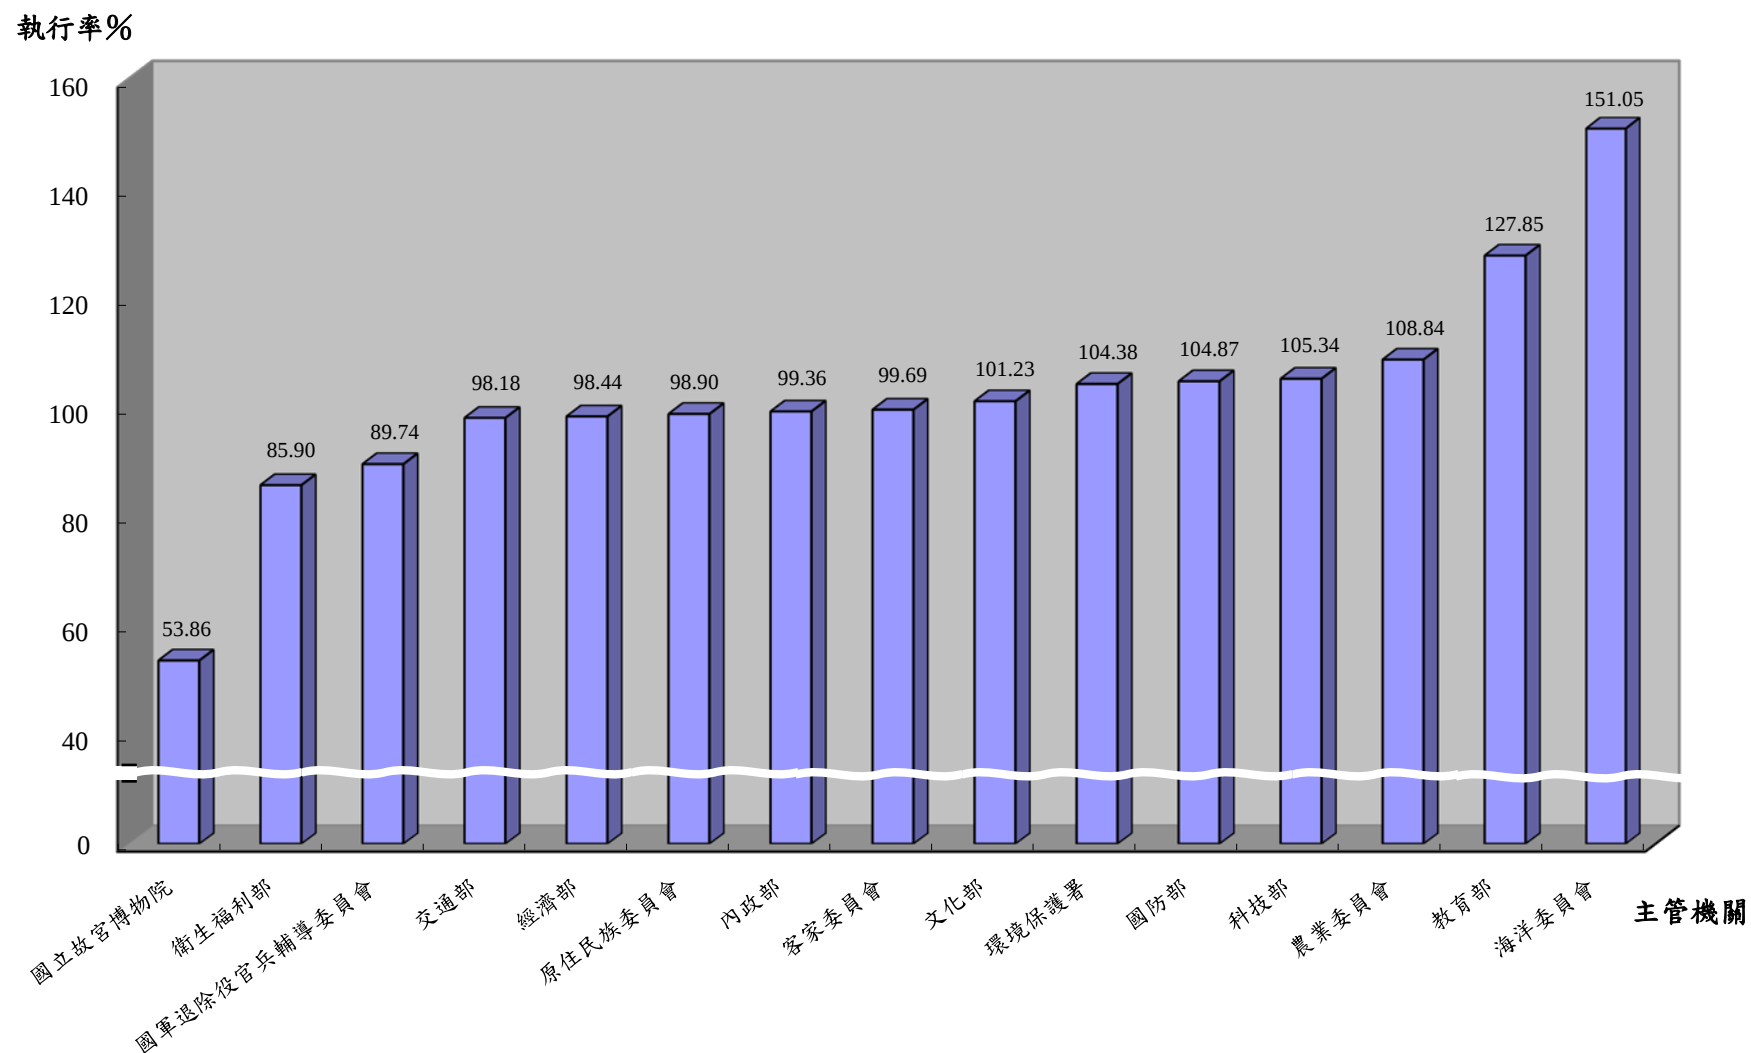

附表2

**監督民國107年度行政院工程會列管5千萬元以上公共建設計畫  
年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表**

民國107年1月1日至9月30日

單位：千元

| 排序 | 主管機關 | 主辦機關           | 計畫名稱                   | 計畫期程        | 計畫經費總額<br>(1) | 可支用預算數<br>(2) | 累計分配數<br>(3) | 累計執行數<br>(4) | 執行率<br>(%)<br>(4)/(3)*100 | 總累計預定支用數<br>(5) | 總累計實際執行數<br>(6) | 總累計執行率<br>(%)<br>(6)/(5)*100 | 落後原因                                             | 審計部處理情形                                                 |
|----|------|----------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 交通部  | 臺東縣政府(交通部補助單位) | 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫      | 10501-10912 | 717,030       | 387,437       | 96,864       | 0            | 0.00                      | 396,812         | 39,375          | 9.92                         | 工程原訂於106年12月完成招標作業，因106年12月22日至107年3月31日間流標4次所致。 | 業就該案落後情形函請交通部督促臺東縣政府積極處理。                               |
| 2  | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司     | 協和電廠更新改建計畫             | 10706-12112 | 121,800,555   | 22,042        | 2,266        | 11           | 0.49                      | 2,266           | 11              | 0.49                         | 因接收站港型規模縮減，工程顧問公司聘定時程延後所致。                       | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 3  | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司     | 太陽光電第四期計畫              | 10701-10906 | 738,370       | 217,580       | 70,356       | 5,112        | 7.27                      | 70,356          | 5,112           | 7.27                         | 因蘭潭、仁義潭及鳳山水庫之籌設許可尚未取得所致。                         | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 4  | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司     | 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫     | 10601-11412 | 14,037,233    | 1,864,386     | 1,312,453    | 103,159      | 7.86                      | 1,369,359       | 160,065         | 11.69                        | 因統包工程招標流、廢標所致。                                   | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 5  | 經濟部  | 經濟部國際貿易局       | 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)     | 10601-11106 | 10,370,271    | 996,411       | 97,214       | 12,764       | 13.13                     | 108,803         | 16,353          | 15.03                        | 因桃園、臺中2案辦理可行性評估審查作業延誤；臺南案細部設計尚未審查通過等所致。          | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 6  | 經濟部  | 經濟部國際貿易局       | 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)      | 09707-10708 | 7,266,400     | 2,029,426     | 2,029,426    | 709,077      | 34.94                     | 7,266,400       | 5,946,051       | 81.83                        | 因建築工程承商長期出工人數不足，及消防檢查與使用執照取得時程延誤所致。              | 業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關經濟部查明處理，並報告監察院。 |
| 7  | 交通部  | 臺灣港務股份有限公司     | 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫 | 10101-10712 | 7,101,043     | 1,536,902     | 679,662      | 297,713      | 43.80                     | 4,536,116       | 4,154,167       | 91.58                        | 因用地取得延誤所致。                                       | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |

| 排序 | 主管機關    | 主辦機關         | 計畫名稱                            | 計畫期程        | 計畫經費總額(1)   | 可支用預算數(2)  | 累計分配數(3)  | 累計執行數(4)  | 執行率(%)<br>(4)/(3)*100 | 總累計預定支用數(5) | 總累計實際執行數(6) | 總累計執行率(%)<br>(6)/(5)*100 | 落後原因                                            | 審計部處理情形                                                 |
|----|---------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8  | 內政部     | 內政部          | 健全地方發展均衡基礎建設計畫                  | 10201-10712 | 2,000,000   | 270,615    | 202,947   | 93,817    | 46.23                 | 1,684,887   | 1,542,944   | 91.58                    | 因地方政府辦理工程發包延遲、部分完工案件尚未辦理請款等所致。                  | 業就該案落後情形派員辦理調查，調查結果已繕發審核通知請內政部檢討改進。                     |
| 9  | 經濟部     | 台灣電力股份有限公司   | 深澳電廠更新擴建計畫                      | 09501-11612 | 104,942,667 | 786,808    | 113,782   | 52,612    | 46.24                 | 1,181,317   | 1,120,147   | 94.82                    | 因技術服務採購案暫緩決標所致。                                 | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 10 | 交通部     | 交通部公路總局      | 淡江大橋及其連絡道路建設計畫                  | 10301-10912 | 15,430,000  | 1,836,380  | 1,285,083 | 645,586   | 50.24                 | 4,859,114   | 4,219,617   | 86.84                    | 工程原訂於106年1月完成招標作業，因105年11月7日至106年11月24日間流標7次所致。 | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 11 | 國立故宮博物院 | 國立故宮博物院      | 新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年) | 10701-11212 | 9,130,000   | 420,340    | 21,014    | 11,318    | 53.86                 | 21,014      | 11,318      | 53.86                    | 因規劃作業延誤所致。                                      | 業就該案落後情形派員辦理調查，調查結果已繕發審核通知函請國立故宮博物院檢討改進。                |
| 12 | 文化部     | 國立臺灣美術館      | 國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫               | 10701-10912 | 483,040     | 109,585    | 51,500    | 29,002    | 56.31                 | 51,500      | 29,002      | 56.31                    | 因規劃作業延誤所致。                                      | 業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 13 | 交通部     | 桃園國際機場股份有限公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫               | 10401-11112 | 74,689,000  | 10,049,097 | 3,261,889 | 1,895,123 | 58.10                 | 5,369,067   | 4,002,301   | 74.54                    | 工程原訂於107年8月完成招標作業，因107年7月19日至31日間流標2次所致。        | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 14 | 內政部     | 墾丁國家公園管理處    | 墾丁國家公園計畫                        | 10501-10812 | 948,510     | 391,680    | 231,888   | 152,259   | 65.66                 | 829,454     | 678,305     | 81.78                    | 因豪大雨影響工程進度等所致。                                  | 業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 15 | 文化部     | 國立傳統藝術中心     | 跨藝匯流·傳統入心公共建設跨域加值發展計畫           | 10401-10912 | 2,691,556   | 845,281    | 513,158   | 338,090   | 65.88                 | 1,444,175   | 1,269,106   | 87.88                    | 因中山堂商業區新建工程於107年3月至7月間招標流標3次所致。                 | 業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關文化部查明處理，並報告監察院。 |

| 排序 | 主管機關 | 主辦機關           | 計畫名稱                             | 計畫期程        | 計畫經費總額(1)   | 可支用預算數(2) | 累計分配數(3)  | 累計執行數(4)  | 執行率(%)<br>(4)/(3)*100 | 總累計預定支用數(5) | 總累計實際執行數(6) | 總累計執行率(%)<br>(6)/(5)*100 | 落後原因                                           | 審計部處理情形                                                 |
|----|------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16 | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司     | 台中電廠新建燃氣機組計畫                     | 10704-11607 | 118,061,691 | 104,350   | 3,796     | 2,589     | 68.20                 | 3,796       | 2,589       | 68.20                    | 因部分線路測量服務工作尚未完成所致。                             | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 17 | 文化部  | 國家人權博物館        | 國家人權博物館中程計畫                      | 10501-11012 | 2,201,900   | 187,931   | 118,384   | 80,775    | 68.23                 | 175,751     | 138,142     | 78.60                    | 因規劃作業延誤所致。                                     | 業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 18 | 交通部  | 高雄市政府(交通部補助單位) | 高雄環狀輕軌捷運建設計畫                     | 09201-10912 | 16,537,334  | 3,696,659 | 2,697,334 | 1,845,542 | 68.42                 | 11,085,216  | 9,919,929   | 89.49                    | 因管線遷移及民眾抗爭影響所致。                                | 業就該案落後情形函請交通部督促高雄市政府積極處理。                               |
| 19 | 交通部  | 交通部航港局         | 國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫 | 10601-11012 | 1,027,143   | 181,534   | 106,306   | 73,129    | 68.79                 | 315,165     | 262,110     | 83.17                    | 因建照申請作業延誤所致。                                   | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 20 | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司     | 澎湖低碳島風力發電計畫                      | 10201-10806 | 2,754,960   | 378,364   | 257,698   | 180,257   | 69.95                 | 1,468,965   | 1,391,524   | 94.73                    | 因工程遭民眾抗爭等所致。                                   | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 21 | 交通部  | 金門縣政府(交通部補助單位) | 國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－金門港埠建設計畫 | 10601-11012 | 4,694,161   | 580,423   | 332,153   | 233,666   | 70.35                 | 445,230     | 346,743     | 77.88                    | 工程原訂於106年10月完成招標作業，因106年9月4日至107年8月20日間流標9次所致。 | 業就該案落後情形函請交通部督促金門縣政府積極處理。                               |
| 22 | 教育部  | 國立臺灣海洋大學       | 國立臺灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程            | 10601-10912 | 298,750     | 40,000    | 5,000     | 3,600     | 72.00                 | 8,705       | 7,305       | 83.92                    | 因與承商終止契約及基地位址變更所致。                             | 業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關教育部查明處理，並報告監察院。 |
| 23 | 交通部  | 交通部鐵道局         | 臺南市區鐵路地下化計畫                      | 09809-11306 | 29,360,000  | 3,449,670 | 2,050,257 | 1,531,612 | 74.70                 | 3,686,138   | 3,133,081   | 85.00                    | 因用地取得延誤所致。                                     | 業就該案落後情形派員辦理調查，調查結果已繕發審核通知請交通部檢討改進。                     |

| 排序 | 主管機關         | 主辦機關       | 計畫名稱                | 計畫期程        | 計畫經費總額(1)  | 可支用預算數(2) | 累計分配數(3)  | 累計執行數(4)  | 執行率(%)<br>(4)/(3)*100 | 總累計預定支用數(5) | 總累計實際執行數(6) | 總累計執行率(%)<br>(6)/(5)*100 | 落後原因                           | 審計部處理情形                                                 |
|----|--------------|------------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 24 | 交通部          | 交通部民用航空局   | 高雄機場跑道整建工程          | 10301-10806 | 975,010    | 948,742   | 450,000   | 336,436   | 74.76                 | 975,010     | 362,704     | 37.20                    | 因天候影響工程進度所致。                   | 業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關交通部查明處理，並報告監察院。 |
| 25 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 臺中榮民總醫院    | 臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫 | 10501-10712 | 214,793    | 208,816   | 110,419   | 83,547    | 75.66                 | 116,396     | 89,524      | 76.91                    | 因南投縣政府要求，工程於院區水土保持設施完成後方得開工所致。 | 業就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。                       |
| 26 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 高雄榮民總醫院    | 高雄榮民總醫院屏東分院護理之家新建計畫 | 10501-10712 | 150,476    | 105,235   | 74,852    | 57,742    | 77.14                 | 120,093     | 102,983     | 85.75                    | 因天候影響工程進度所致。                   | 業就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。                       |
| 27 | 交通部          | 臺灣港務股份有限公司 | 高雄港洲際貨櫃中心第2期工程計畫    | 10003-10812 | 34,452,839 | 2,558,723 | 1,480,400 | 1,142,251 | 77.16                 | 18,699,242  | 18,361,093  | 98.19                    | 因廠商未及時辦理估驗計價所致。                | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 28 | 交通部          | 交通部觀光局     | 跨域亮點及特色加值計畫—跨域亮點計畫  | 10401-10712 | 1,800,000  | 843,581   | 400,000   | 408,108   | 102.03                | 1,355,926   | 1,080,453   | 79.68                    | 因補助地方政府案件執行進度落後所致。             | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 29 | 交通部          | 交通部民用航空局   | 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程    | 10501-10812 | 371,848    | 177,715   | 3,007     | 5,418     | 180.18                | 28,029      | 10,921      | 38.96                    | 因陸域及水域地形現況與原規劃有差異等所致。          | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |

註：1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。


2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國107年度核列預算數。

3. 總累計預定支用數係指從計畫開始至當季止之累計分配數。

附圖 2

# 民國 107 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 年度預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

民國 107 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

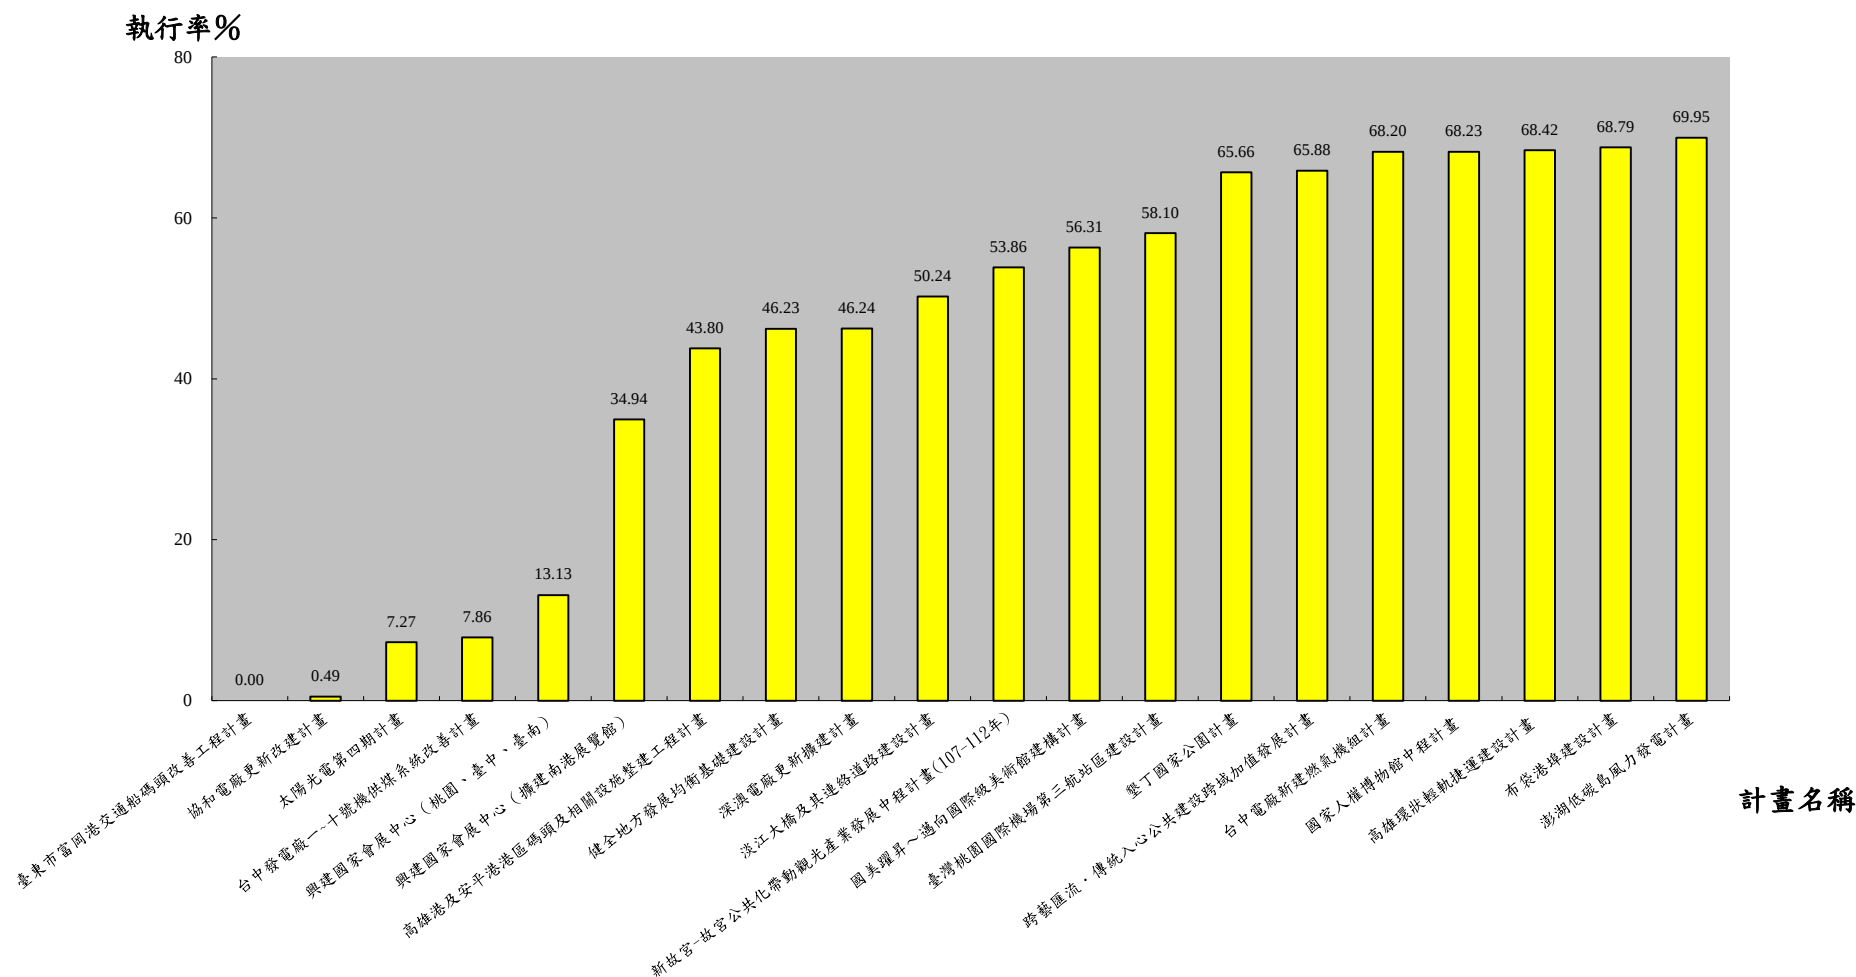

附圖 3

# 民國 107 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 整體計畫總累計預算執行率未達 80% 計畫明細圖

執行率%

民國 107 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

