

審計部監督行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫預算執行情形

民國 102 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫計 221 項，分屬 15 個主管機關¹，可支用預算數 3,595 億餘元，截至 102 年 9 月底，累計分配預算數 2,093 億餘元，累計執行數 1,998 億餘元，執行率 95.47%，其中退輔會、衛生福利部、客委會等 3 個主管機關執行率未達 80%；各項計畫年度執行率未達 80% 者，有 41 項計畫；總累計執行率未達 80% 者，有 31 項計畫。各主管機關執行情形等詳細資料²列示如後。

- [各主管機關預算執行情形統計表](#)
- [各主管機關預算執行情形統計圖](#)
- [102 年度截至 9 月底預算執行率最低之 20 項計畫明細圖](#)
- [整體計畫總累計預算執行率最低之 20 項計畫明細圖](#)

¹係指計畫主管機關，以下同。

²各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就預算執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計表


資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管計畫項數	102 年度可支用預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計支用數 (3)	累計應付未付數 (4)	累計賸餘數 (5)	累計執行數 (6=3+4+5)	執行率 (%) (6/2)
總 計		221	359,539	209,372	162,779	35,348	1,764	199,893	95.47
1	退輔會	3	914	680	222	115	0	337	49.66
2	衛生福利部	2	944	564	328	42	0	371	65.78
3	客委會	2	1,711	800	602	0	0	602	75.30
4	故宮博物院	1	739	332	268	9	0	277	83.61
5	國防部	19	6,793	4,035	2,464	1,132	35	3,633	90.03
6	文化部	9	5,292	3,238	2,032	931	1	2,965	91.58
7	環保署	2	863	528	294	179	18	492	93.12
8	教育部	30	11,355	7,041	5,624	938	7	6,570	93.31
9	交通部	63	133,646	81,869	57,877	18,799	210	76,887	93.91
10	國科會	6	6,914	2,958	2,711	78	0	2,790	94.31
11	經濟部	40	143,224	81,635	67,581	9,959	868	78,408	96.05
12	海巡署	1	241	237	184	51	0	236	99.25
13	內政部	22	25,349	14,551	13,461	1,165	61	14,688	100.94
14	原民會	4	1,029	346	330	14	13	358	103.42
15	農委會	17	20,518	10,552	8,794	1,930	546	11,272	106.83

註 1：「102 年度可支用預算數」包含以前年度未執行奉准保留之預算及 102 年度核列預算數，接續之「累計分配數」、「累計執行數」等，均係以該「102 年度可支用預算數」進行分配及執行結果。

附圖 1

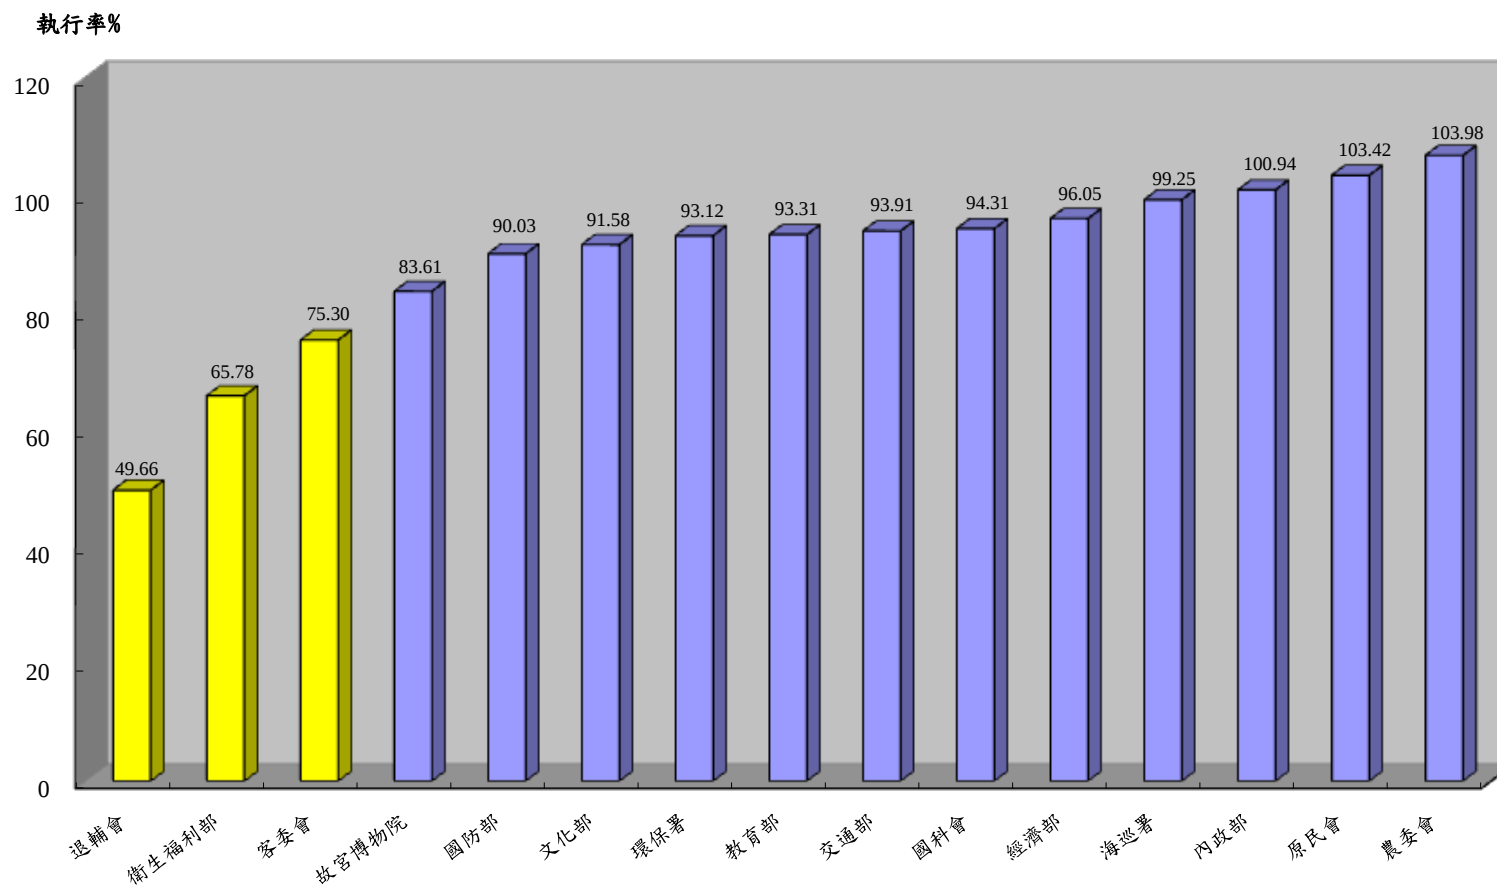


資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖

附圖 2


執行率%

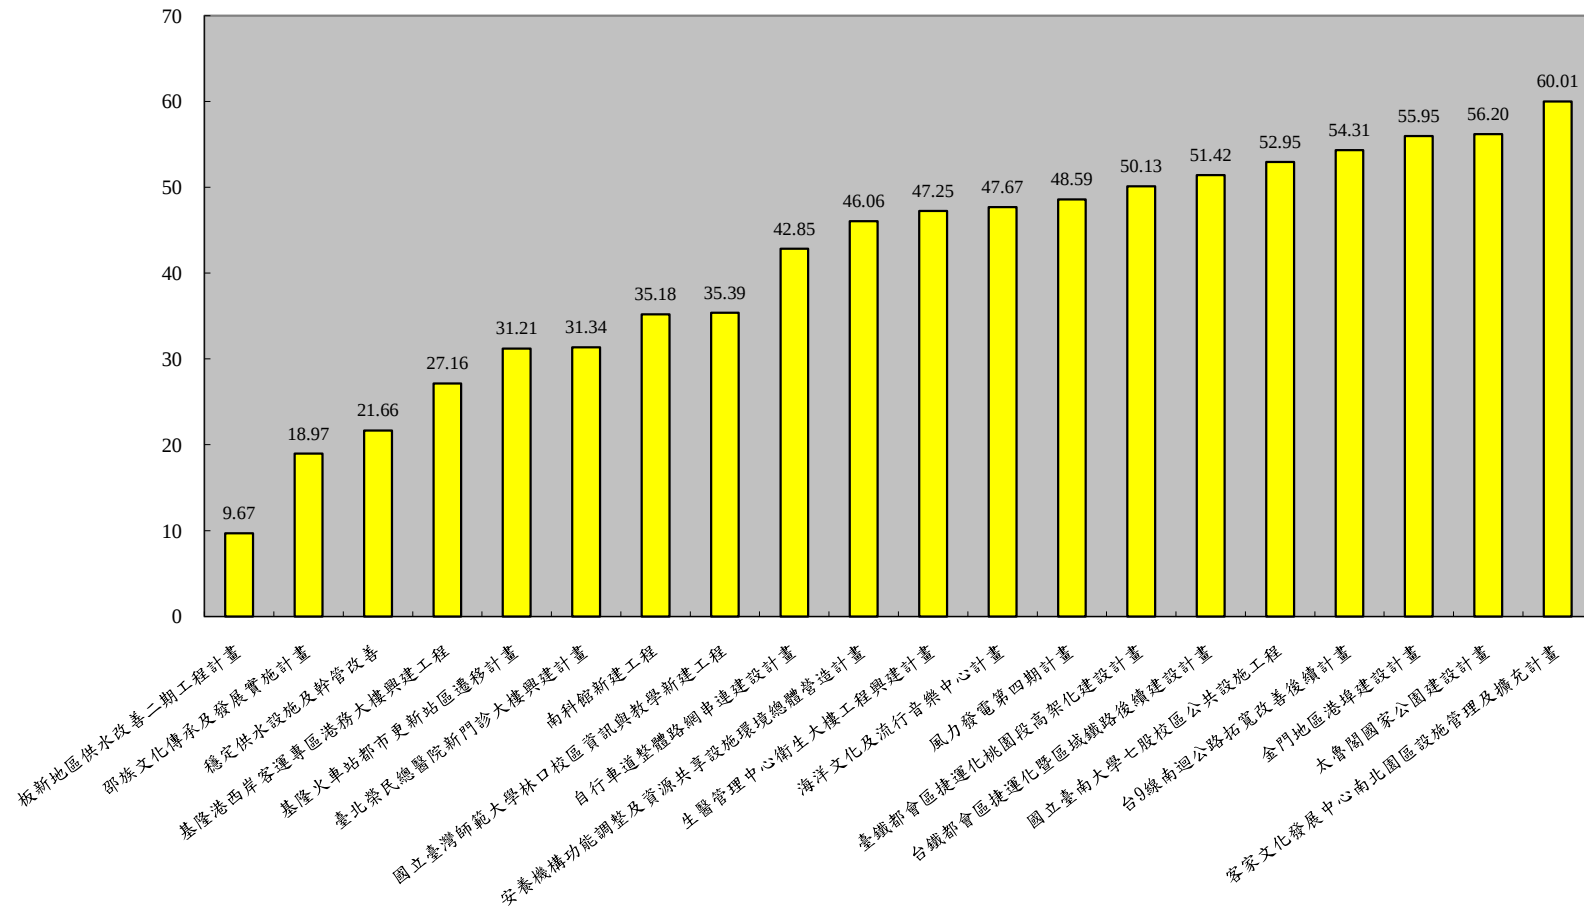

資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫
102 年度截至 9 月底預算執行率最低之 20 項計畫明細圖（詳見附表 2）

附圖 3

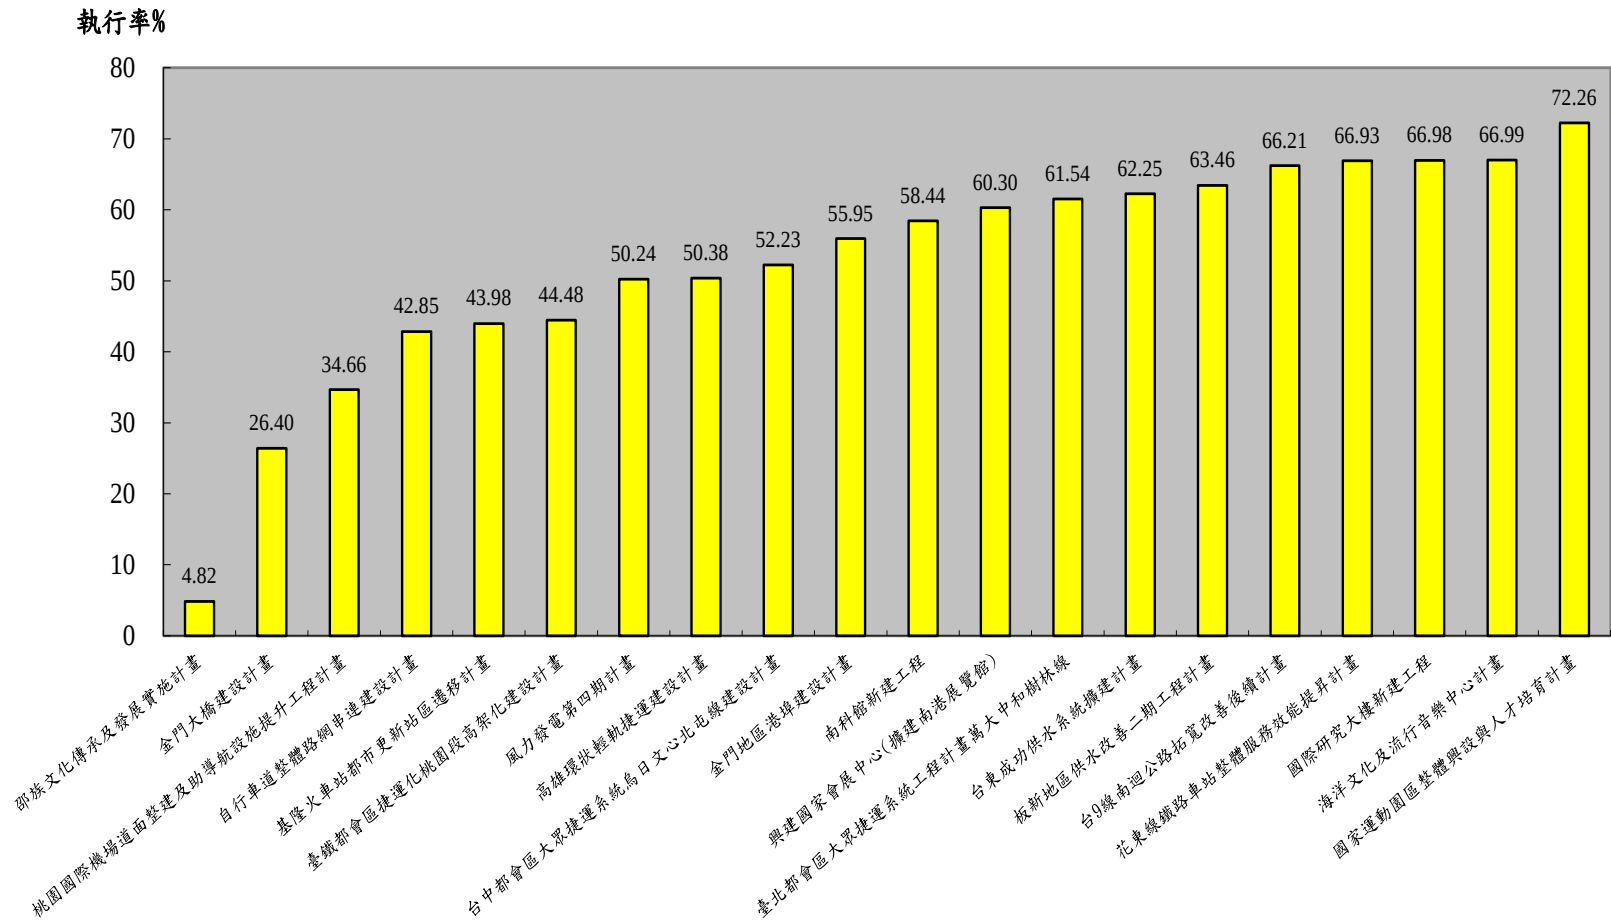

資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫

整體計畫總累計預算執行率最低之 20 項計畫明細圖（詳見附表 2）

說明：年度預算或總累計執行率未達 80% 之計畫計有 54 項，其中經審計部調查結果，核有未盡職責及效能過低情事者，計有教育部國家運動園區、原住民族委員會邵族文化傳承及發展、國防部博愛分案、教育部九層醫療大樓重建工程等 4 案，業依審計法第 69 條規定函報監察院，其餘各計畫均已分別函請各主管與主辦機關督促檢討改善。

附表2

行政院工程會列管1億元以上公共建設計畫 年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表

資料截止日期：102年9月30日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
1	經濟部	台灣自來水股份有限公司	板新地區供水改善二期工程計畫(水公司部分)	09601-10606	12,017,785	1,114,236	763,395	73,835	9.67	1,893,218	1,201,345	63.46	光復加壓站因清運廢棄土方問題，無法辦理第2階段土地協議價購；清水加壓站因水保計畫等問題影響，致影響計畫執行進度。	將積極趕辦光復加壓站第1階段工程，並與地方政府協調加速相關審查作業。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	原民會	行政院原住民族委員會	邵族文化傳承及發展實施計畫	09703-10012	553,000	14,585	12,000	2,276	18.97	482,100	23,259	4.82	因本計畫核心區域須辦理計畫修正，惟修正計畫尚未奉行政院核定，致計畫執行進度落後。	將重新估算計畫期程及所需經費，並儘速將修正計畫提報行政院核定。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關行政院查明處理，並報告監察院。
3	經濟部	台灣自來水股份有限公司	穩定供水設施及幹管改善	09501-10212	8,366,000	2,862,659	1,651,403	357,659	21.66	7,090,982	5,757,467	81.19	頂山腳加壓站廠址土地受污染，須重新變更設計；大湳淨水場遭民眾抗爭，影響試車期程；板新南調送水管因臨時道路與其他工程重疊，影響施工期程。	頂山腳加壓站續辦工程將重新招標；大湳淨水場已趕辦完成送電進行試車；板新南調送水管已研擬替代方案，將加速辦理。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	102年度可支用預算數(2)	102年度截至9月底累計分配數(3)	102年度截至9月底累計執行數(4)	102年度截至9月底執行率(%) (4/3)	累計預定支用總數(5)	累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	機關因應改善措施	審計部處理情形
4	交通部	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司	基隆港整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程	09901-10603	6,239,430	599,563	249,479	67,753	27.16	573,630	573,630	100.00	本計畫基地範圍內土地與軍方無償互撥用地事宜，因無法取得土地使用證明文件，致延宕進度。	目前趕辦土地分割為撥用標的物，以儘速完成本案無償互撥用地。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
5	交通部	交通部鐵路改建工程局	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	09801-10212	2,627,090	1,609,004	780,133	243,489	31.21	2,090,391	919,441	43.98	都市計畫變更作業未完成，影響後續特種建照申辦作業。	加強與基隆市政府協調溝通，儘速完成都審作業。	業就該案落後情形交通部函請研謀因應措施，並督促積極處理。
6	退輔會	行政院國軍退除役官兵輔導委員會	臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	10001-10508	1,570,951	149,315	74,793	23,443	31.34	416,527	365,177	87.67	因三度公開招標均流標，及都市計畫審議、法令變更新增智慧建築要求等。經提報修正計畫，已獲行政院審議通過。	增加計畫經費3.2億元，已獲行政院審議通過，展延計畫期程至106年8月，預定於102年11月20日開啟價格標。	業就該案落後情形函請退輔會研謀因應措施，並督促積極辦理。
7	文化部	國立臺灣史前文化博物館	南科館新建工程	09702-10512	1,500,000	81,455	28,435	10,003	35.18	491,850	287,422	58.44	因修正整體計畫核定時程延誤，基本設計圖說經工程會於102年6月17日始審議通過，致影響計畫執行進度。	已於102年9月3日召開細部設計圖說審查會議，並督促設計單位於102年10月底完成發包圖說。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
8	教育部	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學林口校區資訊與教學新建工程	09611-10103	750,000	110,193	61,600	21,801	35.39	661,600	623,410	94.23	因室內裝修工程進度落後，致影響計畫執行進度。	已督促執行單位加速辦理，俾利完成採購核銷作業。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
9	教育部	教育部體育署	自行車道整體路網串連建設計畫	10201-10512	1,200,000	290,000	100,000	42,850	42.85	100,000	42,850	42.85	因本年度補助較晚及部分補助審查作業尚未完成，致影響計畫執行進度。	積極輔導執行單位儘速執行及加速辦理審查作業。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
10	退輔會	行政院國軍退除役官兵輔導委員會	安養機構功能調整及資源共享設施環境總體營造中程(98-102年)計畫	09802-10212	1,229,600	503,978	428,952	197,589	46.06	1,152,137	920,553	79.90	(一)板橋榮家：因原廠商財務困難無預警停工，辦理繼受作業，延誤工進達5個月，且繼受廠商出工人數不足，工序安排不佳。 (二)太平榮家：配合組織再造於101年10月24日奉行政院核定，目前正辦理工程招標。	(一)板橋榮家：督促繼受廠商訂定趕工計畫並落實執行，達成年度內完工目標。 (二)太平榮家：已獲行政院於102年9月4日函復原則同意調整期程至103年。	業就該案落後情形函請退輔會研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至年9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
11	衛生福利部	衛生福利部	行政院衛生署「生醫管理中心－衛生大樓」工程興建計畫	09901-10206	1,900,660	426,186	284,032	134,215	47.25	1,633,887	1,484,070	90.83	本工程依契約規定應於102年3月24日完工，惟因承商對工期展延尚有疑義，為維護權益已控留逾期違約金及工程保留款合計1.45億元，致影響計畫執行進度。	已責請專案管理、監造及承攬廠商於102年10月底前取得使用執照並進場施作後續裝修工程。	業就該案落後情形函請衛生福利部研謀因應措施，並督促積極辦理。
12	文化部	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	09810-10412	5,450,000	308,790	91,128	43,445	47.67	230,013	154,095	66.99	因98年10月始核定計畫，以前年度經費不及執行繳回，致執行率偏低。	已促請代辦機關高雄市政府加強執行，並考量不同發包策略，以提升執行率。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
13	經濟部	台灣電力股份有限公司再生能源處	風力發電第四期計畫	10101-10406	1,277,000	704,444	368,668	179,126	48.59	380,903	191,361	50.24	因核三廠(II)場址尚未取得籌設許可，四湖(II)施工道路尚有爭議，致影響計畫執行進度。	經檢討後擬取消核三廠(II)及雲林四湖(II)等場址設置，已提出計畫修正。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
14	交通部	交通部鐵路改建工程局	臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	09801-10612	30,844,402	608,642	407,642	204,334	50.13	2,073,207	922,084	44.48	私有土地取得困難，至工作面無法全面開展。	將持續與私地主溝通協調租用。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	102年度可支用預算數(2)	102年度截至9月底累計分配數(3)	102年度截至9月底累計執行數(4)	102年度截至9月底執行率(%) (4/3)	累計預定支用總數(5)	累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	機關因應改善措施	審計部處理情形
15	交通部	交通部臺灣鐵路管理局	台鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗)	09401-10212	8,484,000	3,168,077	959,777	493,476	51.42	6,285,700	5,809,459	92.42	部分車站受都市計畫變更、都審、用地取得等影響，發包作業延遲，致影響計畫執行進度。	已派專責人員與地方政府相關單位及用地所有權人協商。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
16	教育部	國立臺南大學	國立臺南大學七股校區公共設施工程	09601-10112	735,000	4,265	4,000	2,118	52.95	720,348	718,466	99.74	因尚未完成驗收，致影響計畫執行進度。	已督促承商儘速改善驗收缺失。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
17	交通部	交通部公路總局	台9線南迴公路拓寬改善後續計畫	10007-10612	19,039,000	1,221,271	391,471	212,621	54.31	599,457	396,921	66.21	部分工程因保安林解編及辦理危評作業，致影響計畫執行進度。	已積極協調林務局及南檢所，補正資料。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
18	交通部	金門縣政府(交通部補助單位)	金門地區港埠建設計畫	09806-10203	1,060,000	160,009	160,009	89,521	55.95	160,009	89,521	55.95	料羅碼頭工程因辦理變更設計延遲，致影響工程進度。	將加速變更設計作業，預定於年底前完成結算驗收。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
19	內政部	太魯閣國家公園管理處	太魯閣國家公園設計畫	10101-10412	1,261,759	469,874	264,539	148,665	56.20	422,592	306,718	72.58	因規劃設計作業延遲，工程實際發包作業延後，致影響計畫執行進度。	儘速趕辦工程發包作業，以期符合進度。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至年9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
20	客委會	客家委員會客家文化發展中心	客家文化發展中心南北園區設施管理及擴充計畫	10101-10412	2,088,399	572,694	352,803	211,718	60.01	1,118,879	938,198	83.85	因環境影響說明書及開發計畫尚未經相關審查單位核定通過，未如期撥付徵收補償費，致影響計畫執行進度。	目前環境影響說明書及開發計畫業已修正送相關單位審查，該會將密切積極掌握各階段審查進度。	業就該案落後情形函請客委會研謀因應措施，並督促積極辦理。
21	經濟部	台灣電力股份有限公司再生能源處	太陽光電第一期計畫	09701-10312	3,571,250	627,072	289,999	179,687	61.96	2,714,248	2,621,086	96.57	部分工程因須辦理契約變更，及配合修訂招標文件，招標時程延後，致影響計畫執行進度。	已督促承商趕趕工進，另加緊辦理待發包標案之招標作業。	已派員辦理專案調查，相關缺失已通知經濟部檢討改進，並督促積極辦理。
22	國防部	國防部軍備局	博愛分案	08803-10012	15,853,019	2,525,887	1,143,545	723,720	63.29	11,906,808	11,657,839	97.91	因前機電廠商財務問題終止契約重新招標，致影響計畫執行進度。	督促各標廠商就可施作部分加派人力進場施作，以提升預算支用。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關國防部查明處理，並報告監察院。
23	教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院	九層醫療大樓重建工程	09812-10112	472,000	56,492	53,732	34,145	63.55	454,170	427,596	94.15	本計畫戶外景觀及公共藝術等工程，須俟校地分割原則確認後始能拆除及施工，致影響計畫執行進度。	經協商，校地分割將依教育部所提方案微調，現行舊樓將依原計畫拆除，為免影響學生上課，預訂於103年暑假完成拆除。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關教育部查明處理，並報告監察院。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
24	交通部	台北市政府 (交通部補助 單位)	臺北都會 區大眾捷 運系統工 程計畫萬 大中和樹 林線(第 一期工 程)	09902- 10912	51,265,000	500,894	348,364	224,323	64.39	589,038	362,467	61.54	因機電系統工程 歷經4次招標均流 標，致影響計畫 執行進度。	目前正辦理修正 財務計畫提高預 算，俟修正後再 依程序辦理後續 招標作業。	業就該案落後情 形函請交通部研 謀因應措施，並 督促積極處理。
25	客委會	客家委員會	客家文化 生活環境 營造計畫	09701- 10212	3,674,300	1,138,639	597,111	390,811	65.45	2,751,903	2,545,603	92.50	因部分案件於規 劃設計階段時配 合地方意見多次 修正，須重新規 劃設計，致影響 計畫執行進度。	將安排專家學者 會同前往現地訪 視，並請本計畫 區域督導團提供 諮詢輔導，以協 助排除計畫執行 過程遭遇困難。	業就該案落後情 形函請客委會研 謀因應措施，並 督促積極辦理。
26	內政部	內政部	台江國家 公園建設 計畫	10101- 10412	844,224	161,154	82,688	54,349	65.73	226,679	198,340	87.50	因行政中心新建 工程招標流標， 致影響計畫執行 進度。	刻正辦理招標， 並俟決標後積極 趕趕工進，以提 升預算執行率。	業就該案落後情 形函請內政部研 謀因應措施，並 督促積極辦理。
27	退輔會	行政院 國軍退 除役官 兵輔導 委員會	高雄榮民 總醫院高 齡醫學大 樓興建計 畫	09901- 10306	630,731	261,174	176,360	116,685	66.16	309,537	308,148	99.55	因廠商施工工率 欠佳，人員調度 不當，致進度落 後，已依契約規 定暫停支付估驗 計價款。	已核定廠商所提 趕工計畫，將持 續督促廠商依趕 工計畫趕趕工 進。	業就該案落後情 形函請退輔會研 謀因應措施，並 督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
28	交通部	高雄市政府 (交通部補助 單位)	高雄環狀 輕軌捷運 建設計畫	09201- 10912	16,537,000	2,996,062	1,858,337	1,280,760	68.92	2,542,200	1,280,760	50.38	廠商提送機電系統 期末設計文件 尚在審查中。	將加速進行機電 系統期末設計審 查，並促統包商 依設計文件進行 採購。	業就該案落後情 形函請交通部研 謀因應措施，並 督促積極處理。
29	交通部	交通部 臺灣鐵路管理 局	環島鐵路 整體系統 安全提昇 計畫	09801- 10112	14,949,000	1,455,186	833,679	575,563	69.04	14,949,000	14,069,377	94.12	部分工程廠商履 約能力不足、民 眾抗爭等因素， 致影響計畫執行 進度。	已與履約能力不 足之廠商終止契 約，並已依民眾 訴求辦理會勘。	業就該案落後情 形函請交通部研 謀因應措施，並 督促積極處理。
30	內政部	內政部	村里集會 所活動中 心興建及 修繕四年 專案計畫 (98-101)	09801- 10112	1,053,895	134,305	28,331	19,683	69.48	1,053,895	1,024,755	97.24	因補助地方政府 工程案尚未完工 或已完工尚待取 得使用執照辦理 結算，未及請款 所致。	定期邀集地方政 府召開控管會議 確實掌握其執行 進度，另如符合 撥款案件，請地 方政府儘速檢具 相關資料到部辦 理撥款。	業就該案落後情 形函請內政部研 謀因應措施，並 督促積極辦理。
31	文化部	國立臺灣 傳統藝術中 心	國立台灣 戲劇藝術 中心籌建 計畫	09701- 10412	1,660,970	371,005	269,076	193,129	71.77	473,302	374,186	79.06	主體工程承商管 理不善又頻頻更 換專業分包廠商 ，施工進度不如 預期，致影響計 畫執行進度。	已於102年9月9日 邀集專家學者至 現地指導，並責 成專案管理廠商 加強督促承商趕 工。	業就該案落後情 形函請文化部研 謀因應措施，並 督促積極辦理。
32	交通部	交通部 臺灣鐵路管理 局	臺北機廠 遷建建設 計畫	09406- 10412	17,013,792	2,415,994	1,340,000	970,589	72.43	12,319,088	11,625,684	94.37	因蘇新基地替代 場址遭當地居民 及民意代表強烈 反對，致計畫無 法順利推動。	蘇新基地經評估 後，將暫緩興建 ，刻正辦理修正 計畫中。	業就該案落後情 形函請交通部研 謀因應措施，並 督促積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
33	交通部	交通部 公路總 局	台9線蘇 花公路山 區路段改 善計畫	09912- 10612	49,200,000	6,965,988	4,236,758	3,103,432	73.25	8,167,972	6,963,373	85.25	因辦理谷風隧道 南口文化遺址第 二階段搶救工作 ，致影響計畫執 行進度。	已督促文化遺址 搶救工作儘快完 成，交付承商儘 速施作。	業就該案落後情 形函請交通部研 謀因應措施，並 督促積極處理。
34	教育部	國立高 雄應用 科技大 學	燕巢校區 行政大樓 新建工程	09707- 10303	270,000	96,582	62,582	45,874	73.30	195,472	143,008	73.16	承商未及時提出 估驗計價文件， 致影響計畫執行 進度。	已督促承商加速 辦理請款作業。	業就該案落後情 形函請教育部研 謀因應措施，並 督促積極辦理。
35	交通部	臺灣港 務股份 有限公司 基隆港 務分公 司	建設臺北 港	08201- 10112	19,643,230	616,596	616,596	462,396	74.99	18,673,631	18,408,657	98.58	因浚挖船機械故 障，致影響浚挖 作業進度。	承商已另調派浚 挖船。	業就該案落後情 形函請交通部研 謀因應措施，並 督促積極處理。
36	內政部	內政部 營建署 城鄉發 展分署	國家重要 濕地保育 計畫	10001- 10512	197,201	111,018	65,545	50,081	76.41	151,728	136,264	89.81	因地方政府執行 進度稍有落後， 致影響計畫執行 進度。	已邀集各地方政 府召開補助案進 度檢討會議，加 速各計畫執行。	業就該案落後情 形函請內政部研 謀因應措施，並 督促積極辦理。
37	文化部	衛武營 藝術文 化中心 籌備處	衛武營藝 術文化 中心興 建計畫	09401- 10312	10,170,000	2,265,580	1,338,050	1,037,938	77.57	5,753,682	4,951,803	86.06	因主體結構工程 遲至102年7月竣 工，影響後續標 案所致。	已督促其他標案 施工廠商儘速趕 工。	業就該案落後情 形函請文化部研 謀因應措施，並 督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截至 9月底 累計分配 數 (3)	102年度截至 9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
38	經濟部	台灣自來水股份有限公司中區工程處	大肚龍井高地區一帶供水計畫	10101-10412	785,920	147,184	38,306	30,014	78.35	48,072	39,780	82.75	因地主堅持不讓售，相關協調工作費時，致土地徵收作業落後。	土地徵收計畫已送內政部審核，將協調地方政府儘速辦理公告徵收事宜。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
39	農委會	行政院農業委員會林業試驗所	國家植物園建設計畫	09701-10312	738,866	206,111	98,945	77,840	78.67	382,915	349,228	91.20	因國家林木種原庫新建工程多次流標所致。	已督促執行機關儘速修正招標文件，以提高廠商投標意願。	業就該案落後情形函請農委會研謀因應措施，並督促積極辦理。
40	交通部	中華郵政股份有限公司	購建郵政局所計畫	10201-10512	2,006,765	352,251	164,000	129,719	79.10	164,000	129,719	79.10	因部分承商施工人力及管理能力的不足，致進度落後。	已督促承包商加派人手積極趕工，並依趕工計畫管控工程進度。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
41	教育部	教育部體育署	國家運動園區整體興設與人才培育計畫	09801-10312	5,751,570	1,394,965	616,926	493,414	79.98	2,779,044	2,008,262	72.26	因承商財務問題辦理停工，已於102年3月終止契約並接管工地。	已請代辦機關國工局加速辦理清點結算及後續重新發包事宜。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關行政院查明處理，並報告監察院。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
42	教育部	國立政治大學	研究總中心新建工程	10106-10306	578,150	298,153	232,153	178,681	76.97	232,153	178,681	76.97	因辦理水土保持計畫審查及雜項執照審查作業時間較原預定時間延遲，致影響計畫執行進度。	已督促承商積極趕辦相關作業，預計102年底取得使用執照。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
43	教育部	國立中山大學	國際研究大樓新建工程	09801-10410	418,717	172,640	100,500	89,319	88.87	216,370	144,924	66.98	因原承商終止契約，致工程進度落後。	接續工程案已於102年6月20日決標，將督商儘速完工。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
44	交通部	交通部臺灣區國道高速公路局	國道1號增設大灣交流道	10008-10410	595,500	149,522	90,301	81,285	90.02	105,801	81,285	76.83	因承商未按時辦理估驗計價，致影響計畫執行進度。	加速估驗計價作業程序。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
45	交通部	台北市政府(交通部補助單位)	台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	09401-10510	51,390,000	5,584,164	4,792,659	4,411,492	92.05	8,446,794	4,411,492	52.23	因機廠用地內尚有住戶未完成拆遷，需辦理停工，致影響計畫執行進度。	已於102年7月23日復工，將配合後續召開會議控管整體計畫時程。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
46	交通部	臺灣港務股份有限公司台中港務分公司	臺中港優質港區及綠色港埠發展建設	10101-10512	5,927,000	1,055,529	345,823	322,301	93.20	443,294	322,301	72.71	因工程預算含航港基金，須俟工程專業審議奉核定始可辦理發包估驗計價，致進度落後，目前由國工局送審查委	將俟工程專業審議奉核定後儘速辦理發包估驗計價。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
47	交通部	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	09904-10305	10,741,691	5,177,678	580,000	543,763	93.75	3,892,547	1,349,185	34.66	本計畫總顧問所建議之招標策略與工法，工期預估過於樂觀，影響機場營運甚巨，需調整招標策略與工法。	檢討修正計畫期程由103年5月底調整至104年12月底。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
48	交通部	交通部鐵路改建工程局	花東線鐵路車站整體服務效能提昇計畫	09803-10312	6,081,000	881,250	811,250	809,887	99.83	1,811,200	1,212,193	66.93	廠商估驗款未及時估驗所致。	將加速估驗計價作業程序。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
49	經濟部	台灣自來水股份有限公司	台東成功供水系統擴建計畫	09601-10112	374,000	135,300	42,840	43,610	101.80	355,587	263,897	74.21	原承包商因債務問題，淨水場工程無預警全面停工所致。	已重新辦理發包，於101年11月1日開工，將積極趕辦。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
50	教育部	教育部體育署	改善國民運動環境計畫	09901-10412	11,660,000	1,606,544	642,618	670,684	104.37	5,521,049	4,019,336	72.80	因委外規劃設計進度緩慢及需逐案辦理現地會勘事宜，前置審查作業較為費時，致影響計畫執行進度。	定期召開推動會議，並提供地方政府所需專業協助及諮詢，加速計畫之推動及整合。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計名 畫稱	計畫 期程	計畫經 費總額 (1)	102年度 可支用 預算數 (2)	102年度截 至年9月底 累計分配 數 (3)	102年度截 至9月底累 計執行數 (4)	102年度 截至9月 底執行率 (%) (4/3)	累計預 定支用 總數 (5)	累計實 際執行數 (6)	總累計 執行率 (%) (6/5)	落後原因	機關因應改善 措施	審計部處理情形
51	經濟部	經濟部 國際貿 易局	興建國家 會展中心 (擴建南 港展覽 館)	09707- 10411	7,266,400	2,338,668	926,497	1,012,194	109.25	2,161,321	1,303,198	60.30	基礎開挖承包商擬採島式工法，與環境影響說明書採逆打工法不同，需協商解決方案，致影響計畫	基礎開挖方式變更案業經審查通過，已督促提送趕工計畫積極施工。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
52	交通部	金門縣 政府 (交通 部補助 單位)	金門大橋 建設計畫	09912- 10503	7,384,666	1,552,907	278,200	397,278	142.80	1,505,099	397,278	26.40	廠商已施作工項未及辦理估驗計價，致影響計畫執行進度。	已督促廠商儘速提送估驗資料。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
53	交通部	桃園國 際機場 股份有 限公司	國家重要 交通門戶 —桃園國 際機場第 一航廈改 善工程專 案計畫	09612- 10212	2,971,626	1,010,284	276,200	407,202	147.43	2,971,626	2,169,804	73.02	本計畫所屬工程均已完工，惟承商未完成計價程序，致影響計畫執行進度。	將加速計價程序。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極處理。
54	經濟部	台灣自 來水股 份有限 公司	台東成功 供水系統 擴建計畫	09601- 10212	374,000	135,300	570	1,070	187.72	355,587	221,357	62.25	原承商因債務問題，淨水場工程無預警停工，致影響計畫執行進度。	已重新辦理發包，並於101年11月1日開工，將積極督商趕辦。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
