

民國 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫預算執行情形

民國 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫計 208 項，分屬 13 個主管機關¹，可支用預算數 3,595 億餘元，截至第 1 季止，累計分配預算數 603 億餘元，累計執行數 603 億餘元，執行率 99.98%，其中客家委員會、教育部、海岸巡防署執行率未達 80%；各項計畫年度執行率未達 80%者，有 35 項計畫；總累計執行率未達 80%者，有 32 項計畫。各主管機關執行情形等詳細資料²列示如後。

- [各主管機關預算執行情形統計表（附表1）](#)
- [各主管機關預算執行情形統計圖（附圖1）](#)
- [年度預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖2）](#)
- [整體計畫總累計預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖3）](#)
- [年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表（附表2）](#)

¹係指計畫主管機關，以下同。

²各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就預算執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

民國 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計表

民國 106 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：百萬元

排 序	主管機關	列管計 畫項數	可支用 預算數 (1)	累計 分配數 (2)	累計 支用數 (3)	累計 應付未付數 (4)	累計 結餘數 (5)	累計 執行數 (6=3+4+5)	執行率 (%) (6/2)
合 計		208	359,504	60,353	28,292	31,353	694	60,340	99.98
1	客家委員會	2	772	124	74	-	-	74	59.32
2	教育部	23	12,382	1,563	1,082	139	-	1,221	78.14
3	海岸巡防署	1	492	73	57	-	-	57	78.49
4	交通部	66	160,057	28,012	11,855	14,041	-	25,897	92.45
5	原住民族委員會	2	653	26	24	-	-	24	94.68
6	環境保護署	2	1,796	132	91	38	-	129	97.91
7	經濟部	41	117,648	23,366	10,314	13,149	639	24,102	103.15
8	農業委員會	26	21,514	3,477	2,170	1,489	49	3,708	106.65
9	內政部	15	25,473	1,769	1,215	702	5	1,923	108.71
10	科技部	5	3,419	280	209	105	-	314	112.25
11	國軍退除役官兵輔導委員會	6	1,184	245	137	140	-	278	113.50
12	國防部	7	2,209	402	445	19	-	465	115.59
13	文化部	12	11,900	878	614	1,527	-	2,141	243.66


註：1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國 106 年度核列預算數，接續之累計分配數、累計執行數等，均係以該可支用預算數進行分配及執行結果。

3. 累計執行數包含累計支用數、已執行之應付未付數及結餘數。

附圖 1


民國 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖

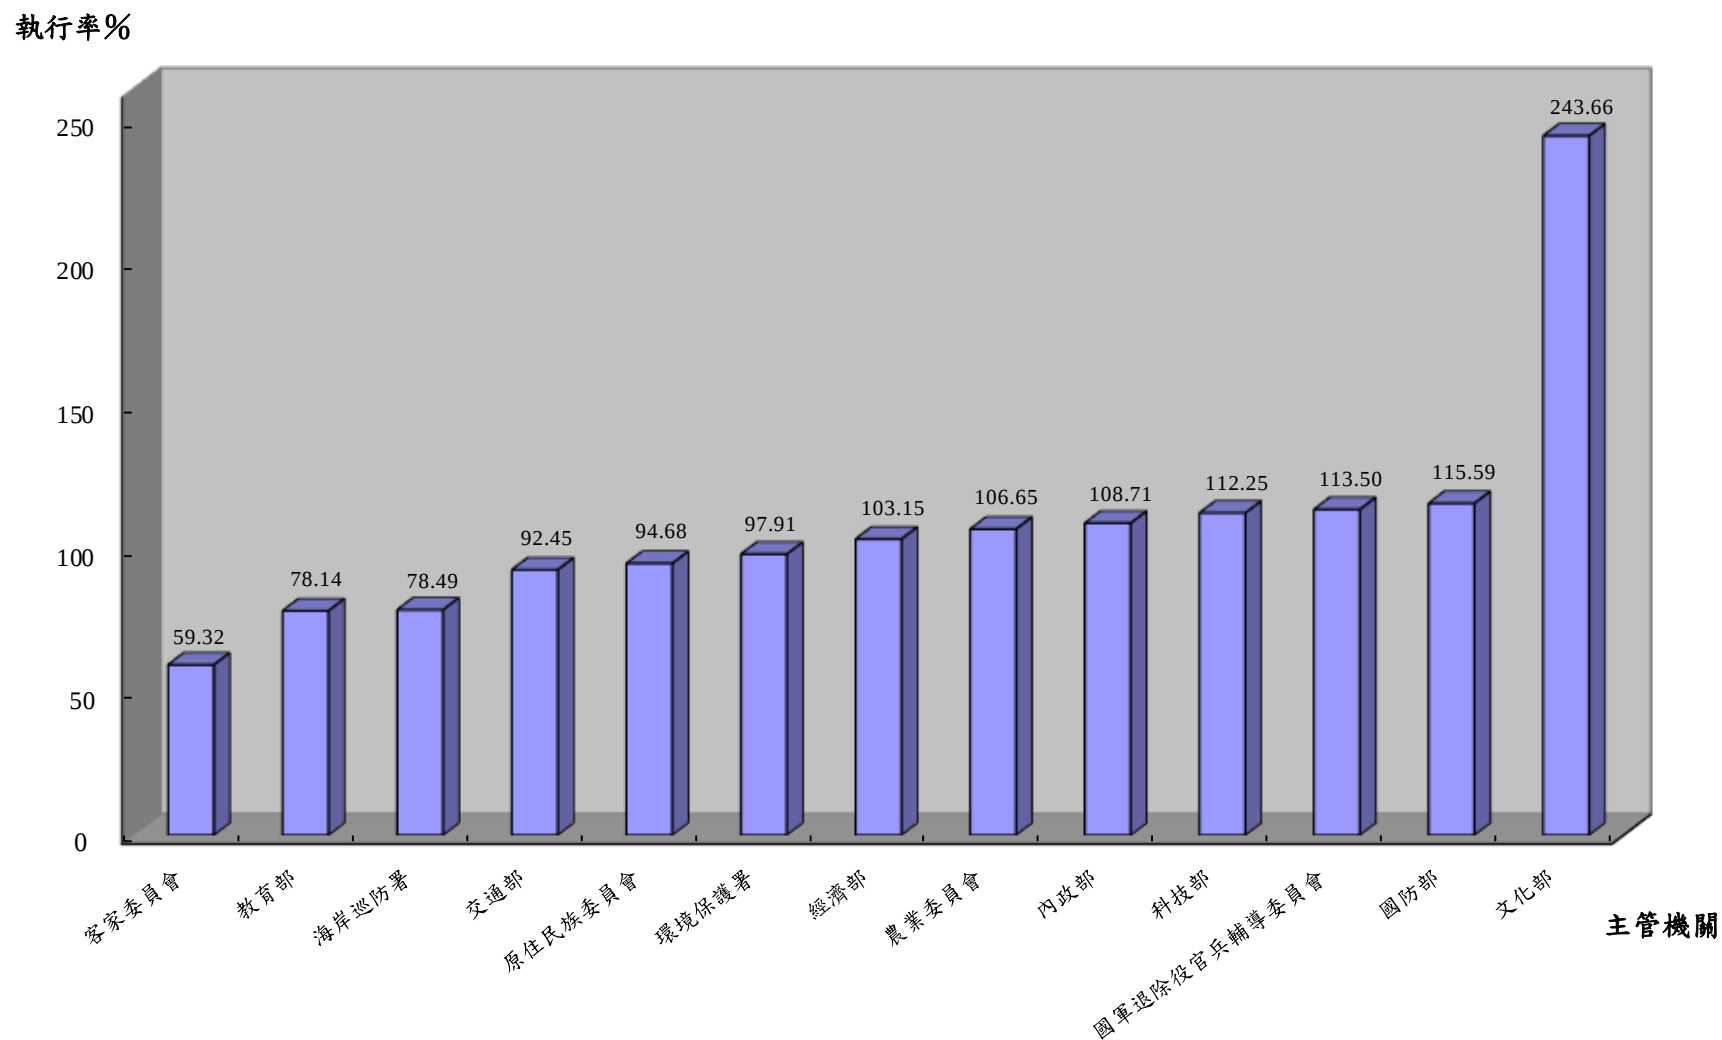

資料截止日期：民國 106 年 3 月 31 日

附圖 2


民國 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫 年度預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

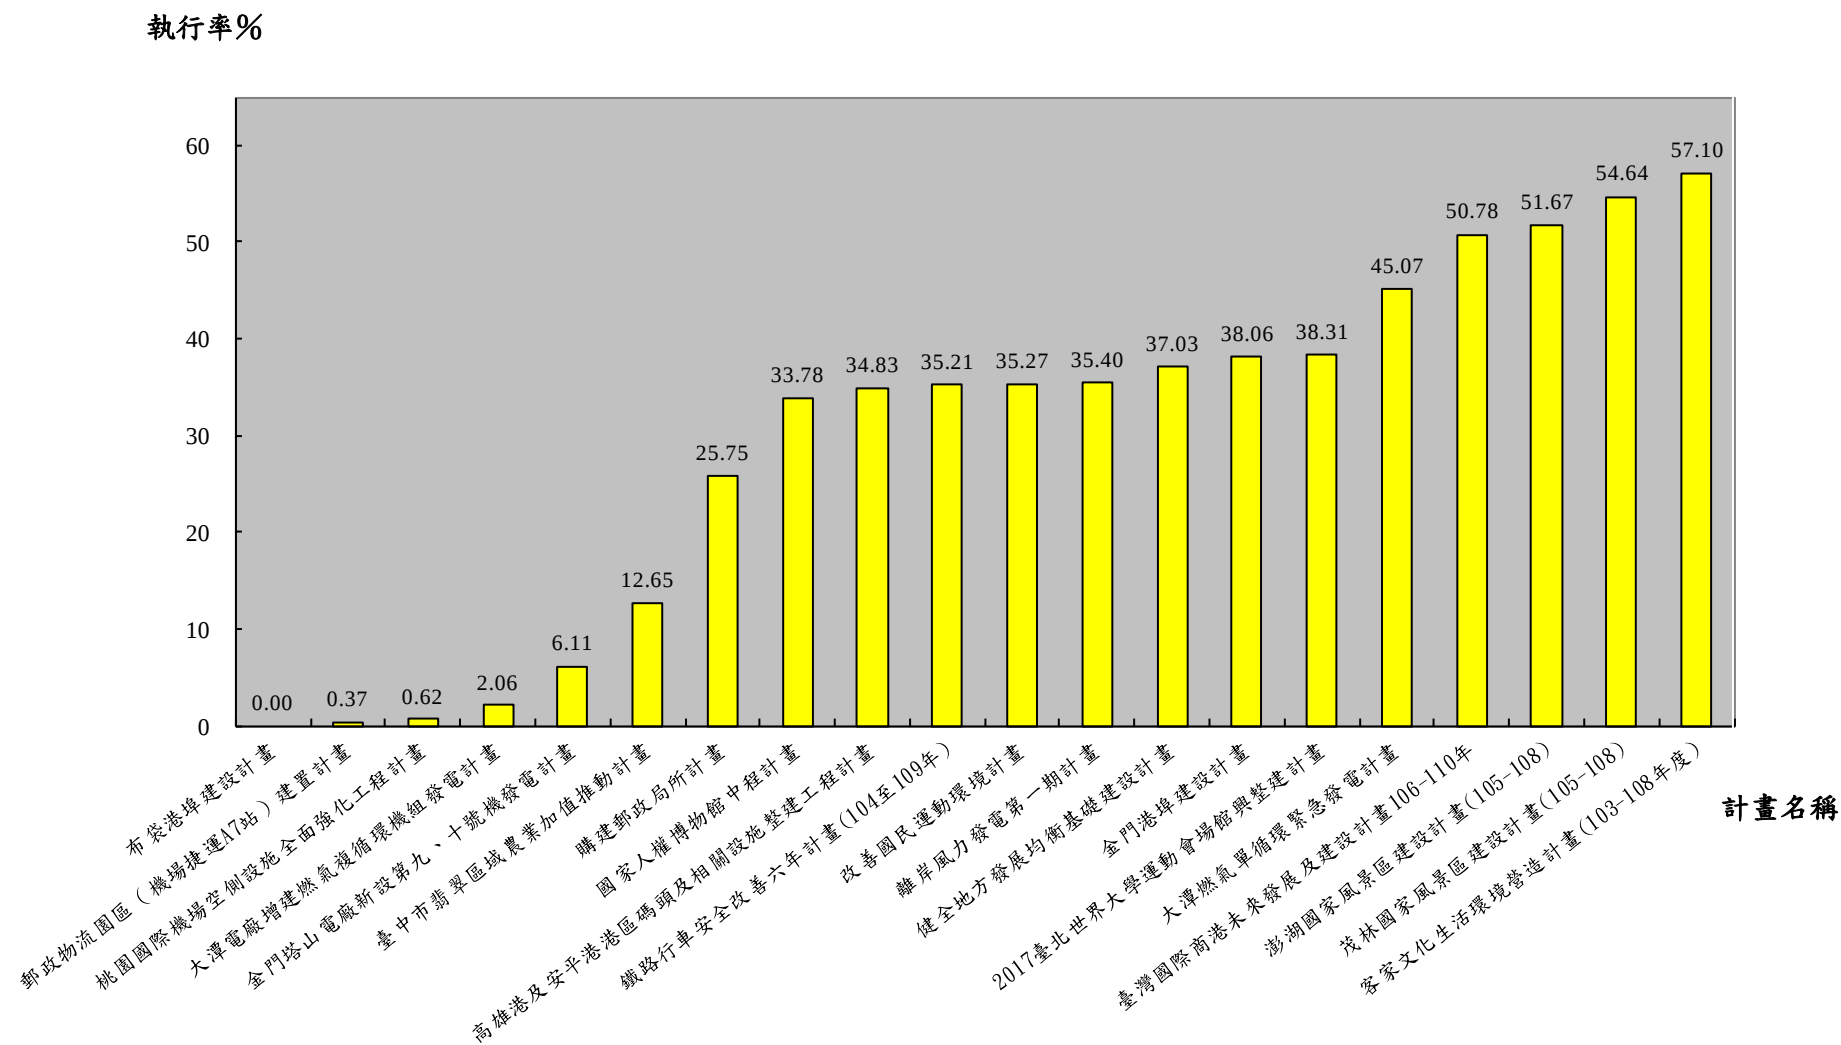

資料截止日期：民國 106 年 3 月 31 日

附圖 3

民國 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫
整體計畫總累計預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

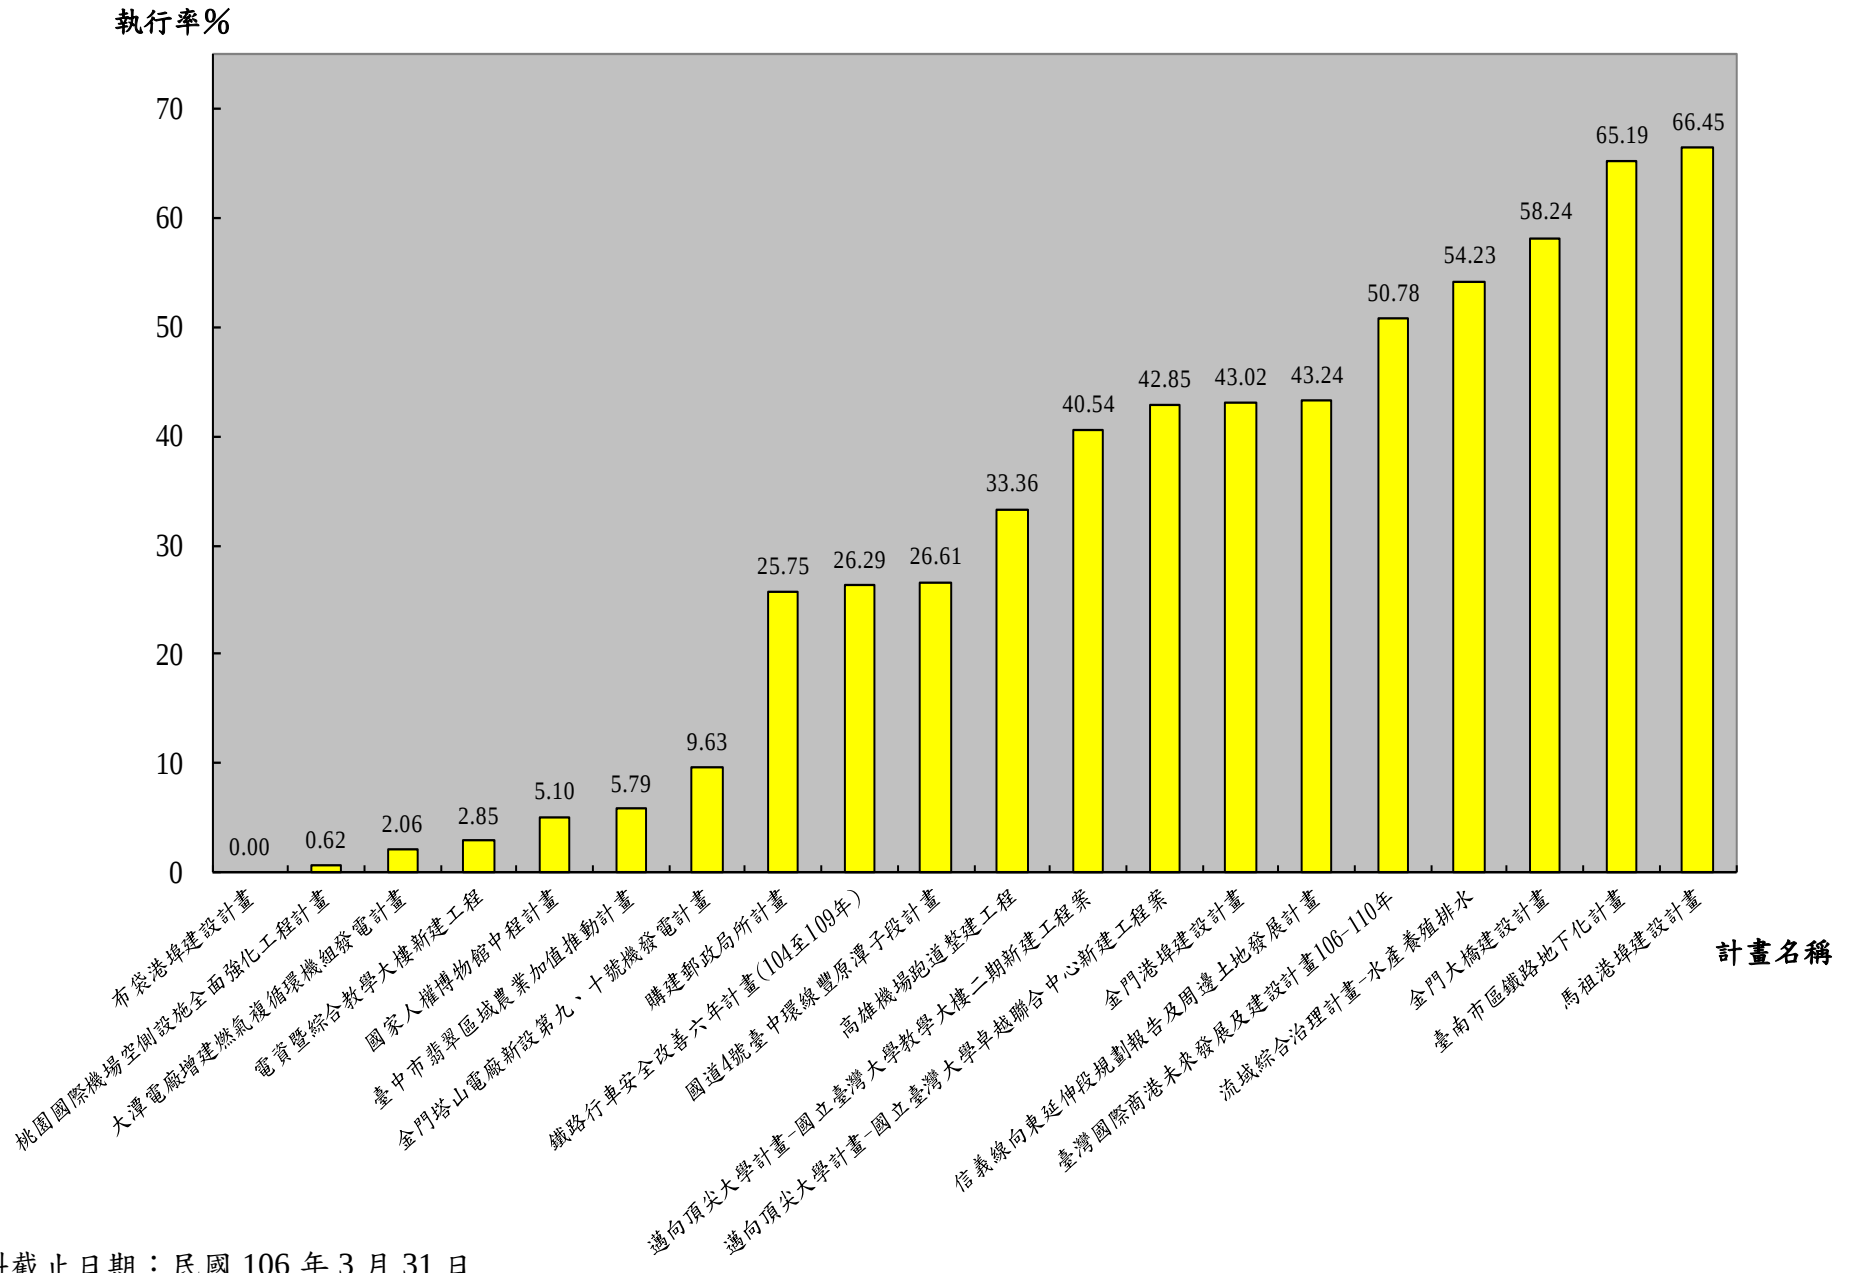

資料截止日期：民國 106 年 3 月 31 日

附表2

民國106年度行政院工程會列管1億元以上公共建設計畫
年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表

民國106年1月1日至3月31日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
1	交通部	交通部航港局	國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－布袋港埠建設計畫	10601-11012	1,027,143	212,500	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00	因細部設計進度落後所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	交通部	中華郵政股份有限公司	郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫	10301-10912	22,078,307	3,659,591	220,909	807	0.37	7,512,034	7,291,932	97.07	因購置機器設備重新研議需求規格延後招標所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
3	交通部	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場空側設施全面強化工程計畫	10601-10909	3,026,540	1,100,000	2,401	15	0.62	2,401	15	0.62	因技術服務採購案遲至106年3月13日始決標致影響預算執行。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
4	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	10601-11512	110,460,147	177,895	2,455	51	2.06	2,455	51	2.06	因計畫執行初期工地人員尚未進駐，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
5	經濟部	台灣電力股份有限公司營建處	金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	10509-10912	2,536,407	436,070	1,670	102	6.11	1,735	167	9.63	因用人費用支出較預估數減少，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
6	農業委員會	農業委員會農糧署	臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫)	10401-10812	8,817,200	4,686,528	480,808	60,832	12.65	3,342,996	193,527	5.79	因招標多次流標所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
7	交通部	中華郵政股份有限公司	購建郵政局所計畫	10601-10912	9,941,492	3,382,342	20,099	5,175	25.75	20,099	5,175	25.75	因部分郵局新建工程之建造執照取得延誤所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
8	文化部	國家人權博物館籌備處	國家人權博物館中程計畫	10501-10812	2,201,900	100,299	2,108	712	33.78	100,829	5,145	5.10	因尚需辦理計畫修正所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
9	交通部	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	10201-10712	7,101,043	1,468,158	123,386	42,974	34.83	2,777,299	2,744,330	98.81	因承商浚挖船受損，致計畫執行進度落後。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
10	交通部	交通部臺灣鐵路管理局	鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)	10401-10912	27,522,400	7,881,146	279,759	98,494	35.21	5,717,488	1,503,060	26.29	因配合身心障礙者權益保障法更新車站設施，辦理招標文件修正，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
11	教育部	教育部體育署	改善國民運動環境計畫	09901-10612	11,660,000	956,012	190,742	67,272	35.27	8,856,867	7,562,705	85.39	因保留款核定前無法動支經費，影響預算執行所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
12	經濟部	台灣電力股份有限公司海域風電施工處	離岸風力發電第一期計畫	10401-10906	19,536,184	1,771,395	105,911	37,492	35.40	295,947	227,529	76.88	因計畫用地產權移轉作業延遲，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
13	內政部	內政部	健全地方發展均衡基礎建設計畫	10201-10712	2,000,000	362,354	42,751	15,831	37.03	1,573,866	1,227,374	77.98	因地方政府辦理規劃設計、工程發包及施工進度較緩慢，無法如期撥付經費等所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
14	交通部	金門縣政府(交通部補助單位)	國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－金門港埠建設計畫	10601-11012	4,694,161	114,900	10,400	3,958	38.06	10,400	3,958	38.06	因沉箱基礎開挖整平作業延宕所致。	業就該案落後情形函請交通部督促金門縣政府積極處理。
15	教育部	教育部體育署	2017臺北世界大學運動會場館興建計畫	10210-10612	3,339,015	873,223	289,638	110,964	38.31	2,755,430	2,486,023	90.22	因臺北市府及國、私立大專校院延遲請撥補助款所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
16	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處	大潭燃氣單循環緊急發電計畫	10511-10612	9,500,000	8,200,000	41,892	18,882	45.07	1,308,249	1,285,239	98.24	因利息及水電費支出較預估數減少，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
17	交通部	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司	臺灣國際商港未來發展及建設計畫106-110年－基隆港、臺北港、蘇澳港實質建設辦理部分	10601-11012	13,720,050	1,731,060	56,035	28,452	50.78	56,035	28,452	50.78	因新生地地質改良工程進度落後所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
18	交通部	交通部觀光局澎湖國家風景區管理處	澎湖國家風景區建設計畫(105-108)	10501-10812	800,000	265,000	20,250	10,463	51.67	223,061	213,274	95.61	因承商派工人力不足，致影響工進。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
19	交通部	交通部觀光局茂林國家風景區管理處	茂林國家風景區建設計畫(105-108)	10501-10812	944,000	275,000	22,500	12,294	54.64	254,500	252,277	99.13	因細部設計延遲致影響後續發包作業。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
20	客家委員會	客家委員會	客家文化生活環境營造計畫(103-108年度)	10301-10812	3,573,000	652,021	106,199	60,640	57.10	2,117,231	2,014,390	95.14	因地方政府納入預算證明等相關行政作業未能及時因應，致補助經費未能如期撥付。	業就該案落後情形函請客家委員會督促積極辦理。
21	文化部	國立傳統藝術中心	跨藝匯流·傳統入心公共建設跨域增值發展計畫	10401-10912	3,457,800	974,895	108,932	66,254	60.82	554,058	511,380	92.30	因部分工程辦理變更設計作業，影響工程施工所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
22	交通部	交通部民用航空局飛航服務總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	10201-10712	1,271,720	623,285	46,405	28,241	60.86	469,653	340,805	72.57	因天候不佳及承商派工人力不足，致影響工進。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
23	交通部	交通部觀光局東部海岸風景區管理處	東部海岸國家風景區設計畫(105-108)	10501-10812	920,000	265,000	22,100	13,865	62.74	252,081	243,846	96.73	因工程建造執照取得延誤所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
24	交通部	新北市政府(交通部補助單位)	淡海輕軌運輸系統計畫	10202-11412	15,305,599	3,534,356	181,042	113,607	62.75	5,507,400	4,761,239	86.45	因管線尚未遷移致影響工程進度。	業就該案落後情形函請交通部督促新北市政府積極處理。
25	教育部	國立臺灣大學	邁向頂尖大學計畫-國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程案	10007-10712	152,000	152,000	13,826	8,826	63.84	605,095	259,305	42.85	因施工工序不良及施工人力不足等所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
26	文化部	文化部文化資產局	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	10501-10812	5,205,000	1,784,930	160,829	106,429	66.18	1,233,469	1,179,069	95.59	因受補助單位遲未申請撥款所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
27	交通部	連江縣政府(交通部補助單位)	國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-馬祖港埠建設計畫	10601-11001	2,247,225	426,099	35,500	23,590	66.45	35,500	23,590	66.45	因材料進場時程延後致影響工程進度。	業就該案落後情形函請交通部督促連江縣政府積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
28	內政部	內政部營建署城鄉發展分署	國家濕地保育計畫(106-110年)	10601-11012	118,742	118,742	30,947	20,750	67.05	30,947	20,750	67.05	保育利用計畫因需辦理公開展覽說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等較為費時，尚未達撥款條件，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
29	內政部	墾丁國家公園管理處	墾丁國家公園計畫	10501-10812	933,621	380,921	35,125	23,677	67.41	35,125	23,677	67.41	船帆石公廁新建工程因民眾陳情，停工辦理變更設計等所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
30	文化部	文化部	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	10501-11012	2,252,000	734,222	4,572	3,120	68.24	304,401	302,949	99.52	因年度計畫審查作業延遲所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
31	文化部	國立傳統藝術中心	臺灣戲曲中心籌建計畫	09701-10612	1,660,522	169,090	14,150	10,024	70.84	1,505,581	1,501,455	99.73	因主體工程尚未完成驗收作業所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
32	交通部	交通部公路總局	全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫	10401-10712	1,033,070	254,679	20,209	14,409	71.30	536,037	520,828	97.16	因部分已執行經費尚未辦理核銷轉正所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
33	交通部	交通部觀光局馬祖國家風景區管理處	馬祖國家風景區建設計畫	10501-10812	768,000	257,000	45,600	33,338	73.11	287,600	275,338	95.74	因細部設計延遲致影響後續發包作業。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
34	交通部	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司	高雄港洲際貨櫃中心第2期工程計畫	10001-10812	34,452,839	5,988,874	1,624,242	1,197,841	73.75	15,036,162	14,615,982	97.21	因材料進場時程延後致影響工程進度。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
35	海岸巡防署	海岸巡防署海洋巡防總局	臺中港海巡基地新建工程計畫	10401-10706	877,372	492,291	73,832	56,331	76.30	87,678	70,177	80.04	因碼頭工程基礎遭遇卵礫石層打設困難，及施工場地空間不足等影響，致進度落後。	業就該案落後情形函請海岸巡防署研謀因應措施，並督促積極辦理。
36	交通部	高雄市政府(交通部補助單位)	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	09201-10912	16,537,000	3,428,764	569,341	509,204	89.44	8,214,861	6,511,180	79.26	因廠商爆發財務危機致影響工程進度。	業就該案落後情形函請交通部督促高雄市政府積極處理。
37	交通部	交通部鐵路改建工程局	臺南市區鐵路地下化計畫	09809-11306	29,360,000	761,444	149,542	134,982	90.26	1,695,216	1,105,055	65.19	因都市計畫變更遭民眾強烈抗爭，致影響用地取得作業期程。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
38	交通部	交通部臺灣區國道新建工程局	國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	10309-11012	26,650,890	8,141,217	1,769,132	1,716,126	97.00	7,557,408	2,010,909	26.61	因用地爭議協調延遲致影響預算執行。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
39	交通部	臺北市政府(交通部補助單位)	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫	09902-11012	13,101,400	1,112,272	38,218	38,100	99.69	1,001,136	432,884	43.24	因地主參與土地開發之意願偏低，經臺北市政府確認不設R04站，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請交通部督促臺北市政府積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
40	教育部	國立臺灣大學	邁向頂尖大學計畫-國立臺灣大學教學大樓二期新建工程案	10001-10612	701,907	347,950	10,427	10,427	100.00	630,036	255,447	40.54	因需增辦環境影響評估變更，影響工程進度所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
41	交通部	金門縣政府(交通部補助單位)	金門大橋建設計畫	09905-10706	7,384,666	1,893,417	280,121	280,121	100.00	5,058,389	2,946,093	58.24	因海象惡劣造成橋墩基樁施工作業困難，致影響工程進度。	業就該案落後情形函請交通部督促金門縣政府積極處理。
42	經濟部	經濟部水利署	離島地區供水改善計畫	09601-10612	2,340,000	806,845	111,435	111,435	100.00	1,762,519	1,339,059	75.97	因地方政府暫停辦理計畫項下之大金門海淡廠功能改善暨擴建工程招標作業，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
43	經濟部	經濟部水利署	金門自大陸引水工程計畫	10308-10612	1,350,000	1,040,419	87,626	88,250	100.71	354,781	267,155	75.30	因東北季風海象不佳，海管工程暫停施工，致影響預算執行。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
44	交通部	新北市政府(交通部補助單位)	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	10406-11412	50,199,900	4,910,355	8,392	9,417	112.21	3,009,788	2,270,061	75.42	因用地爭議協調延遲致影響預算執行。	業就該案落後情形函請交通部督促新北市政府積極處理。
45	文化部	國立臺灣史前文化博物館	南科館新建工程	09702-10612	1,500,000	756,862	154,000	193,907	125.91	1,283,503	930,669	72.51	因承商施作外牆石材加工及室內裝修材料加工進度落後所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
46	內政部	內政部營建署	國家公園永續發展計畫(105-108)	10501-10812	807,551	209,712	26,614	36,148	135.82	173,421	131,230	75.67	因部分工程細部設計及預算書圖審查延遲、招標流標等所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
47	農業委員會	農業委員會漁業署	流域綜合治理計畫-水產養殖排水	10306-10812	2,550,000	1,181,417	121,550	210,761	173.39	1,024,259	555,470	54.23	因用地取得及招標前置作業延遲所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
48	教育部	國立臺灣海洋大學	電資暨綜合教學大樓新建工程	10101-10812	265,000	126,225	0	0	-	129,932	3,708	2.85	因都市計畫審議時程較長，影響設計作業時程所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
49	交通部	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場跑道整建工程	10301-10702	975,010	849,454	0	0	-	63,202	21,082	33.36	因工程招標多次流標所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
50	交通部	桃園國際機場股份有限公司	WC滑行道遷建及雙線化工程設計畫	10308-10802	3,608,281	1,107,048	0	171	-	1,929,834	1,422,957	73.73	因105年6月2日強降雨造成機場淹水事件，經重新檢討工程範圍內排水箱涵路線，致計畫進度落後。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。

註： 1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國106年度核列預算數。

3. 總累計預定支用數係指從計畫開始至當季止之累計分配數。
