

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫預算執行情形

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫計 199 項¹，分屬 14 個主管機關²，可支用預算數 3,574 億餘元，截至第 2 季止，累計分配預算數 1,296 億餘元，累計執行數 1,312 億餘元，執行率 101.26%，其中教育部及國立故宮博物院等 2 個主管機關執行率未達 80%；各項計畫年度執行率未達 80%者，有 39 項計畫；總累計執行率未達 80%者，有 31 項計畫。各主管機關執行情形等詳細資料³列示如後。

- 各主管機關預算執行情形統計表（附表1）
- 各主管機關預算執行情形統計圖（附圖1）
- 年度預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖2）
- 整體計畫總累計預算執行率最低之20項計畫明細圖（附圖3）
- 年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表（附表2）

¹原列管 197 項，因教育部「國立宜蘭大學活動中心暨游泳池館新建工程」及「國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程」等 2 項計畫民國 105 年度可支用預算數達 1 億元以上，由該部於民國 105 年 4 月 15 日向行政院工程會申請新增列管。

²係指計畫主管機關，以下同。

³各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就預算執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計表

民國 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管計畫項數	可支用預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計支用數 (3)	累計應付未付數 (4)	累計結餘數 (5)	累計執行數 (6=3+4+5)	執行率 (%) (6/2)
合 計		199	357,499	129,628	79,384	49,562	2,320	131,268	101.26
1	教育部	20	10,942	3,176	1,257	868	0	2,126	66.94
2	國立故宮博物院	1	1,424	927	342	393	-	736	79.40
3	環境保護署	2	1,659	410	236	124	6	367	89.55
4	科技部	5	4,662	2,445	2,034	138	25	2,198	89.91
5	海岸巡防署	3	754	583	500	29	-	529	90.67
6	交通部	66	134,689	49,950	28,278	17,833	-	46,111	92.32
7	國防部	7	2,226	953	993	-	-	993	104.18
8	農業委員會	20	24,123	9,455	7,760	1,966	138	9,866	104.34
9	內政部	17	28,097	8,959	8,647	1,042	1	9,690	108.16
10	經濟部	37	135,051	48,684	26,809	23,801	2,130	52,741	108.33
11	國軍退除役官兵輔導委員會	5	1,772	598	476	157	17	650	108.66
12	客家委員會	2	721	190	213	-	1	214	112.57
13	原住民族委員會	3	696	90	103	-	-	103	114.72
14	文化部	11	10,678	3,202	1,730	3,207	0	4,938	154.22


註：1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國 105 年度核列預算數，接續之累計分配數、累計執行數等，均係以該可支用預算數進行分配及執行結果。

3. 預算執行數包含累計支用數、已執行之應付未付數及結餘數。

附圖 1


民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖

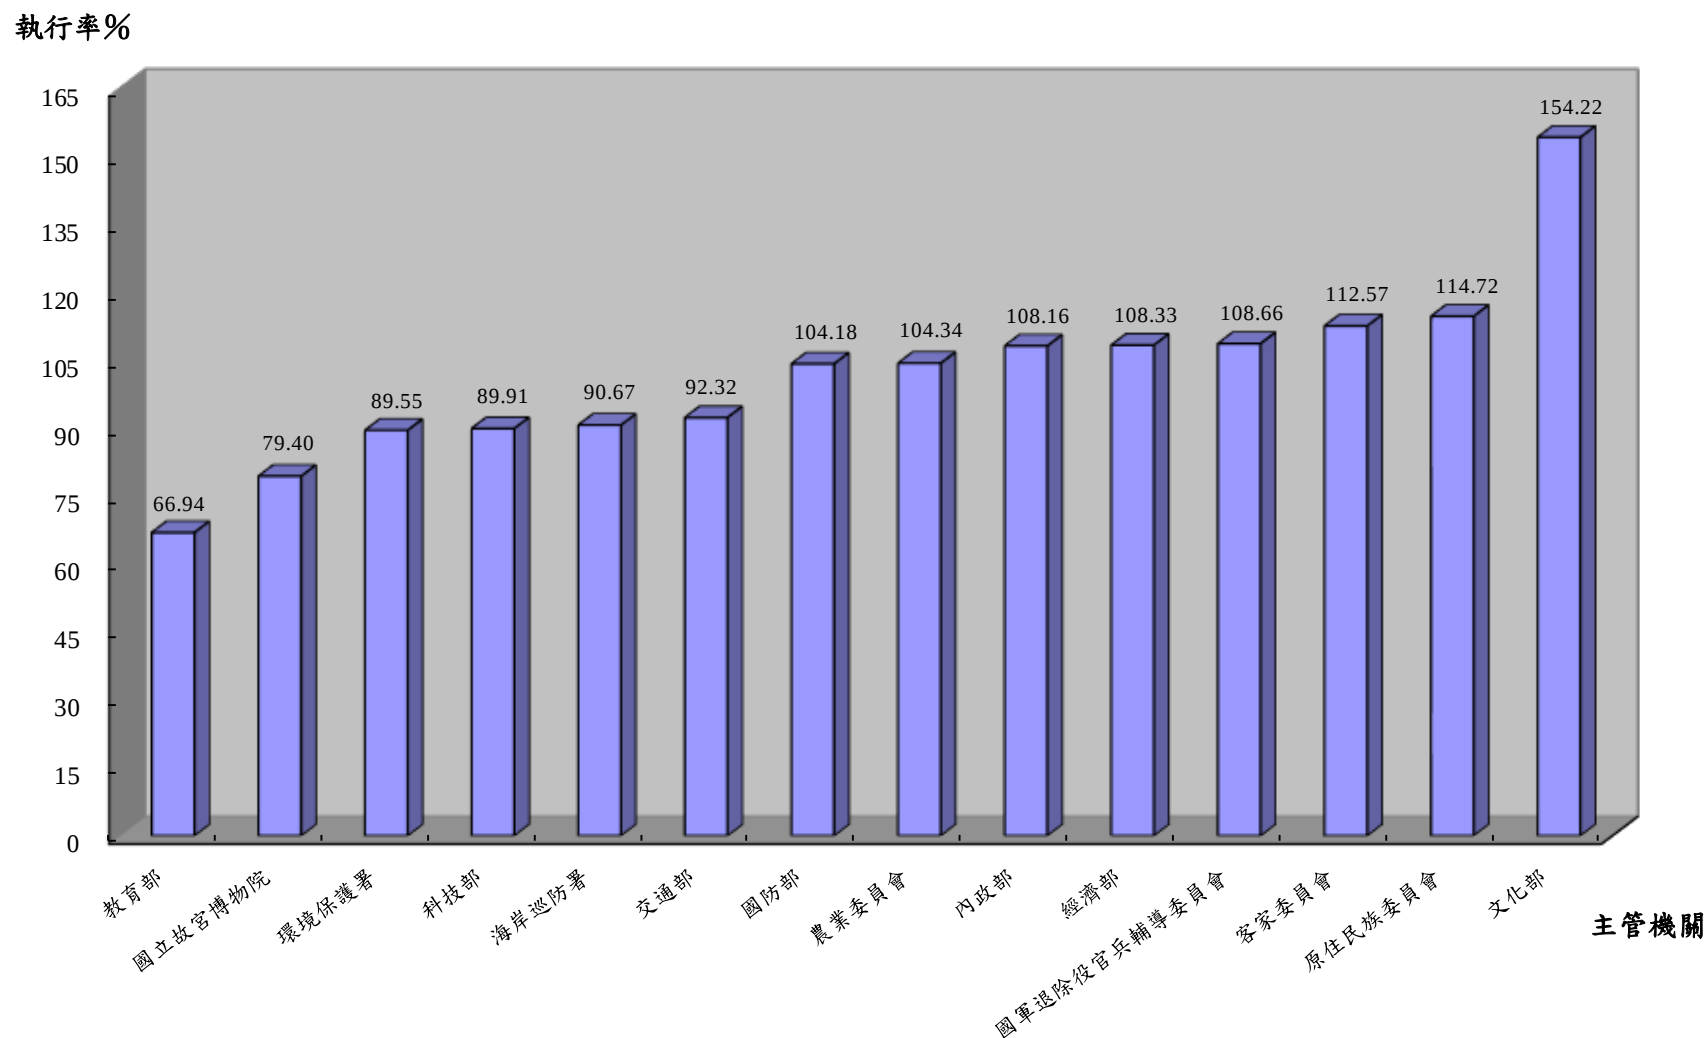

資料截止日期：民國 105 年 6 月 30 日

附圖 2


民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫 年度預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

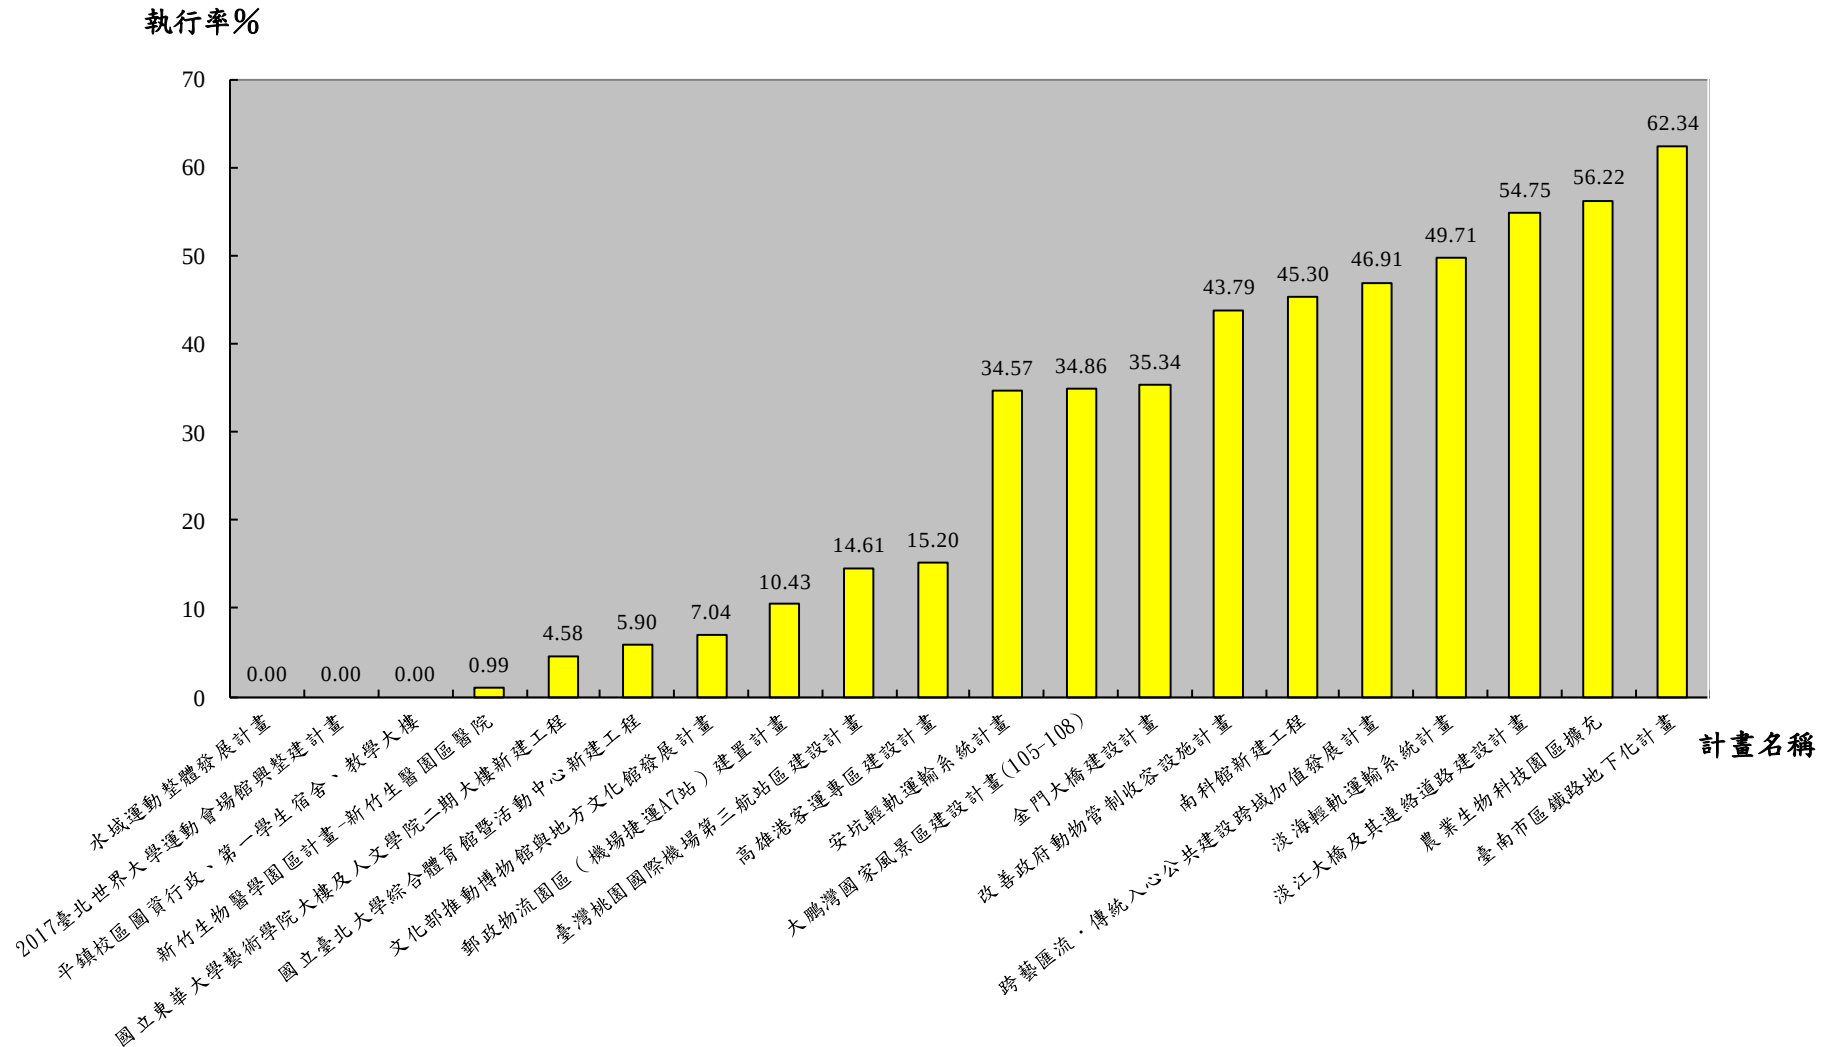

資料截止日期：民國 105 年 6 月 30 日

附圖 3

民國 105 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計畫
整體計畫總累計預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

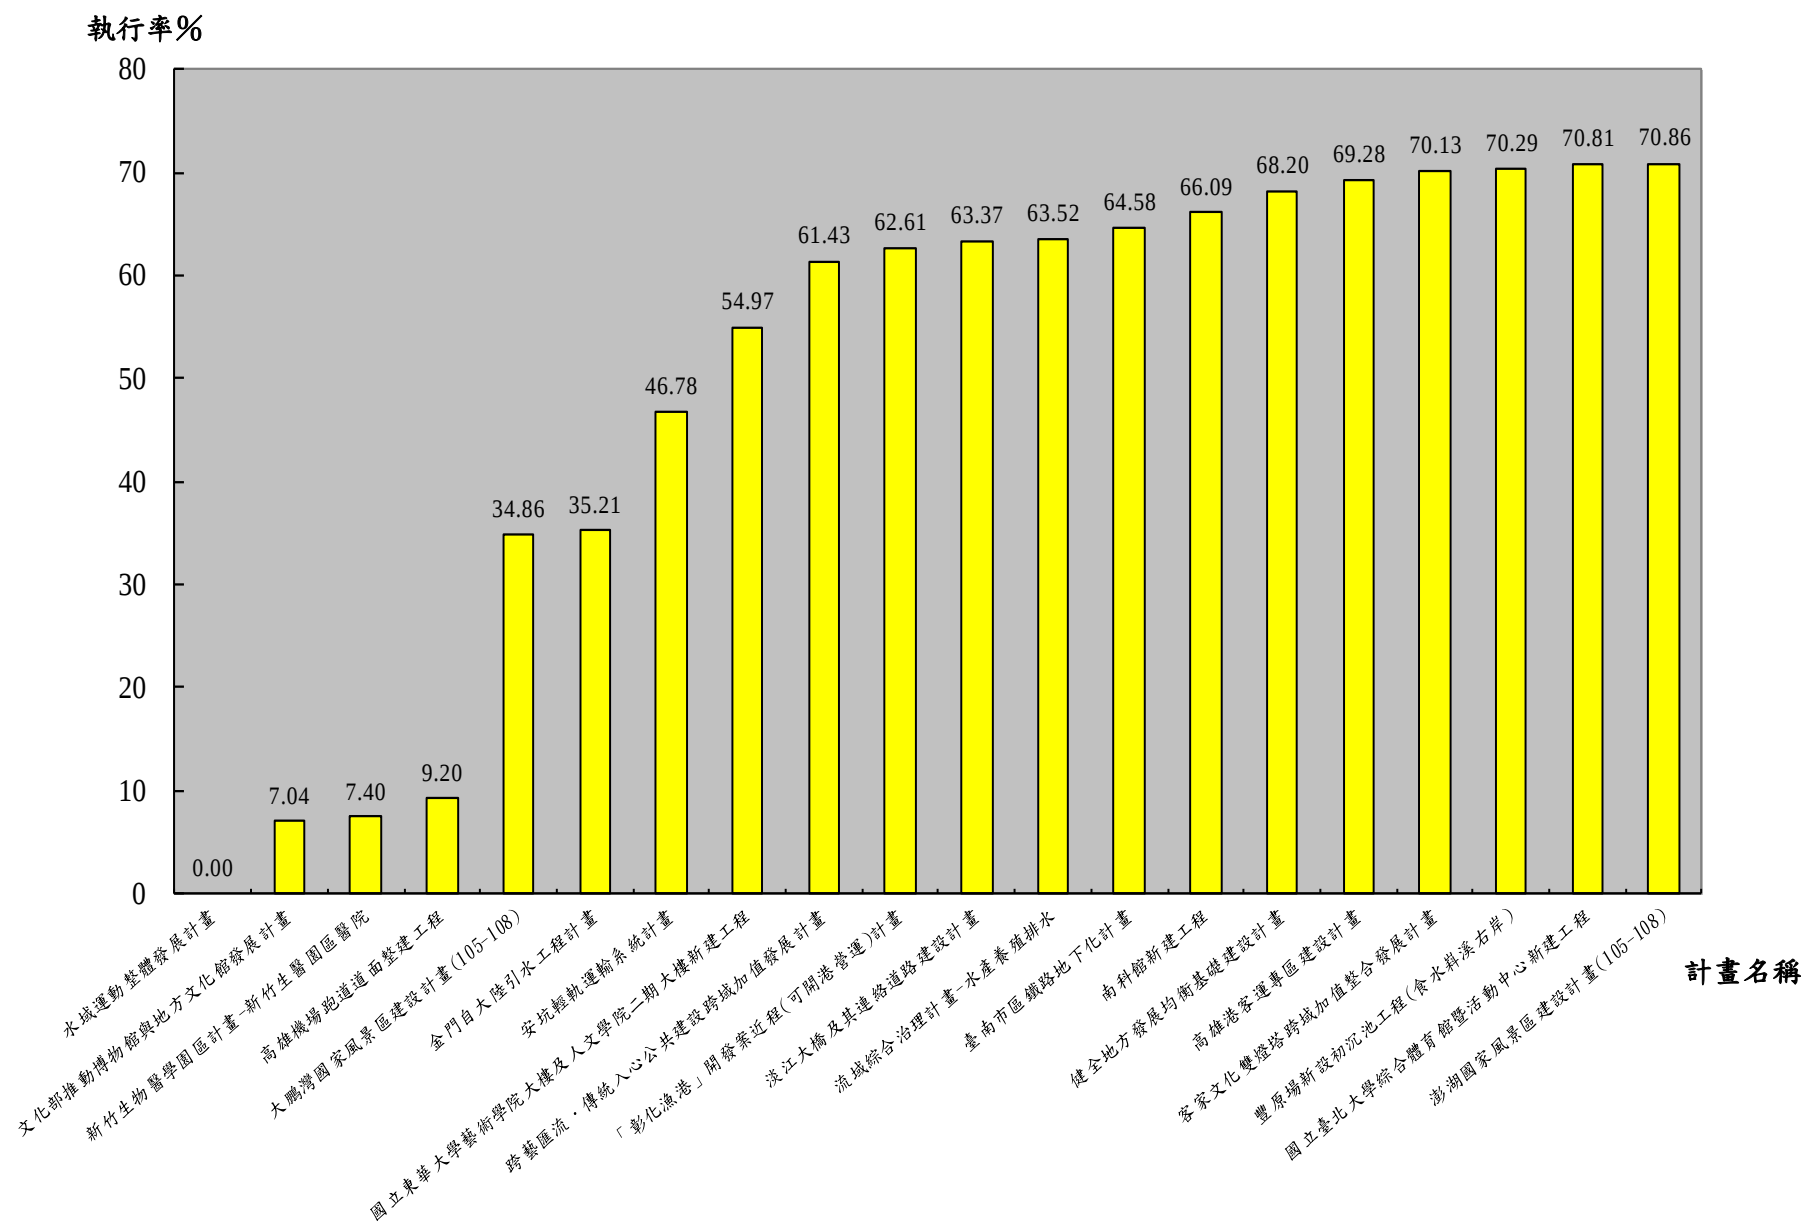

資料截止日期：民國 105 年 6 月 30 日

附表2

民國105年度行政院工程會列管1億元以上公共建設計畫
年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表

民國105年1月1日至6月30日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
1	教育部	教育部體育署	水域運動整體發展計畫	10501-10812	1,400,000	350,000	12,000	0	0.00	12,000	0	0.00	因計畫尚未奉行政院核定所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	教育部	教育部體育署	2017臺北世界大學運動會場館興整建計畫	10210-10612	4,910,427	1,098,352	589,744	0	0.00	2,317,184	1,727,440	74.55	因預算遭立法院凍結所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
3	教育部	國立臺北商業技術學院	平鎮校區圖書行政、第一學生宿舍、教學大樓	09809-10312	1,095,528	8,494	3,830	0	0.00	1,087,864	1,084,034	99.65	因公共藝術設置作業延遲所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
4	教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院	新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院	10205-10712	5,498,289	882,200	181,498	1,795	0.99	390,060	28,859	7.40	因臺大醫院刻正就醫院功能定位、預算來源等辦理計畫修正，相關細部設計作業均暫緩執行，致計畫執行進度落後。	業就該案落後情形派員辦理調查。
5	教育部	國立東華大學	國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程	09708-10112	792,754	361,404	113,528	5,199	4.58	791,107	434,892	54.97	因承商出工人數不足及材料設備進場延遲所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
6	教育部	國立臺北大學	國立臺北大學綜合體育館暨活動中心新建工程	09902-10510	680,000	246,350	6,000	354	5.90	19,840	14,049	70.81	因工程發包多次流標所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
7	文化部	文化部	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	10501-11012	2,252,000	299,829	16,628	1,170	7.04	16,628	1,170	7.04	因年度計畫審查時程延遲所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
8	交通部	中華郵政股份有限公司	郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	10301-10912	22,118,223	2,507,471	23,091	2,408	10.43	5,346,834	5,007,151	93.65	因公共設施、物流中心、北臺灣郵件作業中心委託技術服務案各項使用需求及採購程序延遲所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
9	交通部	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	10401-10912	74,689,000	500,000	150,000	21,915	14.61	150,000	300,913	200.61	因廠商提送之服務實施計畫書尚未核定，無法支付第1期服務費所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
10	交通部	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司	高雄港客運高專區建設計畫	09901-10612	4,517,000	494,692	155,000	23,553	15.20	1,503,922	1,041,934	69.28	因辦理基地內油污染土壤之檢測及外運，致建築主體工程進度落後。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關交通部查明處理，並報告監察院。
11	交通部	新北市政府(交通部補助單位)	安坑輕軌運輸系統計畫	10406-11212	16,632,117	1,414,378	376,685	130,206	34.57	463,103	216,624	46.78	因統包商尚未請領第1期款所致。	業就該案落後情形函請交通部督促新北市政府積極處理。
12	交通部	交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處	大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108)	10501-10812	1,665,000	471,300	106,197	37,015	34.86	106,197	37,015	34.86	因小琉球杉福生態廊道景觀改善及山豬溝遊憩設施整建工程多次流標所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
13	交通部	金門縣政府(交通部補助單位)	金門大橋建設計畫	09912-10706	7,384,666	2,785,203	1,085,030	383,484	35.34	3,638,359	2,656,640	73.02	因承商違約，代辦機關交通部台灣區國道新建工程局於105年6月29日終止契約所致。	業就該案落後情形函請交通部督促金門縣政府積極處理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
14	農業委員會	農業委員會	改善政府動物管制收容設施計畫	10301-10712	1,231,800	340,238	99,532	43,581	43.79	231,489	175,538	75.83	因工程發包多次流標所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
15	文化部	國立臺灣史前文化博物館	南科館新建工程	09702-10512	1,500,000	910,564	319,940	144,929	45.30	974,092	643,803	66.09	因鋼構廠製作業進度落後所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
16	文化部	國立傳統藝術中心	跨藝匯流·傳統入心公共建設跨域增值發展計畫	10401-10912	3,457,800	1,048,066	266,675	125,097	46.91	366,674	225,260	61.43	因部分工程屬歷史建築，受文化資產審議程序影響。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。
17	交通部	新北市政府(交通部補助單位)	淡海輕軌運輸系統計畫	10202-11412	15,305,599	3,129,031	802,458	398,887	49.71	3,005,654	2,597,614	86.42	因部分私有土地協議價購作業辦理中，尚未撥付款項所致。	業就該案落後情形函請交通部督促新北市政府積極處理。
18	交通部	交通部公路總局	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	10301-10912	15,430,000	708,347	420,461	230,184	54.75	790,713	501,089	63.37	因用地都市計畫變更尚未通過，影響後續用地取得發價作業所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
19	農業委員會	農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處	農業生物科技園區擴充	10301-10612	3,517,000	693,160	14,889	8,371	56.22	72,083	65,565	90.96	因土地開發計畫尚未審查通過所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
20	交通部	交通部鐵路改建工程局	臺南市區鐵路地下化計畫	09809-10605	29,360,000	806,646	156,528	97,579	62.34	1,376,100	888,704	64.58	因北區、東區都市計畫變更作業遭民眾強烈抗爭，影響用地取得作業所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
21	教育部	教育部及國民教育署	國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫	10201-10512	8,000,000	2,282,600	1,050,000	665,762	63.41	6,627,400	6,383,162	96.31	因地方政府尚未辦理請款作業所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
22	內政部	內政部	健全地方發展均衡基礎建設計畫	10201-10712	2,000,000	778,816	150,270	98,639	65.64	1,310,679	893,895	68.20	因地方政府辦理規劃設計、工程發包及施工進度較緩慢，無法如期撥付經費，致預算執行落後。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
23	經濟部	經濟部國際貿易局	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	09707-10708	7,266,400	4,584,541	1,352,013	930,043	68.79	4,869,775	3,569,440	73.30	因承商出工人力不足及施工界面複雜，致計畫執行進度與經費支用落後。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關經濟部查明處理，並報告監察院。
24	教育部	教育部體育署	改善國民運動環境計畫	09901-10412	11,660,000	1,883,268	228,714	160,359	70.11	8,834,800	7,732,638	87.52	因都市計畫審議程序較長，影響工程發包時程所致。	業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。
25	客家委員會	客家委員會客家發展中心	客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫	10501-10912	504,700	139,769	29,780	20,885	70.13	29,780	20,885	70.13	因六堆園區污水管線改善案尚需辦理可行性評估作業，及苗栗園區遊客服務中心室內裝修工程承商尚未依約提出擔保，無法撥付預付款所致。	業就該案落後情形函請客家委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
26	交通部	交通部觀光局澎湖國家風景區管理處	澎湖國家風景區建設計畫(105-108)	10501-10812	800,000	198,000	98,017	69,459	70.86	98,017	69,459	70.86	因桶盤浮動碼頭及周邊環境改善工程案流標所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
27	農業委員會	農業委員會漁業署	「彰化漁港」開發案近程(可開港營運)計畫	10401-10612	1,441,800	330,415	132,166	94,281	71.34	159,549	99,898	62.61	因工程基本設計圖說審查時程較長所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。
28	經濟部	水利署	蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年)	10101-10512	1,000,000	223,574	92,863	66,508	71.62	561,502	528,359	94.10	因招標作業延遲及清淤工作受水庫高水位影響，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
29	交通部	交通部觀光局茂林國家風景區管理處	茂林國家風景區建設計畫(105-108)	10501-10812	944,000	240,000	110,160	79,230	71.92	110,160	79,230	71.92	因委辦開發計畫內容尚在辦理中所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
30	內政部	內政部營建署城鄉發展分署	國家重要濕地保育計畫	10001-10512	752,200	194,390	36,175	26,365	72.88	340,256	330,447	97.12	因委辦地方政府經營管理國際級及國家級重要濕地事宜，部分地方政府尚未同意簽約，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
31	交通部	交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處	西拉雅國家風景區建設計畫(105-108)	10501-10512	600,000	150,000	37,010	27,053	73.10	37,010	27,053	73.10	因部分工程請款程序尚未完成所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
32	交通部	交通部高速公路工程局	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	09206-10612	113,849,794	10,140,845	4,906,547	3,616,838	73.71	99,408,598	98,004,656	98.59	因平均速率、行車時間及班距等尚未達到合約要求，致使系統整合測試未能如期完成。	業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關交通部查明處理，並報告監察院。
33	交通部	高雄市政府(交通部補助單位)	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	09201-10912	16,537,000	3,231,698	1,735,011	1,285,071	74.07	7,542,936	6,257,380	82.96	因統包商成員自身財務問題，影響分包商出工意願所致。	業就該案落後情形函請交通部督促高雄市政府積極處理。
34	內政部	內政部營建署	國家公園永續發展計畫(105-108)	10501-10812	807,551	169,339	37,348	27,759	74.33	37,348	27,759	74.33	因部分工程簽辦奉核期程較原定期程落後等，致整體進度落後。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
35	文化部	國立傳統藝術中心	國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫	09701-10512	1,660,651	400,338	259,827	196,161	75.50	1,520,010	1,382,256	90.94	因主體工程承商久未完成各工項缺失改善所致。	業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額(1)	可支用預算數(2)	累計分配數(3)	累計執行數(4)	執行率(%) (4/3)	總累計預定支用數(5)	總累計實際執行數(6)	總累計執行率(%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
36	交通部	臺灣港務股份有限公司	高雄港及安平港區碼頭及相關設施整建工程計畫	10201-10712	7,101,043	1,143,138	183,839	141,267	76.84	2,139,209	2,096,637	98.01	因69KV變電站工程預算支應方式尚有疑慮，未能如期上網公告招標所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
37	交通部	交通部公路總局	東西向快速公路健全路網改善計畫	09801-10512	21,630,200	835,083	350,808	272,833	77.77	19,200,569	19,120,396	99.58	因承商施工機具、人員不足，及工作面未妥善規劃，致工程進度落後。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
38	內政部	墾丁國家公園管理處	墾丁國家公園計畫	10501-10812	933,621	290,693	84,670	66,374	78.39	84,670	66,374	78.39	因全球資訊網重新建置案，廠商對機關要求內容有疑義，建置進度緩慢所致。	業就該案落後情形函請內政部研謀因應措施，並督促積極辦理。
39	國立故宮博物院	國立故宮博物院	故宮南部院區籌建	09201-10512	7,929,059	1,424,178	927,443	736,355	79.40	7,407,733	7,201,062	97.21	因工程變更設計追加費用較原需求減少所致。	業就該案落後情形賡續注意國立故宮博物院後續辦理情形。
40	交通部	臺灣港務股份有限公司	臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫	10101-10512	5,927,000	1,520,000	621,000	631,049	101.62	5,028,000	3,879,051	77.15	因承商人力不足，及海象及天候等因素影響，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
41	交通部	交通部民用航空局	中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	10301-10512	300,800	266,818	31,897	33,256	104.26	78,314	61,270	78.24	因區外排水工程落後所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
42	經濟部	水利署	金門自大陸引水工程計畫	10308-10512	1,350,000	774,070	224,500	246,307	109.71	719,377	253,275	35.21	因與陸方簽訂購水契約作業延遲，影響後續統包工程設計作業期程，致預算執行落後。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。
43	農業委員會	農業委員會漁業署	流域綜合治理計畫-水產養殖排水	10306-10812	2,550,000	901,624	229,306	252,592	110.15	482,800	306,653	63.52	因部分工程設計審查作業延遲及發包流標所致。	業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫經費總額 (1)	可支用預算數 (2)	累計分配數 (3)	累計執行數 (4)	執行率 (%) (4/3)	總累計預定支用數 (5)	總累計實際執行數 (6)	總累計執行率 (%) (6/5)	落後原因	審計部處理情形
44	交通部	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場跑道道面整建工程	10301-10512	975,010	962,348	7,500	8,401	112.01	228,890	21,063	9.20	因設計作業完成時程延遲所致。	業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
45	原住民族委員會	原住民族委員會	原住民族部落特色道路改善計畫	10301-10612	2,713,500	447,004	70,000	81,033	115.76	1,293,920	1,005,564	77.71	因計畫遲至103年8月始經行政院核定，致總累計執行率不佳。	業就落後情形督促原住民族委員會檢討改進。
46	經濟部	台灣自來水股份有限公司	豐原場新設初沉池工程(食水料溪右岸)	10101-10512	798,574	527,332	25,000	29,267	117.07	427,066	300,193	70.29	因都市計畫變更期程冗長，及計畫取水口審核作業延遲，致執行進度落後。	業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。

註： 1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國105年度核列預算數。

3. 總累計預定支用數係指從計畫開始至當季止之累計分配數。
