

## 民國 108 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫預算執行情形

民國 108 年度行政院工程會列管 5 千萬元<sup>1</sup>以上公共建設計畫計 222 項，分屬 15 個主管機關<sup>2</sup>，可支用預算數 3,364 億餘元，截至第 1 季止，累計分配預算數 534 億餘元，累計執行數 576 億餘元，執行率 107.92%，其中國立故宮博物院及文化部執行率未達 80%；各項計畫年度執行率未達 80%者，有 30 項計畫；總累計執行率未達 80%者，有 10 項計畫。各主管機關執行情形等詳細資料<sup>3</sup>列示如後。

- 各主管機關預算執行情形統計表（[附表1](#)）
- 各主管機關預算執行情形統計圖（[附圖1](#)）
- 年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表（[附表2](#)）
- 年度預算執行率最低之20項計畫明細圖（[附圖2](#)）
- 整體計畫總累計預算執行率未達80%計畫明細圖（[附圖3](#)）

<sup>1</sup>行政院工程會自民國 107 年度起列管重大公共建設計畫門檻由原本的 1 億元下修至 5 千萬元。

<sup>2</sup>係指計畫主管機關，以下同。

<sup>3</sup>各項執行情形係依據行政院工程會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就預算執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

## 民國 108 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計表

民國 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：百萬元

| 排序  | 主管機關         | 列管<br>計畫<br>項數 | 可支用<br>預算數<br>(1) | 累計<br>分配數<br>(2) | 累計<br>支用數<br>(3) | 累計<br>應付未付數<br>(4) | 累計<br>結餘數<br>(5) | 累計<br>預付數<br>(6) | 累計<br>執行數<br>(7)=(3)+(4)+(5)+(6) | 執行率<br>(%)<br>(7)/(2)×100 |
|-----|--------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 合 計 |              | 222            | 336,426           | 53,428           | 36,758           | 16,962             | 1                | 3,939            | 57,662                           | 107.92                    |
| 1   | 國立故宮博物院      | 1              | 1,104             | 95               | 25               | -                  | -                | 21               | 46                               | 48.63                     |
| 2   | 文化部          | 13             | 10,105            | 2,263            | 520              | 1,149              | -                | 113              | 1,782                            | 78.77                     |
| 3   | 國防部          | 1              | 1,659             | 330              | 210              | 92                 | -                | -                | 302                              | 91.69                     |
| 4   | 客家委員會        | 2              | 777               | 139              | 127              | 1                  | -                | -                | 129                              | 92.78                     |
| 5   | 環境保護署        | 5              | 2,884             | 223              | 162              | 49                 | -                | -                | 211                              | 94.70                     |
| 6   | 衛生福利部        | 3              | 482               | 9                | 9                | -                  | -                | -                | 9                                | 98.62                     |
| 7   | 內政部          | 6              | 24,889            | 3,773            | 3,782            | 69                 | 1                | 22               | 3,875                            | 102.70                    |
| 8   | 交通部          | 72             | 138,057           | 22,071           | 14,248           | 4,844              | 0                | 3,628            | 22,721                           | 102.95                    |
| 9   | 農業委員會        | 20             | 25,544            | 5,096            | 4,098            | 1,452              | -                | -                | 5,551                            | 108.92                    |
| 10  | 經濟部          | 53             | 108,208           | 17,573           | 11,350           | 8,882              | -                | 2                | 20,235                           | 115.15                    |
| 11  | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 7              | 1,462             | 93               | 66               | 60                 | -                | -                | 127                              | 136.91                    |
| 12  | 教育部          | 30             | 14,566            | 1,246            | 1,646            | 59                 | -                | -                | 1,706                            | 136.91                    |
| 13  | 科技部          | 6              | 5,571             | 424              | 430              | 85                 | -                | 152              | 668                              | 157.61                    |
| 14  | 海洋委員會        | 1              | 366               | 59               | 51               | 120                | -                | -                | 172                              | 292.10                    |
| 15  | 原住民族委員會      | 2              | 744               | 30               | 27               | 93                 | 0                | -                | 121                              | 404.85                    |

註：1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。


2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國 108 年度核列預算數，接續之累計分配數、累計執行數等，均係以該可支用預算數進行分配及執行結果。

3. 累計執行數包含累計支用數、已執行之應付未付數、結餘數及預付數。

附圖 1

民國 108 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖

民國 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

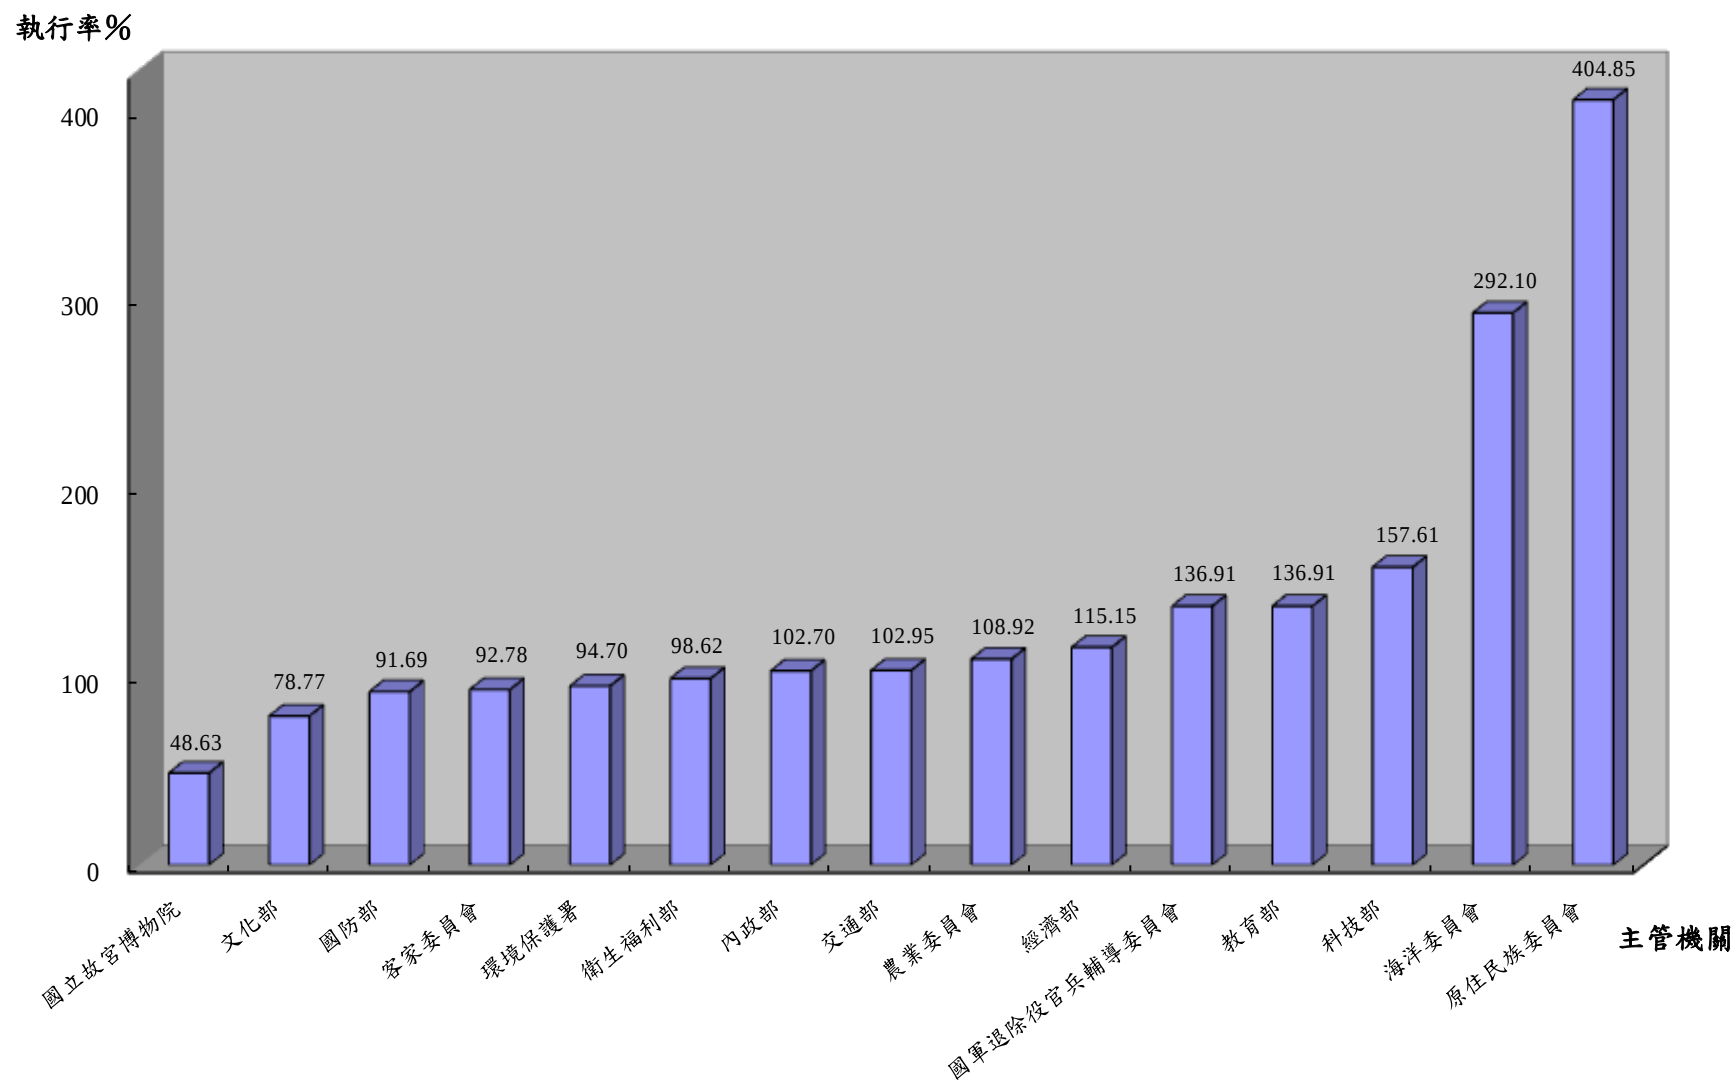

附表2

**監督民國108年度行政院工程會列管5千萬元以上公共建設計畫  
年度預算執行率或總累計執行率未達80%計畫執行情形表**

民國108年1月1日至3月31日

單位：千元

| 排序 | 主管機關  | 主辦機關           | 計畫名稱                            | 計畫期程        | 計畫經費總額(1) | 可支用預算數(2) | 累計分配數(3) | 累計執行數(4) | 執行率(%)<br>(4)/(3)×100 | 總累計預定支用數(5) | 總累計實際執行數(6) | 總累計執行率(%)<br>(6)/(5)×100 | 落後原因                                              | 審計部處理情形                        |
|----|-------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 環境保護署 | 環境保護署          | 優質公廁及美質環境推動計畫(108-113年)         | 10801-11312 | 6,250,000 | 532,585   | 10,874   | 0        | 0.00                  | 10,874      | 0           | 0.00                     | 因補助計畫遲至108年3月始核定所致。                               | 業就該案落後情形函請環境保護署研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 2  | 交通部   | 臺東縣政府(交通部補助單位) | 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫               | 10501-10912 | 717,030   | 400,060   | 22,000   | 0        | 0.00                  | 48,752      | 26,752      | 54.87                    | 工程原訂於106年12月完成招標作業，因106年12月22日至107年11月20日間流標6次所致。 | 業就該案落後情形函請交通部督促臺東縣政府積極處理。      |
| 3  | 經濟部   | 經濟部國際貿易局       | 興建桃園會展中心                        | 10601-11406 | 4,114,110 | 1,473     | 9        | 0        | 0.00                  | 3,830       | 3,821       | 99.77                    | 因計畫核定作業延遲所致。                                      | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。   |
| 4  | 教育部   | 教育部            | 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫            | 10701-11012 | 4,278,327 | 134,698   | 47,000   | 14       | 0.03                  | 87,000      | 38,634      | 44.41                    | 因用地取得延誤所致。                                        | 業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。   |
| 5  | 教育部   | 教育部            | 國立臺北大學三峽校區「音律電機資訊大樓興建工程」        | 10612-10812 | 49,838    | 48,753    | 10,000   | 8        | 0.08                  | 48,753      | 8           | 0.02                     | 因主體工程施工進度延誤所致。                                    | 業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。   |
| 6  | 交通部   | 交通部民用航空局       | 臺北國際航空站第2航廈結構補強工程暨火警及廣播監控系統改善工程 | 10501-11012 | 322,279   | 196,313   | 12,000   | 14       | 0.12                  | 19,495      | 7,509       | 38.52                    | 因航廈特種建築物防災計畫變更審查費時所致。                             | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。   |
| 7  | 經濟部   | 台灣電力股份有限公司     | 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫               | 09907-11112 | 9,591,875 | 651,283   | 10,122   | 116      | 1.15                  | 168,005     | 157,999     | 94.04                    | 因計畫修正案經濟部尚未核定所致。                                  | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。   |

| 排序 | 主管機關 | 主辦機關          | 計畫名稱                          | 計畫期程        | 計畫經費總額(1)   | 可支用預算數(2) | 累計分配數(3) | 累計執行數(4) | 執行率(%)<br>(4)/(3)×100 | 總累計預定支用數(5) | 總累計實際執行數(6) | 總累計執行率(%)<br>(6)/(5)×100 | 落後原因                             | 審計部處理情形                                                      |
|----|------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8  | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司    | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫         | 10707-11006 | 710,592     | 131,618   | 90,256   | 2,471    | 2.74                  | 90,562      | 2,777       | 3.07                     | 因承商提供預付款還款保證資料延遲所致。              | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                                 |
| 9  | 經濟部  | 台灣中油股份有限公司    | (L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 10507-10912 | 5,192,041   | 1,941,998 | 386,429  | 21,702   | 5.62                  | 1,184,493   | 819,766     | 69.21                    | 因計畫項下「陸管工程」招標流標所致。               | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                                 |
| 10 | 文化部  | 國家人權博物館       | 國家人權博物館中程計畫                   | 10501-11012 | 2,201,900   | 161,530   | 11,686   | 1,485    | 12.71                 | 385,486     | 375,285     | 97.35                    | 因規劃作業延誤所致。                       | 業就該案落後情形函請文化部研謀因應措施，並督促積極辦理。                                 |
| 11 | 交通部  | 臺灣港務股份有限公司    | 高雄港客運專區建設計畫                   | 09901-10812 | 4,517,000   | 1,996,683 | 112,000  | 18,434   | 16.46                 | 2,632,317   | 2,538,751   | 96.45                    | 因承商施工機具、材料不足所致。                  | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                                 |
| 12 | 交通部  | 中華郵政公司        | 購建郵政局所計畫                      | 10601-10912 | 9,941,492   | 990,140   | 331,203  | 63,208   | 19.08                 | 7,095,128   | 6,827,133   | 96.22                    | 因鋼筋施工品質缺失改善延遲所致。                 | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                                 |
| 13 | 交通部  | 臺北市府(交通部補助單位) | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線         | 08807-10805 | 167,690,000 | 4,590,049 | 267,398  | 86,517   | 32.36                 | 142,657,836 | 142,476,955 | 99.87                    | 因受鄰標其他工程及變更設計影響所致。               | 業就該案落後情形函請交通部督促臺北市政府積極處理。                                    |
| 14 | 經濟部  | 經濟部國際貿易局      | 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)             | 09707-10812 | 7,266,400   | 116,826   | 14,328   | 4,700    | 32.80                 | 7,163,902   | 7,154,274   | 99.87                    | 因各工程標案尚有契約變更程序尚未完成，無法辦理總驗收作業等所致。 | 業就執行情形辦理專案調查，核有未盡職責及效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關經濟部查明處理，並報告監察院。 |
| 15 | 文化部  | 文化部           | 海洋文化及流行音樂中心計畫                 | 09810-10812 | 6,956,441   | 2,259,757 | 734,728  | 309,464  | 42.12                 | 6,129,722   | 5,704,458   | 93.06                    | 因代辦機關請領款項尚未完成審核撥付所致。             | 業就該案落後情形派員辦理調查，調查結果已繕發審核通知請文化部檢討改進。                          |

| 排序 | 主管機關    | 主辦機關        | 計畫名稱                                    | 計畫期程        | 計畫經費總額(1) | 可支用預算數(2) | 累計分配數(3) | 累計執行數(4) | 執行率(%)<br>(4)/(3)×100 | 總累計預定支用數(5) | 總累計實際執行數(6) | 總累計執行率(%)<br>(6)/(5)×100 | 落後原因                                      | 審計部處理情形                                                 |
|----|---------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16 | 農業委員會   | 農業委員會農糧署    | 大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)               | 10601-10912 | 1,007,483 | 455,695   | 2,500    | 1,146    | 45.84                 | 114,288     | 112,934     | 98.82                    | 因用地取得及招標作業延誤等所致。                          | 業就該案落後情形函請農業委員會研謀因應措施，並督促積極辦理。                          |
| 17 | 國立故宮博物院 | 國立故宮博物院     | 新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫                   | 10701-11212 | 9,130,000 | 1,104,783 | 95,326   | 46,353   | 48.63                 | 248,680     | 199,707     | 80.31                    | 因規劃作業延誤所致。                                | 業就該案落後情形派員辦理調查，調查結果已繕發審核通知請國立故宮博物院檢討改進。                 |
| 18 | 文化部     | 國立傳統藝術中心    | 跨藝匯流·傳統入心-公共建設跨域加值發展計畫                  | 10401-10912 | 2,691,556 | 461,094   | 158,428  | 79,054   | 49.90                 | 1,574,332   | 1,476,326   | 93.77                    | 因中山堂商業區新建工程於106年12月至107年7月間招標流標5次所致。      | 業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關文化部查明處理，並報告監察院。 |
| 19 | 交通部     | 交通部觀光局      | 東部海岸國家風景區建設計畫                           | 10501-10812 | 920,000   | 188,200   | 31,600   | 15,860   | 50.19                 | 669,600     | 653,860     | 97.65                    | 因規劃設計作業延誤所致。                              | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 20 | 衛生福利部   | 衛生福利部       | 樂生園區整體發展計畫                              | 10601-11012 | 1,073,334 | 311,714   | 279      | 151      | 54.12                 | 58,151      | 58,023      | 99.78                    | 因受限文化資產保存法規定，修復計畫及規劃設計成果均須先送地方文化主管機關審議所致。 | 業就該案落後情形派員辦理調查中。                                        |
| 21 | 經濟部     | 經濟部加工出口區管理處 | 楠梓加工出口區揚水站改善工程                          | 10602-10812 | 89,500    | 87,831    | 3,860    | 2,244    | 58.13                 | 5,529       | 3,913       | 70.77                    | 因承商未依趕工計畫所載人力及機具進場所致。                     | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |
| 22 | 教育部     | 教育部國民及學前教育署 | 國立高級中等學校校務基金-師大附中體育教學館(教學游泳池)興建工程等14項工程 | 10401-10912 | 1,517,437 | 576,340   | 89,075   | 55,978   | 62.84                 | 1,392,583   | 866,430     | 62.22                    | 因工程多次流標、發生工程履約爭議，及申請建造執照時程延誤等所致。          | 業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。                            |

| 排序 | 主管機關 | 主辦機關       | 計畫名稱                                | 計畫期程        | 計畫經費總額<br>(1) | 可支用預算數<br>(2) | 累計分配數<br>(3) | 累計執行數<br>(4) | 執行率<br>(%)<br>(4)/(3)×100 | 總累計預定支用數<br>(5) | 總累計實際執行數<br>(6) | 總累計執行率<br>(%)<br>(6)/(5)×100 | 落後原因                                             | 審計部處理情形                      |
|----|------|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 23 | 經濟部  | 台灣電力股份有限公司 | 澎湖低碳島風力發電計畫                         | 10201-10906 | 2,754,960     | 767,464       | 323,144      | 213,635      | 66.11                     | 1,830,270       | 1,720,761       | 94.02                        | 因辦理第2次契約變更，新增之租用置放風機倉儲費用無法支付所致。                  | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 24 | 交通部  | 臺灣港務股份有限公司 | 高雄港洲際貨櫃中心第2期工程計畫                    | 10003-10812 | 26,898,168    | 3,454,000     | 420,723      | 279,937      | 66.54                     | 23,864,891      | 23,724,105      | 99.41                        | 因承商未及時辦理估驗計價所致。                                  | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 25 | 經濟部  | 經濟部國際貿易局   | 興建大臺南會展中心                           | 10601-11012 | 2,002,460     | 932,916       | 39,845       | 26,961       | 67.66                     | 96,856          | 83,972          | 86.70                        | 因臺南市政府辦理經費核銷作業延遲所致。                              | 業就該案落後情形函請經濟部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 26 | 科技部  | 科技部        | 國家海洋科技能量建置計畫                        | 10401-10812 | 3,125,044     | 1,527,777     | 720          | 513          | 71.25                     | 1,597,987       | 1,557,837       | 97.49                        | 因500總噸級研究船測試人力調配，造成靜態檢查測試延遲等所致。                  | 業就該案落後情形派員辦理調查中。             |
| 27 | 交通部  | 交通部觀光局     | 參山國家風景區建設計畫                         | 10501-10812 | 720,000       | 143,200       | 20,790       | 15,232       | 73.27                     | 579,790         | 574,232         | 99.04                        | 因吊橋工程基座施工品質缺失改善延遲。                               | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 28 | 交通部  | 交通部鐵道局     | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 | 09904-11807 | 13,800,000    | 1,153,426     | 906,702      | 668,682      | 73.75                     | 5,876,991       | 5,638,971       | 95.95                        | 工程原訂於107年12月底完成招標作業，因107年10月19日至108年1月2日間流標4次所致。 | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 29 | 交通部  | 交通部公路總局    | 台9線蘇花公路山區路段改善計畫                     | 09912-10912 | 52,884,000    | 7,205,578     | 1,592,315    | 1,175,505    | 73.82                     | 44,963,867      | 44,547,057      | 99.07                        | 因受變更設計影響所致。                                      | 業就該案落後情形函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |
| 30 | 教育部  | 教育部        | 國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程                | 10704-10903 | 149,059       | 59,027        | 8,761        | 6,478        | 73.94                     | 12,324          | 9,716           | 78.84                        | 因辦理建造執照變更時程延誤所致。                                 | 業就該案落後情形函請教育部研謀因應措施，並督促積極辦理。 |


註：1. 本表係按執行率由最低至最高之順序排列。

2. 可支用預算數包含以前年度未執行奉准保留之預算及民國107年度核列預算數。

3. 總累計預定支用數係指從計畫開始至當季止之累計分配數。

# 民國 108 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 年度預算執行率最低之 20 項計畫明細圖

民國 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

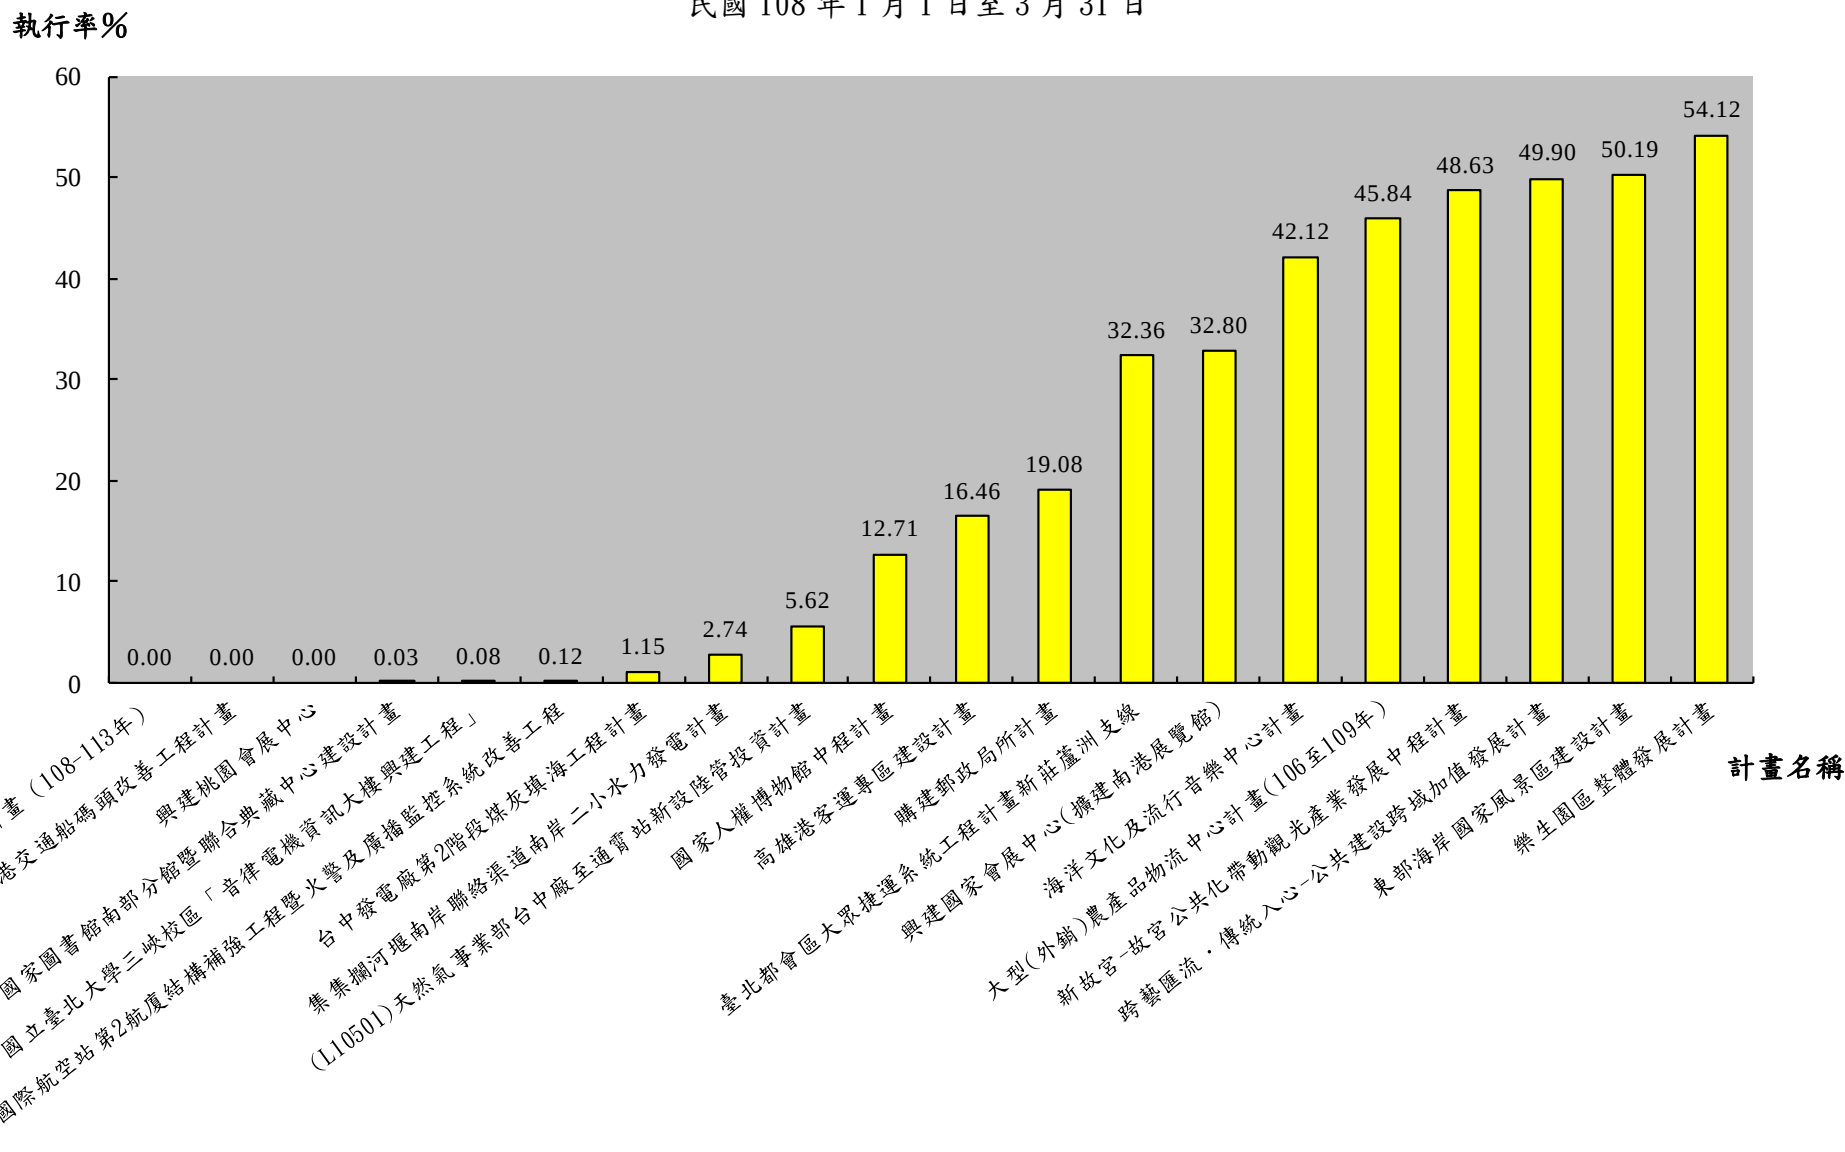

附圖 3

# 民國 108 年度行政院工程會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 整體計畫總累計預算執行率未達 80%計畫明細圖

民國 107 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

