


彰化市草子埔垃圾衛生掩埋場封閉復育工程施工工期延宕，場區垃圾遭風災沖刷至場外，造成環境污染，經審計機關促請研謀改善，已順利完成復育工作，改善環境品質

審計部臺灣省彰化縣審計室(下稱彰化縣審計室)查核發現，彰化縣彰化市公所辦理彰化市草子埔垃圾衛生掩埋場封閉復育工程，因施工期間未排除施工障礙致工期延宕，場區垃圾遭風災沖刷至場外，造成環境污染，經函請研謀改善，該公所已順利完成復育工作，改善環境品質。

彰化縣彰化市公所為解決彰化市垃圾問題，自民國(下同)80年11月於該市南郭段坑子內小段○地號等土地設置掩埋場，場區面積約6.5公頃，於83年6月啟用。嗣因垃圾掩埋量超過設計飽和點，自92年起辦理掩埋場封閉復育工程，經費6,655萬元，原訂於97年2月完工。彰化縣審計

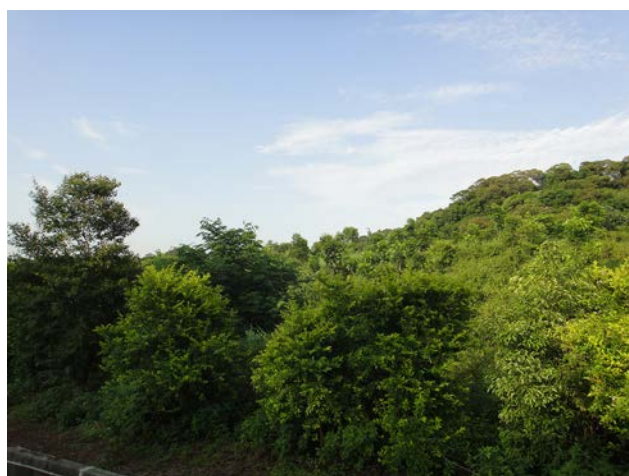

彰化市草子埔垃圾衛生掩埋場復育後景觀
(彰化縣彰化市公所提供)

室查核發現，該公所於施工期間未能積極協助廠商排除地主抗爭等施工障礙致工期延宕，場區垃圾未及時處理，於97年7至9月期間適逢卡玫基等颱風侵襲而沖刷至場外，造成環境污染，經函請該公所研謀改善。

本案經彰化縣審計室追蹤彰化縣彰化市公所改善結果，該公所已協助廠商排除施工障礙並督促趕工，工程於100年11月8日完工，101年3月30日驗收合格，完成復育工作。復經彰化縣審計室追蹤其完工後復育成效，該公所持續維護環境及積極造林植栽，增加綠地面積，有效防止污染問題，並與附近之八卦山風景特定區景觀融合，改善環境品質。
