

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫經費執行情形

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫計 224 項，分屬 18 個主管機關¹，年計畫經費 4,741 億餘元，年累計執行數 4,435 億餘元，年經費執行率 93.54%，各主管機關執行率均達 80% 以上；各項計畫年分配經費執行率未達 80% 者，有 20 項計畫；總分配經費執行率未達 80% 者，有 12 項計畫。各主管機關經費執行情形等詳細資料²列示如後。

- 各主管機關經費執行情形（詳附表1、附圖1）
- 年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形（詳附表2）
- 年分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖2）
- 總分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖3）

¹係指計畫主管機關，以下同。

²各項執行情形係依據公共工程委員會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就經費執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫各主管機關經費執行情形

單位：百萬元、%

排序	主管機關	列管計畫項數	年計畫經費(1)	實現數(2)	已執行應付未付數(3)	節餘數(4)	預付數(5)	年累計執行數(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	年計畫經費執行率(6)/(1)×100
合 計		224	474,179	387,431	45,751	4,065	6,297	443,545	93.54
1	經濟部	53	196,269	143,908	24,805	1,270	1,002	170,986	87.12
2	文化部	12	6,194	4,824	405	215	3	5,448	87.95
3	教育部	16	9,587	8,294	143	-	244	8,682	90.56
4	核能安全委員會	1	199	55	36	-	90	181	91.29
5	衛生福利部	8	3,504	1,842	745	0	634	3,222	91.97
6	客家委員會	2	1,322	1,081	138	11	-	1,232	93.14
7	國防部	7	7,683	6,316	1,078	-	-	7,395	96.25
8	原住民族委員會	3	1,296	923	326	4	-	1,253	96.70
9	國軍退除役官兵輔導委員會	5	3,185	2,491	354	-	250	3,095	97.19
10	農業部	21	36,939	31,003	3,430	923	661	36,018	97.51
11	國家科學及技術委員會	7	22,998	19,713	2,580	205	-	22,500	97.83
12	國立故宮博物院	1	1,518	950	74	0	471	1,497	98.60
13	國家發展委員會	2	1,613	1,190	372	2	27	1,592	98.71
14	交通部	62	132,144	118,526	9,230	267	2,460	130,485	98.74
15	法務部	2	1,237	1,093	127	4	-	1,225	99.02
16	環境部	3	3,686	2,989	570	92	-	3,651	99.07
17	海洋委員會	4	1,207	1,044	163	-	-	1,207	100.00
18	內政部	15	43,589	41,181	1,166	1,067	452	43,868	100.64

註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。


2. 年計畫經費係指全年計畫可支用經費，包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金等。

3. 本表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

附圖 1

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫各主管機關經費執行情形

經費執行率%

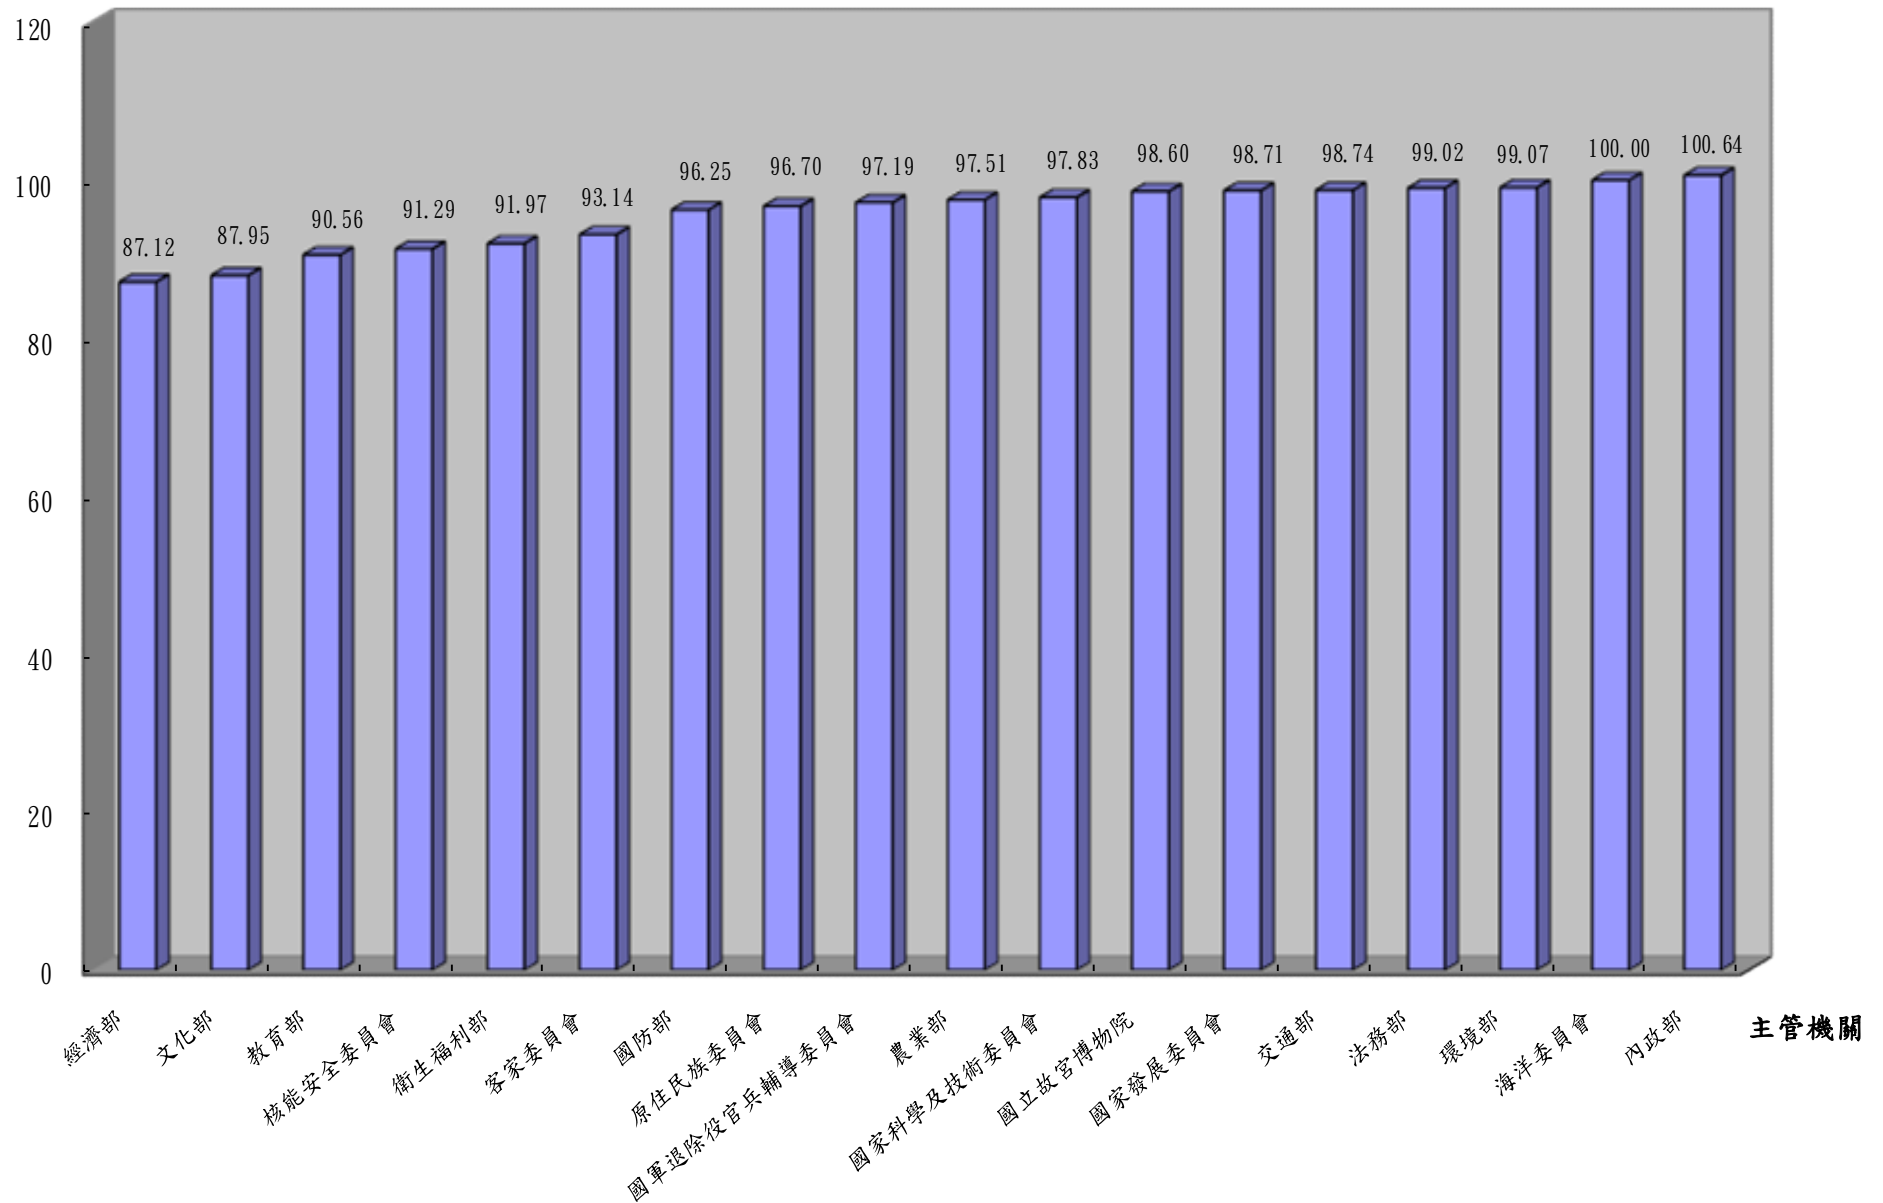

附表2

監督113年度公共工程委員會列管公共建設計畫
年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形

113年1月1日至12月31日


單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
1	交通部	交通部鐵道局	彰化市鐵路高架化建設計畫綜合規劃作業	11001-11412	86,998	行政院	解決彰化市內鐵路交通壅塞，周邊停車秩序紊亂等問題，並重新帶動彰化舊城發展。	10,770	10,770	-	-	49,164	38,394	78.09	因綜合規劃報告尚未完成所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	經濟部	台灣中油股份有限公司	天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	11001-11912	52,185,158	行政院	提升第三接收站LNG卸收、儲存及輪儲能力，增加天然氣供應能量，強化第三接收站輪儲操作、調度及備援能力，降低營運風險。	229,531	229,531	10,248	4.46	241,050	21,767	9.03	因三接計畫外推方案取消外海填區，須重新研擬替代方案，影響進度所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
3	衛生福利部	衛生福利部	衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	11101-11512	1,225,752	行政院	為提升苗栗地區醫療服務品質，減少民眾跨區就醫，滿足在地醫療需求。	136,831	136,831	8,510	6.22	283,081	154,760	54.67	因多次流標所致。	業就該案落後情形派員辦理調查中。
4	經濟部	台灣電力股份有限公司	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	11106-11712	61,212,510	行政院	機組裝置容量達110至140萬瓩；年發電量達77.96億度。	10,328,239	10,328,239	855,355	8.28	10,916,578	1,443,694	13.22	因主要發電設備採購招標作業不如預期，及計畫修正尚未獲行政院同意所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
5	經濟部	台灣電力股份有限公司	通霄電廠第二期更新改建計畫	10808-11912	134,677,061	行政院	投資收回年限20年，現值報酬率2.09%，資金成本率1.59%，淨現值67.74億元。	14,311,330	14,311,330	3,777,108	26.39	18,824,302	8,290,080	44.04	因海底輸氣管線工程等採購招標作業不如預期，及計畫修正尚未獲行政院同意所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
6	文化部	兒童文化館	國家兒童未來館興建計畫	11008-11912	16,494,660	行政院	打造具台灣在地文化特色之兒童沉浸式體驗場域，吸引國內外旅客前往並帶動周邊商機發展。	296,713	296,713	111,317	37.52	533,550	348,154	65.25	因採購策略及分工模式等政策調整，影響113年度預算執行所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
7	教育部	教育部	國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112年至116年）	11201-11612	4,020,517	行政院	推動大學城建置計畫，整修中興新村閒置國有房地空間，以供教學、研究與產學合作之專業學院及研究中心進駐。	1,489,315	1,489,315	592,042	39.75	1,728,000	830,727	48.07	因辦理中興新村文化景觀保存審議、都市計畫用地變更審議及部分案件流標等所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
8	文化部	文化部	國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫	11201-11812	4,510,000	行政院	建置國際水準之典藏空間及環境，讓國家影視及廣播文化資產得完整保存與呈現；吸引文化產業進駐，以活絡產業環境，並帶動地方發展，增加就業機會及周邊土地開發效益。	95,920	95,920	40,929	42.67	105,920	50,929	48.08	因修正計畫所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
9	文化部	文化部	國家漫畫博物館計畫	11301-11812	3,048,287	行政院	建立具徵集、保存、數位典藏、展示及數位內容體驗、加值運用漫畫文物之專責設施，使珍貴之漫畫文物得以保存及推廣，輔以尖端多媒體展示技術加值應用，以原創漫畫作為數位內容核心，提供民眾更深度的數位內容體驗，以利推廣行銷，提高臺灣原創漫畫能見度。	324,440	324,440	171,619	52.90	324,440	171,619	52.90	因修正計畫所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
10	農業部	農業部林業試驗所	國家植物園方舟計畫（第二期）	11201-11512	561,027	行政院	擴大原生特稀有植物之展示教育及資源利用，與地方文化及創生產業進一步結合，促進植物保育工作永續推動。	173,455	173,455	104,777	60.41	214,472	145,794	67.98	因修正計畫及案件流標等所致。	業就農業部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
11	文化部	國立臺灣歷史博物館	「面向國際、展示臺灣」國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫	11301-11812	95,074	行政院	擴充調整現有常設展廳與新建國際展廳，及辦理文化科技體驗展廳前期展示軟硬體配置方案規劃評估、文化科技體驗實驗性展覽等，以打造永續發展之國際級博物館。	95,074	95,074	59,100	62.16	95,074	59,100	62.16	因修正計畫及案件流標等所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
12	交通部	交通部民用航空局	高雄機場滑行道系統改善工程	10901-11512	996,162	行政院	加速機場建設，優化飛航服務效能。	262,605	262,605	163,999	62.45	647,856	549,250	84.78	因廠商人力及機具不足所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
13	文化部	國立歷史博物館	國立歷史博物館升級發展計畫	10405-11612	1,376,828	行政院	藉由規劃國立歷史博物館未來發展方針與定位，發揮整體營運效能，邁向國際知名之國家博物館。	182,280	182,280	123,954	68.00	1,012,415	954,089	94.24	因多次流標所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
14	文化部	國立國父紀念館	國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫	10401-11612	2,213,710	行政院	提升文化藝術與民眾生活教育涵養與品質，達成國際孫學推廣、跨足國內美學萃萃目標，落實打造跨域整合、藝文觀光之生活美學新園區。	331,505	331,505	225,925	68.15	769,254	663,674	86.28	因廠商估設計價延遲所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
15	經濟部	台灣中油股份有限公司	天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫	11301-11712	62,892,807	行政院	提升永安廠運輸能力滿足市場需求；降低既有海管負載率以利進行必要之維修檢測；提升供氣系統韌性及船運之調度彈性。	2,701,000	2,701,000	1,892,103	70.05	2,701,000	1,892,103	70.05	因國外廠商預付款還款保證無法撥付等所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
16	衛生福利部	衛生福利部	樂生園區整體發展計畫	10606-11312	1,073,334	行政院	建立與世界接軌之國家漢生病醫療人權園區，及呈現歷史、人權、生態、社會教育等多面向價值。	356,792	356,792	255,264	71.54	1,073,334	971,806	90.54	因辦理變更設計作業不如預期所致。	業就衛生福利部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
17	經濟部	台灣電力股份有限公司	綠能第一期計畫	11007-11612	9,162,200	經濟部	強化能源安全，落實再生能源配比占20%之願景，創新綠色經濟，促進環境永續及社會公平。	1,808,896	1,808,896	1,334,321	73.76	2,938,885	2,464,310	83.85	因部分計畫場址申請尚未通過審查，影響進度所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
18	經濟部	台灣中油股份有限公司	天然氣事業部台中廠三期投資計畫	10901-11512	34,370,724	行政院	提升台中廠液化天然氣儲存能力，與既有一、二期管線連通互相備援，以確保供氣穩定及安全。	8,822,060	8,822,060	6,539,716	74.13	19,969,141	17,686,797	88.57	因工程請款資料尚在審查中及設備款須待里程碑付款等，影響進度所致。	業就經濟部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
19	國防部	國防部軍醫局	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	10801-11312	1,748,627	行政院	提供鄰近部隊及民眾良好就醫環境，有效整合醫療救災能量，鞏固災防醫療功能等。	892,848	892,848	698,901	78.28	1,748,627	1,554,680	88.91	因天候因素影響外牆泥作施工項目，且出工人數不足，影響執行進度所致。	業就國防部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
20	交通部	交通部	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫	11109-12012	53,311,000	行政院	解決居民長久以來交通壅塞與安全問題，可串聯高雄市區與南北各產業園區，提昇小港、林園地區之發展潛力。	3,637,052	3,637,052	2,887,616	79.39	4,741,644	3,992,208	84.19	因用地尚未取得所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。

附圖 2

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫 年分配經費執行率未達 80%計畫明細

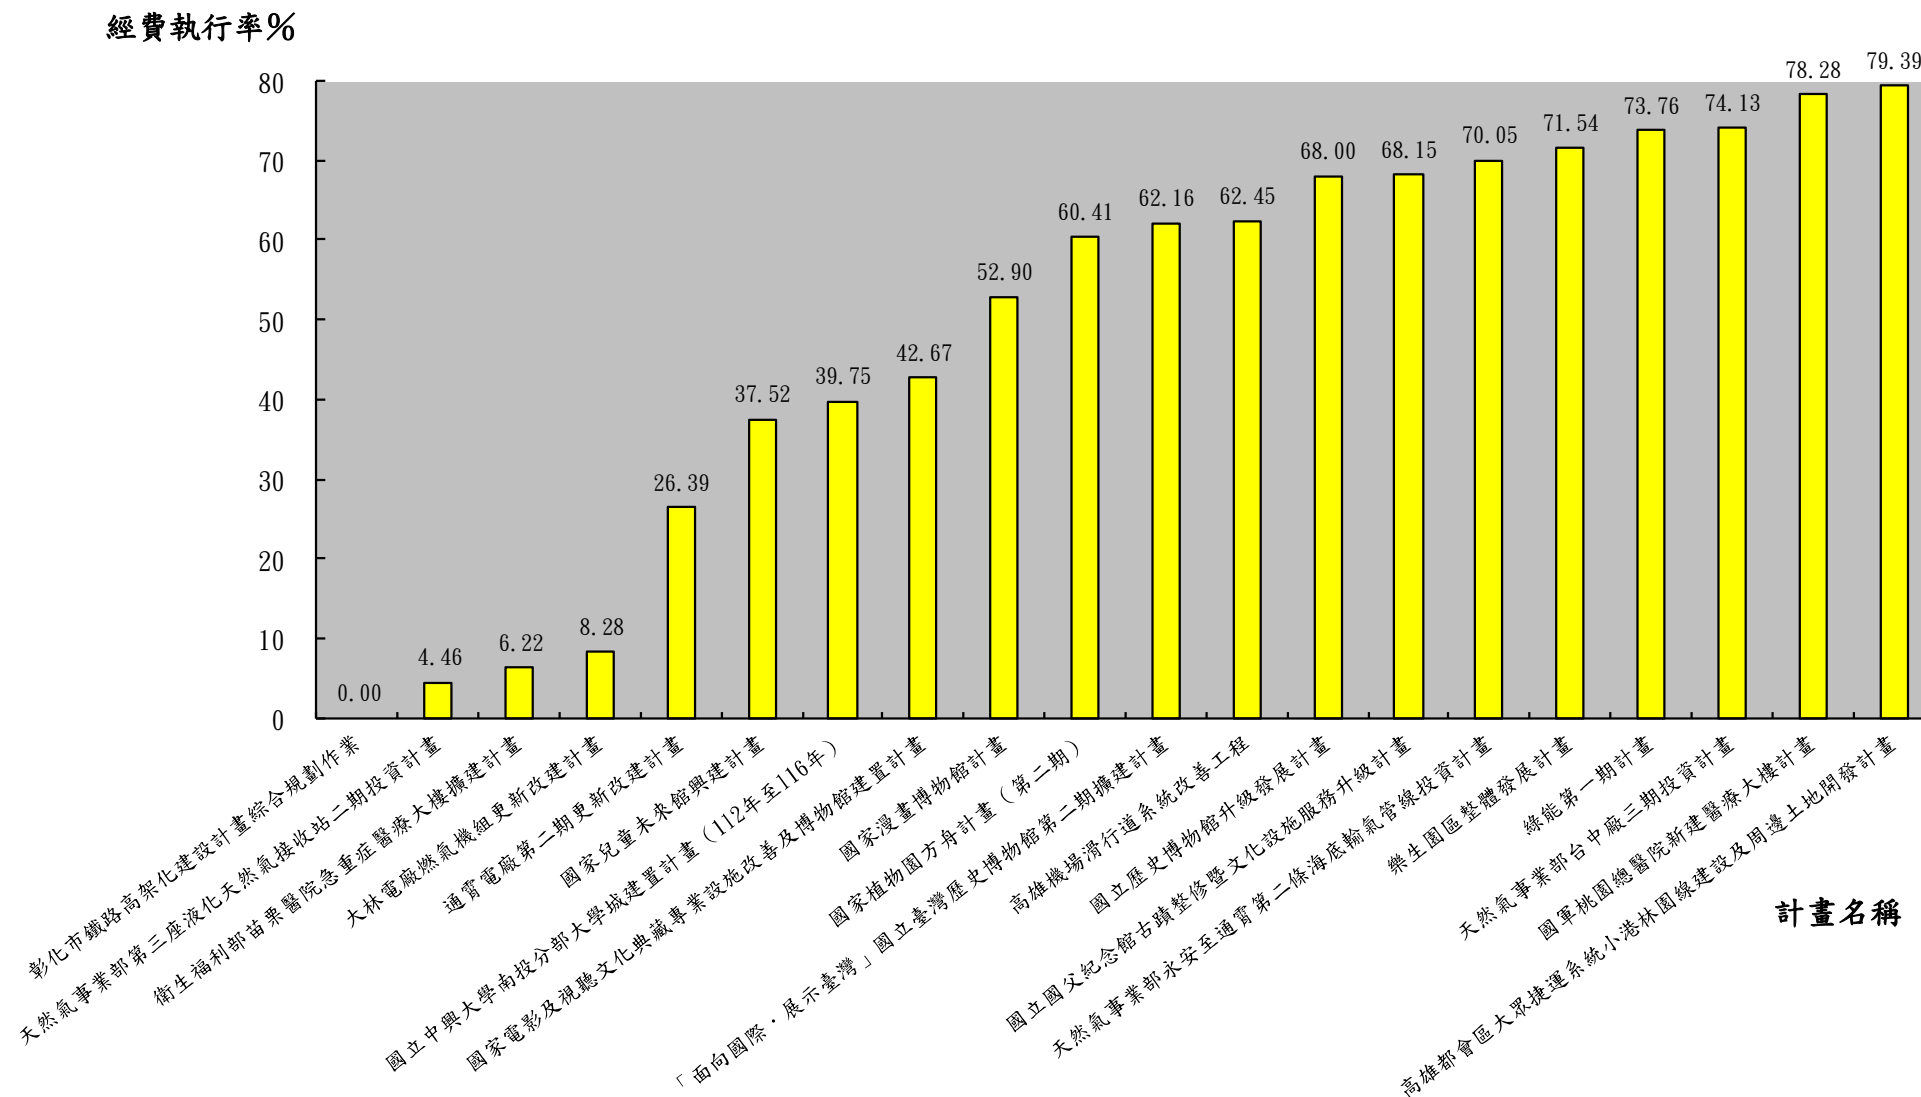

附圖 3

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫 總分配經費執行率未達 80%計畫明細

