

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫經費執行情形

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫，截至第 2 季止計 321 項，分屬 20 個主管機關¹，年計畫經費 6,295 億餘元，年累計分配經費 2,226 億餘元，年累計執行數 2,438 億餘元，年分配經費執行率 109.55%，各主管機關執行率均達 80% 以上；各項計畫年分配經費執行率未達 80% 者，有 27 項計畫；總分配經費執行率未達 80% 者，有 14 項計畫。各主管機關經費執行情形等詳細資料²列示如後。

- 各主管機關經費執行情形（詳附表1、附圖1）
- 年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形（詳附表2）
- 年分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖2）
- 總分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖3）

¹係指計畫主管機關，以下同。

²各項執行情形係依據公共工程委員會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就經費執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫各主管機關經費執行情形

113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管 計畫 項數	年計畫 經費 (1)	年累計 分配經費 (2)	實現數 (3)	已執行 應付未付數 (4)	節餘數 (5)	預付數 (6)	年累計 執行數 (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	年分配經費 執行率 (%) (7)/(2)×100
合 計		321	629,532	222,620	205,859	31,446	776	5,806	243,889	109.55
1	原住民族委員會	4	1,356	552	283	199	1	-	485	87.87
2	核能安全委員會	1	199	68	9	-	-	55	64	94.00
3	客家委員會	2	1,325	574	190	342	14	-	547	95.18
4	教育部	19	11,841	4,692	3,828	390	-	265	4,484	95.56
5	國立故宮博物院	1	1,518	852	357	151	0	319	828	97.21
6	環境部	7	6,199	2,269	1,987	200	1	40	2,230	98.25
7	法務部	3	1,213	489	371	99	-	16	488	99.77
8	財政部	2	64	33	29	-	4	-	33	100.00
9	國家發展委員會	3	1,641	541	347	144	-	50	542	100.18
10	國防部	8	7,811	2,653	2,659	-	-	-	2,659	100.25
11	國軍退除役官兵輔導委員會	6	2,998	1,498	1,198	106	-	199	1,504	100.41
12	數位發展部	4	1,342	182	184	4	0	-	189	103.94
13	海洋委員會	15	9,001	3,261	3,160	239	-	0	3,400	104.25
14	農業部	29	30,933	10,473	8,332	2,575	3	67	10,978	104.82
15	內政部	22	46,569	18,278	17,683	1,575	-	58	19,317	105.68
16	國家科學及技術委員會	7	44,258	7,735	7,163	561	-	455	8,180	105.75
17	衛生福利部	11	3,531	917	778	-	-	200	978	106.59
18	交通部	87	132,910	53,136	50,737	5,311	-	2,869	58,918	110.88
19	文化部	14	6,326	1,990	1,683	493	-	42	2,218	111.45
20	經濟部	76	318,488	112,417	104,872	19,049	751	1,165	125,839	111.94

註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

2. 年計畫經費係指全年計畫可支用經費，包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金等。

3. 本表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。


4. 國防部、數位發展部實現數大於年累計分配經費，係部分計畫執行進度超前，主辦機關（基金）調整經費支應所致。

附圖 1

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫各主管機關經費執行情形

113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

經費執行率%

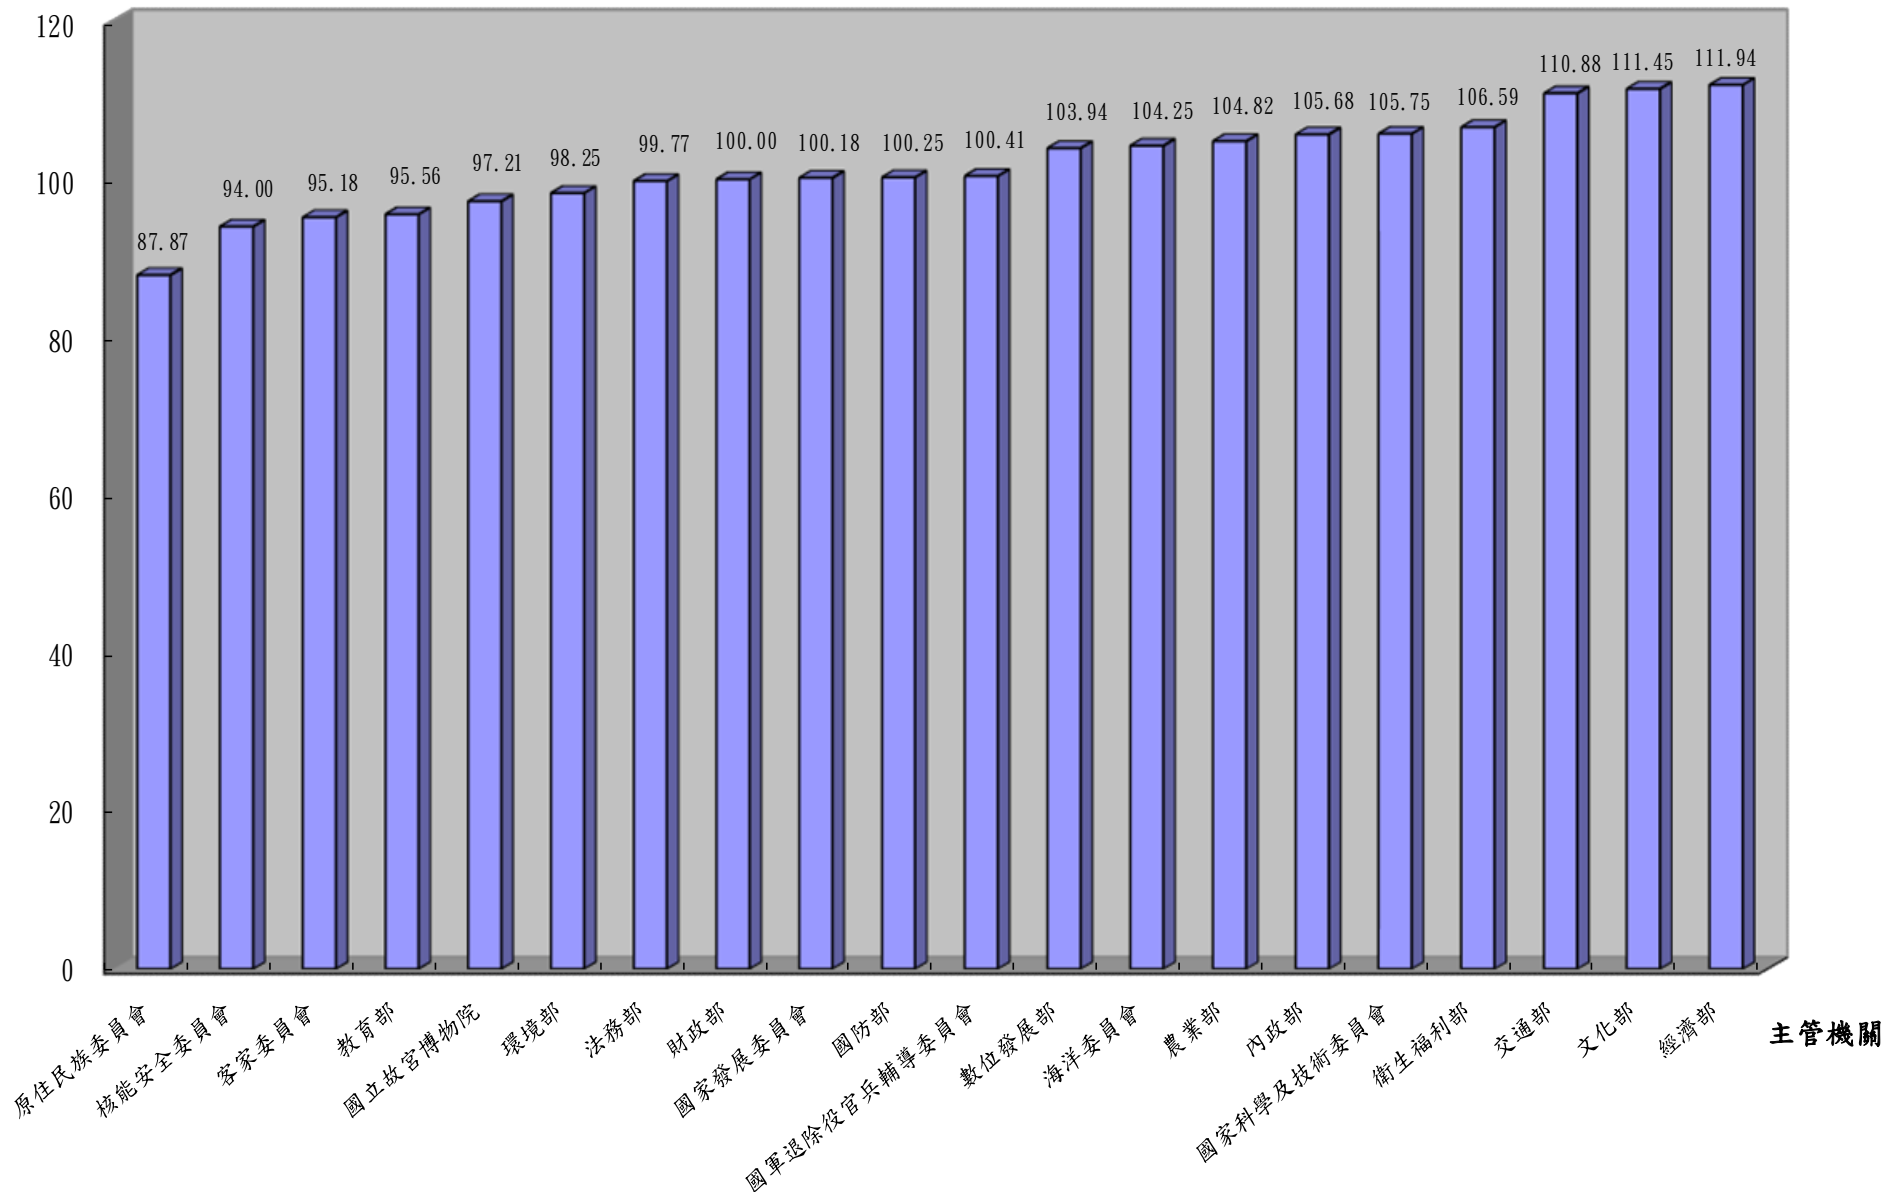

附表2

監督113年度公共工程委員會列管公共建設計畫
年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形

113年1月1日至6月30日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
1	交通部	交通部	交通運輸系統規劃作業計畫	10301-11012	750,000.00	行政院	強化配合國家發展需要且提升營運效能之環島交通系統，掌握國內外相關交通運輸系統發展政策及趨勢，及提出整體軌道系統之發展願景藍圖，以利政府施政參考。	23,767.00	8,598.00	-	-	672,181.00	663,583.00	98.73	因可行性研究或綜合規劃作業不如預期所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
2	交通部	交通部公路局	國道3號古坑交流道平面側車道工程	11208-11612	1,489,293.00	行政院	改善國道3號古坑交流道出口匝道交通動線紊亂，致造成交通亂象之問題。	621,991.00	86,220.00	-	-	118,904.00	32,684.00	27.49	因用地取得不如預期所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
3	農業部	農業部水產試驗所	公共服務據點整備公有危險建築補強重建計畫—水試所	11301-11312	31,638.00	行政院	降低建築物損壞或倒塌，提升建築物耐震能力，確保地震災害發生後，持續發揮公有建築物之機能。	31,638.00	1,260.00	-	-	1,260.00	-	-	因與廠商議價不如預期所致。	業就農業部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
4	法務部	廉政署	法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍耐震補強工程	11301-11312	2,699.00	行政院	完成法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍耐震補強工程，保障辦公同仁及洽公民眾安全，並活化運用廳舍空間。	2,699.00	1,144.00	2.00	0.17	1,144.00	2.00	0.17	因配合細部設計審查意見，須再進行修正，影響執行進度所致。	業就法務部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
5	海洋委員會	海洋委員會海巡署	海巡艦艇碼頭強化計畫	11101-11512	979,505.00	行政院	打造南部海巡專屬基地，並改善岸電設施，強化碼頭後勤能量。	147,838.00	300.00	10.00	3.33	58,619.00	58,329.00	99.51	因工程管理費實際支用情形不如預期所致。	業就海洋委員會所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
6	文化部	文化部	國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫	11201-11812	4,510,000.00	行政院	本計畫將建置國際水準之典藏空間及環境，讓國家影視及廣播文化資產得完整保存與呈現；吸引文化產業進駐，以活絡產業環境，並帶動地方發展，增加就業機會及周邊土地開發效益。	95,920.00	21,801.00	2,673.00	12.26	31,801.00	12,673.00	39.83	因基地範圍辦理紅火蟻防治作業及藏品搬遷計畫修正進度不如預期所致。	業就文化部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
7	農業部	農業部水產試驗所	建構漁業資源永續因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫	10901-11312	1,989,100.00	行政院	提升水產試驗所研究量能，廣泛與深入進行各項試驗探討，協助漁業永續經營發展。	898,389.00	459,665.00	88,605.00	19.28	1,524,289.00	1,153,229.00	75.66	因驗收尚未完成，延遲撥款，影響執行進度所致。	業就農業部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
8	教育部	教育部	臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程	11201-11702	1,312,263.00	行政院	改善新北市北海岸地區住宿型長期機構照護資源不足，及復健需求空間不足等問題。	11,674.00	8,260.00	2,065.00	25.00	9,840.00	3,645.00	37.04	因物價波動頻調整預算編列，影響執行進度所致。	業就教育部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
9	教育部	教育部	國立臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	10801-11512	2,900,000.00	行政院	提供學生教學研究空間及多功能運動中心，並解決校內停車位不足問題。	200,000.00	7,200.00	2,179.00	30.26	58,189.00	53,168.00	91.37	因工程案多次流標所致。	業就教育部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
10	交通部	國營臺灣鐵路股份有限公司	臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年—116年）	11301-11612	13,218,250.00	行政院	延長車輛資產耐用年限及提升服務能量及效率。	1,080,000.00	484,907.00	169,716.00	35.00	484,907.00	169,716.00	35.00	因檢修備料費時，影響執行進度所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
11	衛生福利部	衛生福利部	樂生園區整體發展計畫	10606-11312	1,073,334.00	行政院	建立與世界接軌之國家漢生病醫療人權園區，及呈現歷史、人權、生態、社會教育等多面向價值。	356,792.00	108,478.00	44,530.00	41.05	825,020.00	761,072.00	92.25	因變更設計進度不如預期所致。	業就衛生福利部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
12	交通部	交通部	澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃	10809-11307	103,228.00	行政院	推動離島交通船汰舊換新，確保船舶航行安全。	56,518.00	34,991.00	14,973.00	42.79	81,702.00	61,684.00	75.50	因大型吊車調度不易，影響執行進度所致。	業函請交通部督促澎湖縣政府積極處理。
13	內政部	內政部國土管理署	公共服務據點整備公有危險建築補強重建—內政部及所屬	11301-11312	34,075.00	行政院	降低建築物損壞或倒塌，提升建築物耐震能力，確保地震災害發生後，持續發揮公有建築物之機能。	34,075.00	12,230.00	5,245.00	42.89	12,230.00	5,245.00	42.89	因整合耐震補強建物使用與管理單位意見不如預期，影響工程規劃設計進度所致。	業就國土管理署所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
14	農業部	農業部	因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫（110—113年）	11001-11312	1,415,000.00	行政院	可提升我國農業科技水準，促進農業產業轉型升級，進而發展永續產業等。	577,578.00	278,908.00	130,941.00	46.95	1,116,330.00	968,363.00	86.75	因撥款程序未完成，影響執行進度所致。	業就農業部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
15	內政部	內政部國土管理署	兒童遊戲場環境設施改善計畫	11208-11312	1,000,000.00	行政院	改善我國兒童遊戲場設施，確保設施符合國家標準，提供安全且有助兒童身心發展之遊戲場，以保障兒童遊戲權。	1,000,000.00	150,000.00	71,750.00	47.83	150,000.00	71,750.00	47.83	部分案件地方政府尚未辦理請款，影響執行進度所致。	業就國土管理署所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
16	交通部	交通部公路局	2030年客運車輛電動化推動計畫(113—119年)	11301-12312	64,326,700.00	行政院	藉由公車全面電動化提供高品質及低汙染之公共運輸服務，並帶動國內電動公車相關產業發展。	2,534,000.00	457,430.00	227,098.00	49.65	457,430.00	227,098.00	49.65	因廠商尚未辦理請款作業，影響執行進度所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
17	經濟部	台灣電力股份有限公司	台中發電廠1—10號機供煤系統改善計畫	10601-11412	16,101,483.00	行政院	改善現有機組排放空氣污染物之防制設備，使機組能在合於環保標準下穩定供電。	1,955,855.00	764,559.00	403,388.00	52.76	12,335,732.00	11,974,561.00	97.07	因建照逾期，遭勒令停工，影響進度所致。	業就該案落後情形派員辦理調查中。
18	交通部	交通部民用航空局	高雄機場滑行道系統改善工程	10901-11512	996,162.00	行政院	加速機場建設，優化航服服務效能。	262,605.00	56,128.00	30,682.00	54.66	441,379.00	415,933.00	94.23	因廠商人力及機具不足，影響執行進度所致。	業函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。


排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
19	教育部	教育部	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	10701-11412	5,711,458.00	行政院	均衡南北圖書資源之建設，提升南部地區圖書館服務質量；建設國家圖書館永續發展環境，提升圖書服務能量等。	1,812,500.00	772,800.00	460,482.00	59.59	2,194,586.00	1,882,268.00	85.77	因受天候及缺工影響所致。	案就教育部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
20	教育部	教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	10801-11402	1,212,824.00	行政院	提升臺大醫院服務品質形象，徹底解決既有東址外牆日益老化掉落問題，使民眾可安心就醫。	200,000.00	70,000.00	41,933.00	59.90	708,000.00	679,933.00	96.04	因受天候影響所致。	案就教育部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
21	經濟部	台灣電力股份有限公司	南區一期輪變電專案計畫	11001-11912	9,669,720.00	經濟部	配合南部區域負載成長及大規模重劃區位開發之用電需求，興建電力設施，以提升南部區域供電穩定度。	1,324,763.00	596,103.00	398,412.00	66.84	1,576,684.00	1,378,993.00	87.46	因變電所用地取得不如預期所致。	案就經濟部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
22	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會	臺南及雲林榮家軍家區設施環境總體營造中程計畫	10301-11312	2,371,859.00	行政院	改善榮家設施，接軌長照服務，提升照顧服務品質，並結合社區長照需求，擴大安置對象，充分發揮榮家資源最大效益。	198,376.00	194,716.00	131,085.00	67.32	2,368,199.00	2,304,568.00	97.31	工程代辦機關（臺南市政府）辦理經費核銷費時所致。	案就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
23	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會	提升失智照顧量能長照忘我國區中程計畫	10901-11412	1,684,840.00	行政院	擴大服務對象，榮家資源可高度使用，並提高自費就養率，以符合全民共享國家資源之正義原則等。	706,065.00	266,012.00	197,790.00	74.35	328,247.00	260,025.00	79.22	板橋榮家統包多次流標所致。	案就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
24	原住民族委員會	原住民族委員會	宜居部落建設計畫（111年—114年）	11101-11412	1,400,000.00	行政院	透過補助地方政府經費進行部落整體性及永續建設藍圖規劃，以作為未來部落建設之依據。	479,070.00	209,838.00	157,983.00	75.29	708,884.00	657,029.00	92.68	因地方政府修正計畫延誤所致。	案就原住民族委員會所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
25	交通部	交通部航港局	我國智慧航安服務升級計畫	11301-11612	1,934,570.00	行政院	完備我國智慧航安相關系統與管理工作，以保障海域航行安全，達到智慧航安及守護臺灣之願景。	301,056.00	105,134.00	80,595.00	76.66	105,134.00	80,595.00	76.66	因多次流標所致。	案品請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
26	文化部	文化部	華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫	10901-11312	3,233,159.00	行政院	建構完整文化內容產業生態系與支持系統、驅動文化經濟發展、培育文化內容產業跨領域人才等。	308,352.00	72,841.00	55,892.00	76.73	633,362.00	616,413.00	97.32	因辦理計畫修正事宜不如預期，影響執行進度所致。	案就文化部所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。
27	內政部	內政部國土管理署	永續提升人行安全計畫	11301-11612	40,000,000.00	行政院	加速國內人行環境改善及整體道路品質提升，營造用路人放心與安心之生活環境。	1,994,939.00	159,370.00	123,713.00	77.63	159,370.00	123,713.00	77.63	部分案件地方政府尚未辦理請款，影響執行進度所致。	案就國土管理署所提改進措施，廉續注意其後續辦理情形。

附圖 2

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫 年分配經費執行率未達 80%計畫明細

113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

經費執行率%

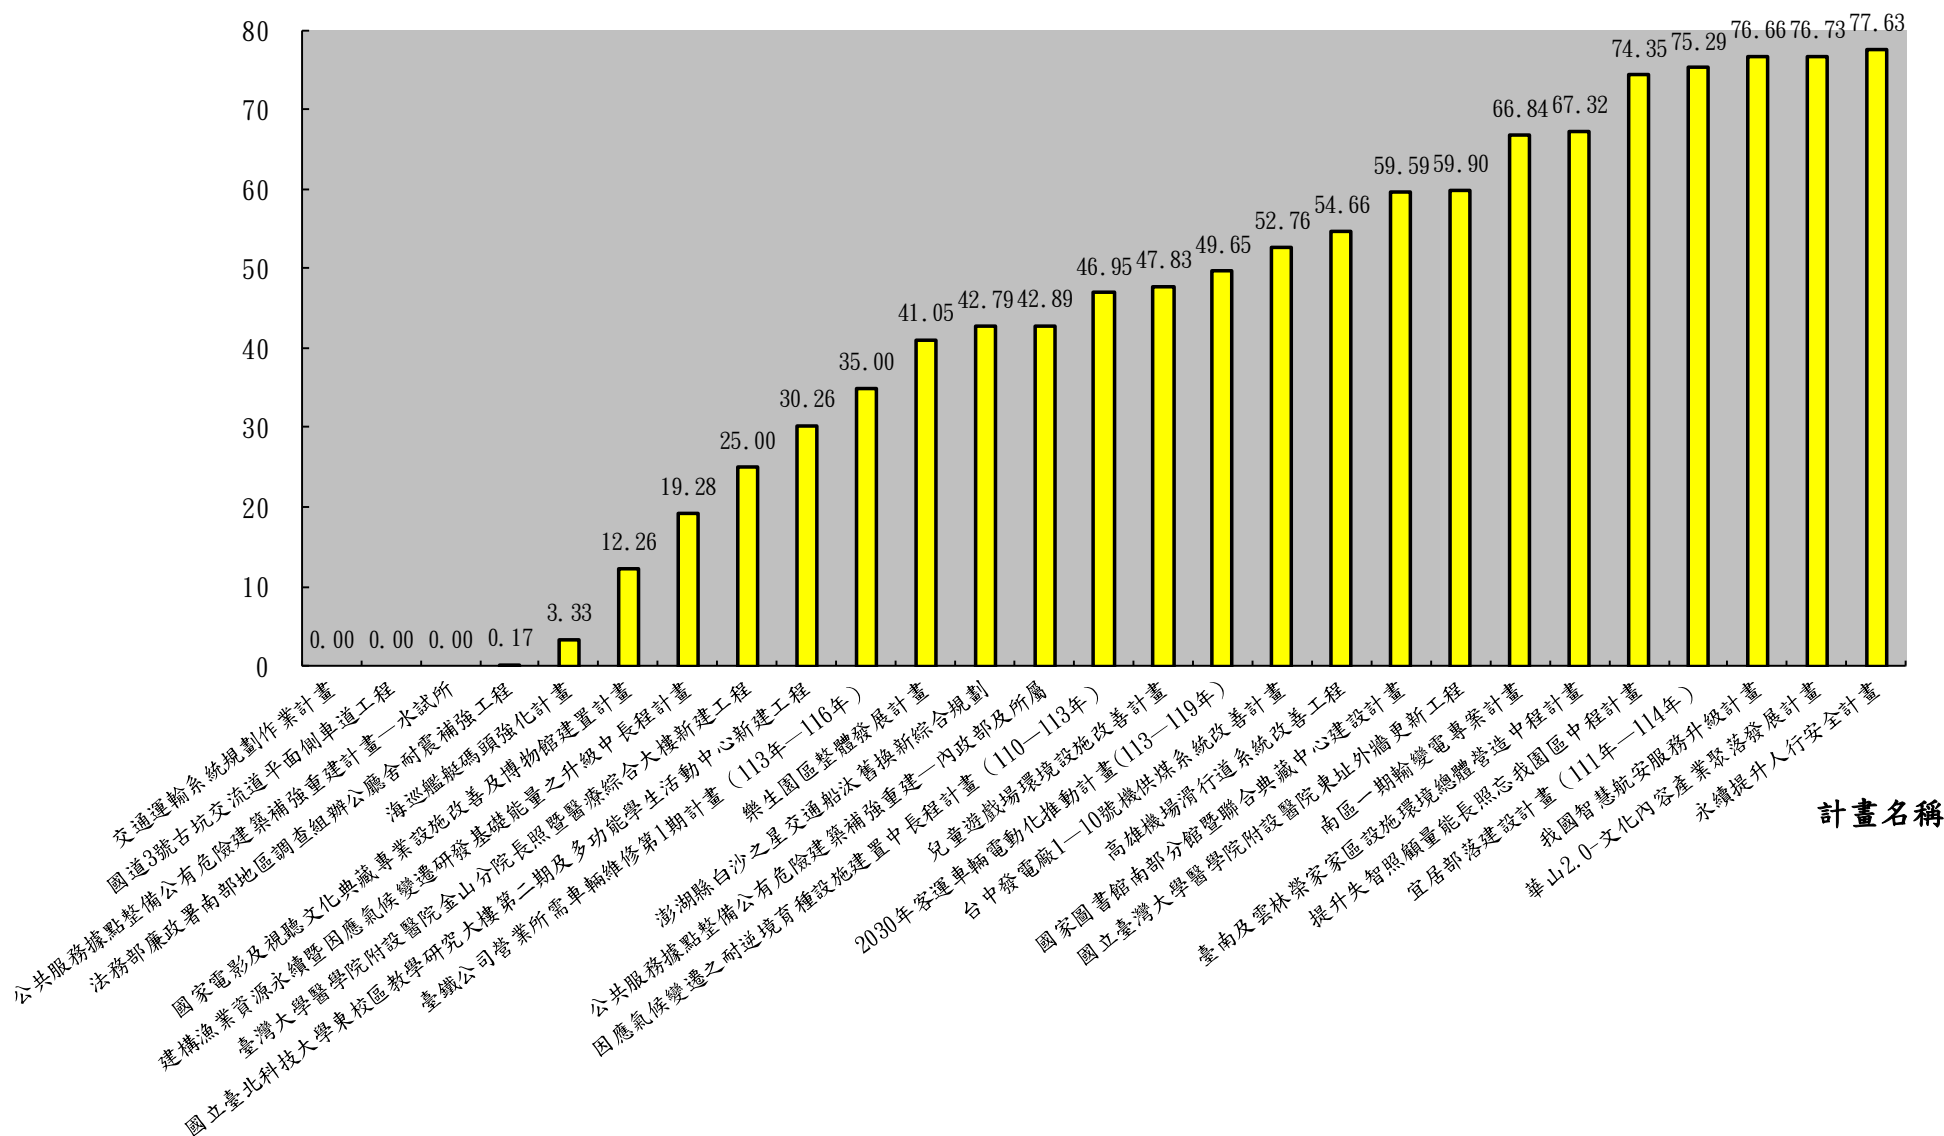

計畫名稱

附圖 3

113 年度公共工程委員會列管公共建設計畫 總分配經費執行率未達 80%計畫明細

113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

經費執行率%

