

## 110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫經費執行情形

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫計 215 項<sup>1</sup>，分屬 18 個主管機關<sup>2</sup>，年計畫經費 3,613 億餘元，截至第 4 季止，已全數分配，年累計執行數 3,502 億餘元，年分配經費執行率 96.92%，其中國防部未達 80%；各項計畫年分配經費執行率未達 80%者，有 10 項計畫；總分配經費執行率未達 80%者，有 7 項計畫。各主管機關經費執行情形等詳細資料<sup>3</sup>列示如後。

- 各主管機關經費執行情形（詳附表1、附圖1）
- 年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形（詳附表2）
- 年分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖2）
- 總分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖3）

---

<sup>1</sup>110 年第 3 季原列管 217 項，嗣解除列管經濟部「台中發電廠第 2 階段煤灰填海工程計畫」及「全台小水力發電第二期計畫」等 2 項計畫。

<sup>2</sup>係指計畫主管機關，以下同。

<sup>3</sup>各項執行情形係依據公共工程委員會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就經費執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

## 110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關經費執行情形

單位：百萬元

排序	主管機關	列管計畫項數	年計畫經費 (1)	年累計分配經費 (2)	實現數 (3)	已執行應付未付數 (4)	節餘數 (5)	預付數 (6)	年累計執行數 (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	年分配經費執行率 (%) (7)/(2)×100
合 計		215	361,387	361,387	262,900	45,688	8,367	33,305	350,261	96.92
1	國防部	6	2,597	2,597	2,015	-	-	1	2,016	77.62
2	衛生福利部	3	336	336	238	30	1	-	270	80.42
3	國立故宮博物院	1	503	503	332	-	53	74	461	91.56
4	文化部	17	5,115	5,115	4,281	349	87	113	4,832	94.47
5	經濟部	51	128,803	128,803	85,629	34,363	1,670	223	121,888	94.63
6	原住民族委員會	4	1,629	1,629	1,456	68	20	-	1,546	94.88
7	農業委員會	23	15,483	15,483	12,500	1,996	166	42	14,705	94.98
8	國軍退除役官兵輔導委員會	8	6,647	6,647	6,322	186	-	11	6,520	98.10
9	法務部	2	449	449	156	117	-	167	442	98.41
10	交通部	47	148,484	148,484	105,682	7,116	1,278	32,424	146,501	98.66
11	內政部	10	26,557	26,557	25,939	156	289	1	26,387	99.36
12	環境保護署	5	3,707	3,707	3,184	467	35	-	3,687	99.46
13	科技部	4	13,673	13,673	8,334	518	4,759	-	13,612	99.56
14	教育部	27	5,942	5,942	5,716	82	-	134	5,933	99.84
15	客家委員會	2	833	833	718	109	-	5	833	100.00
16	海洋委員會	3	324	324	322	-	2	-	324	100.00
17	國家發展委員會	1	277	277	50	124	0	102	277	100.00
18	勞動部	1	18	18	17	1	0	-	18	100.00


註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

2. 年計畫經費係指全年計畫可支用經費，包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金等。

3. 本表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

附圖 1

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關經費執行情形

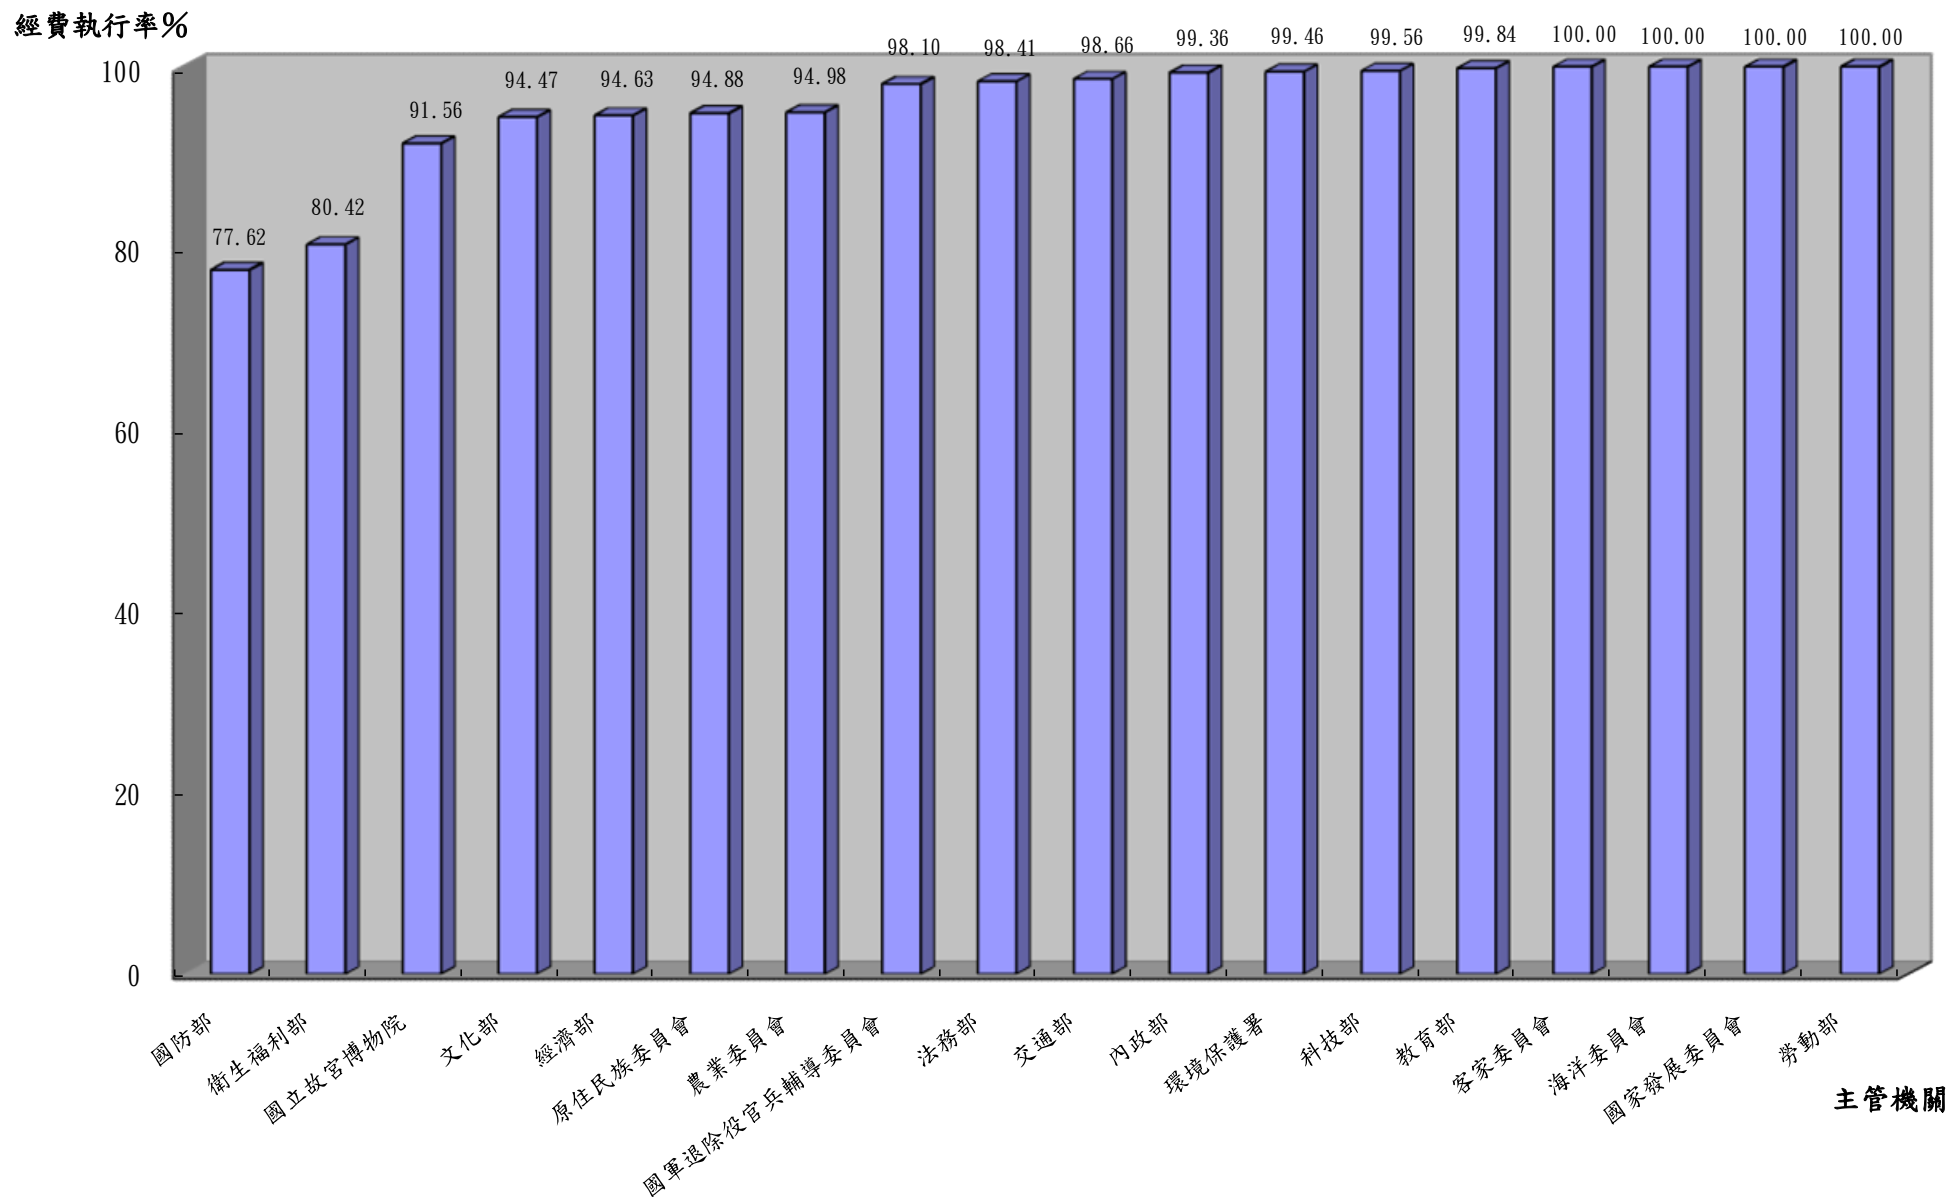

附表2

**監督110年度公共工程委員會列管5千萬元以上公共建設計畫  
年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形**

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
1	交通部	高雄市政府(交通部補助單位)	高雄都會區大眾捷運系統紅橋線路網建設計畫	07907-11208	153,159,030	行政院	加強高雄都會中心與衛星市區(岡山、橋頭、鳳山等)之聯繫、提高運輸效率、促進沿線土地利用價值等。	846,436	846,436	191,343	22.61	152,721,733	152,066,640	99.57	因計畫修正尚未完成審查所致。	業就該案落後情形函請交通部督促高雄市政府積極處理。
2	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫	10901-11212	1,019,243	行政院	擴大服務對象，榮家資源可高度使用，並提高自費就養率，以符合全民共享國家資源之正義原則等。	59,839	59,839	14,157	23.66	60,010	14,328	23.88	因所屬榮家辦理技術服務廠商招標及規劃設計作業延遲所致。	業就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
3	交通部	臺東縣政府(交通部補助單位)	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	10501-11212	717,030	行政院	改善漁船及交通船混雜作業所造成之擁擠及管理困擾，期盼達到「明確分隔漁商港區並共用港口」之目標。	311,883	311,883	107,236	34.38	426,812	222,165	52.05	因受他案工程施工影響，港內設施興建作業進度落後所致。	業就該案落後情形函請交通部督促臺東縣政府積極處理。
4	農業委員會	農業委員會	因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫(110-113年)	11001-11312	1,415,000	行政院	可提升我國農業科技水準，促進農漁畜業轉型升級，進而發展永續產業等。	292,994	292,994	102,746	35.07	292,994	102,746	35.07	因工程尚未決標所致。	業就農業委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
5	國防部	國防部軍醫局	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	10701-11112	1,798,857	行政院	提升官兵福利，擴大軍人、軍眷在軍陣醫療、預防醫學、複合型重大災難醫療等領域更優質、多元之服務等。	641,577	641,577	242,494	37.80	1,002,175	603,092	60.18	因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響辦理管線審查及放樣勘驗作業所致。	業就國防部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
6	國防部	國防部軍備局	資安園區中長程計畫	10906-11512	5,413,256	行政院	打造資安菁英人才培育基地。	76,630	76,630	30,371	39.63	76,630	30,371	39.63	因工程多次流標等所致。	業就國防部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
7	衛生福利部	衛生福利部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	10707-11405	3,099,404	行政院	擴建完成後預估醫療收入可大幅成長，擴建經費預估可於131年度回收等。	118,603	118,603	57,739	48.68	139,036	78,172	56.22	因招標期程延宕，造成全案執行進度落後所致。	業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關衛生福利部查明處理，並報告監察院。
8	國防部	國防部軍醫局	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	10901-11512	3,483,754	行政院	建構急重癌症醫療體系，提升病人醫療品質；提升醫療空間使用坪效，滿足民眾就醫需求等。	4,870	4,870	3,285	67.45	6,578	4,993	75.90	因工程招標多次流標所致。	業就國防部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
9	文化部	國父紀念館	國立國父紀念館跨域加值計畫	10401-11412	1,638,953	行政院	使大會堂、展場滿足多功能表演、展覽之需求；中山文化園區景觀改造，提供民眾更優質之休憩園地等。	129,865	129,865	90,947	70.03	348,158	309,240	88.82	因計畫需提送台北市政府審議，審查期程較長所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。


排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費 (1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費 (2)	年累計分配經費 (3)	年累計執行數 (4)	年分配經費 執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費 (5)	總累計執行數 (6)	總分配經費 執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
10	經濟部	台灣糖業股份有限公司	農業循環豬場改建投資計畫	10710-11212	10,740,790	行政院	預計可年育成502,996頭上市肉豬與外售57,600頭保育豬，投資報酬率為4.64%。	5,114,500	5,114,500	3,943,380	77.10	6,301,300	5,130,180	81.41	因第1期統包工程細部設計，廠商提送進度延遲等所致。	業就執行情形辦理專案調查，核有效能過低情事，已依審計法第69條規定，通知上級機關經濟部查明處理，並報告監察院。

註：本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

附圖 2

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫  
年分配經費執行率未達 80% 計畫明細

經費執行率%

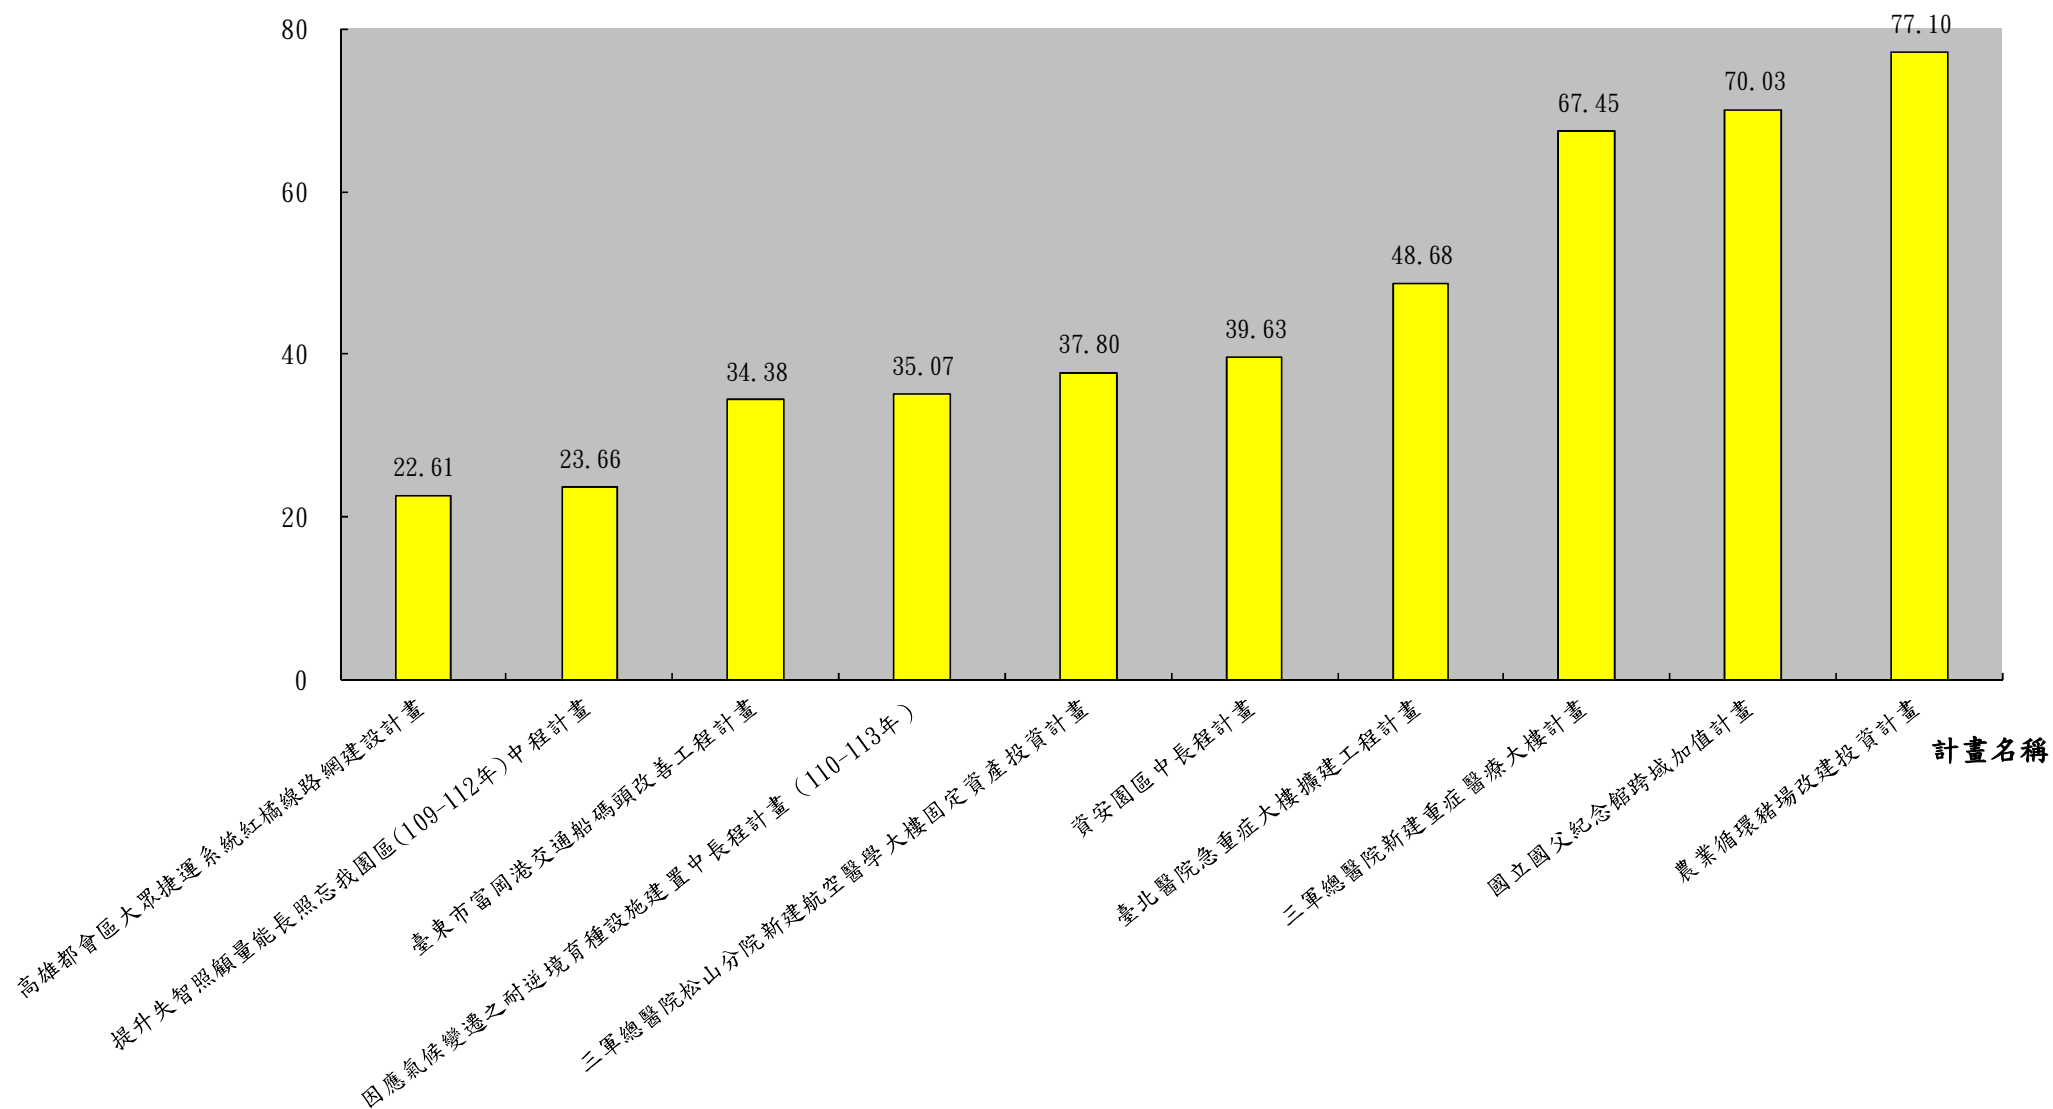

附圖 3

110 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫  
總分配經費執行率未達 80% 計畫明細

