

111 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫經費執行情形

111 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫計 208 項，分屬 19 個主管機關¹，年計畫經費 3,576 億餘元，截至第 2 季止，年累計分配經費 1,191 億餘元，年累計執行數 1,416 億餘元，年分配經費執行率 118.84%，各主管機關執行率均達 80% 以上；各項計畫年分配經費執行率未達 80% 者，有 15 項計畫；總分配經費執行率未達 80% 者，有 10 項計畫。各主管機關經費執行情形等詳細資料²列示如後。

- 各主管機關經費執行情形（詳附表1、附圖1）
- 年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形（詳附表2）
- 年分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖2）
- 總分配經費執行率未達80%計畫明細（詳附圖3）

¹係指計畫主管機關，以下同。

²各項執行情形係依據公共工程委員會提供表報，並由相關審計單位洽轄審機關就經費執行率落後情形查填相關資料，據以綜整。

附表 1

111 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關經費執行情形

111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	列管 計畫 項數	年計畫 經費 (1)	年累計 分配經費 (2)	實現數 (3)	已執行 應付未付數 (4)	節餘數 (5)	預付數 (6)	年累計 執行數 (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	年分配經費 執行率 (%) (7)/(2)×100
合 計		208	357,678	119,198	101,641	33,004	218	6,792	141,656	118.84
1	國立故宮博物院	1	610	215	71	24	0	99	196	90.92
2	國防部	8	3,986	1,444	1,370	-	-	-	1,370	94.86
3	環境保護署	4	3,814	1,767	1,379	315	1	-	1,697	96.05
4	法務部	2	894	553	322	5	-	219	547	98.83
5	客家委員會	2	1,115	798	582	212	-	-	794	99.44
6	財政部	1	94	0	0	-	-	-	0	99.56
7	國家發展委員會	1	583	517	273	34	-	209	517	100.00
8	勞動部	1	23	23	18	-	4	-	23	100.00
9	內政部	9	33,765	15,489	16,004	604	0	14	16,622	107.32
10	文化部	12	4,108	1,770	1,525	284	-	123	1,932	109.15
11	農業委員會	17	21,481	6,953	5,632	2,180	1	6	7,821	112.49
12	科技部	5	19,983	9,002	8,743	1,452	-	-	10,195	113.25
13	交通部	46	91,241	35,416	33,139	2,364	0	4,775	40,278	113.73
14	原住民族委員會	4	1,134	232	174	107	-	-	281	121.23
15	衛生福利部	5	1,115	156	108	68	-	19	196	125.34
16	國軍退除役官兵輔導委員會	8	5,799	1,773	2,133	95	-	0	2,229	125.70
17	經濟部	58	156,714	40,494	27,836	24,885	208	179	53,110	131.16
18	教育部	22	10,452	2,395	2,134	230	-	1,146	3,510	146.58
19	海洋委員會	2	759	193	190	138	-	-	329	170.50

註：1. 本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

2. 年計畫經費係指全年計畫可支用經費，包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金等。

3. 本表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。


4. 內政部及國軍退除役官兵輔導委員會實現數大於年累計分配經費，係部分計畫執行進度超前，主辦機關（基金）調整經費支應所致。

附圖 1

111 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫各主管機關經費執行情形

111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

經費執行率%

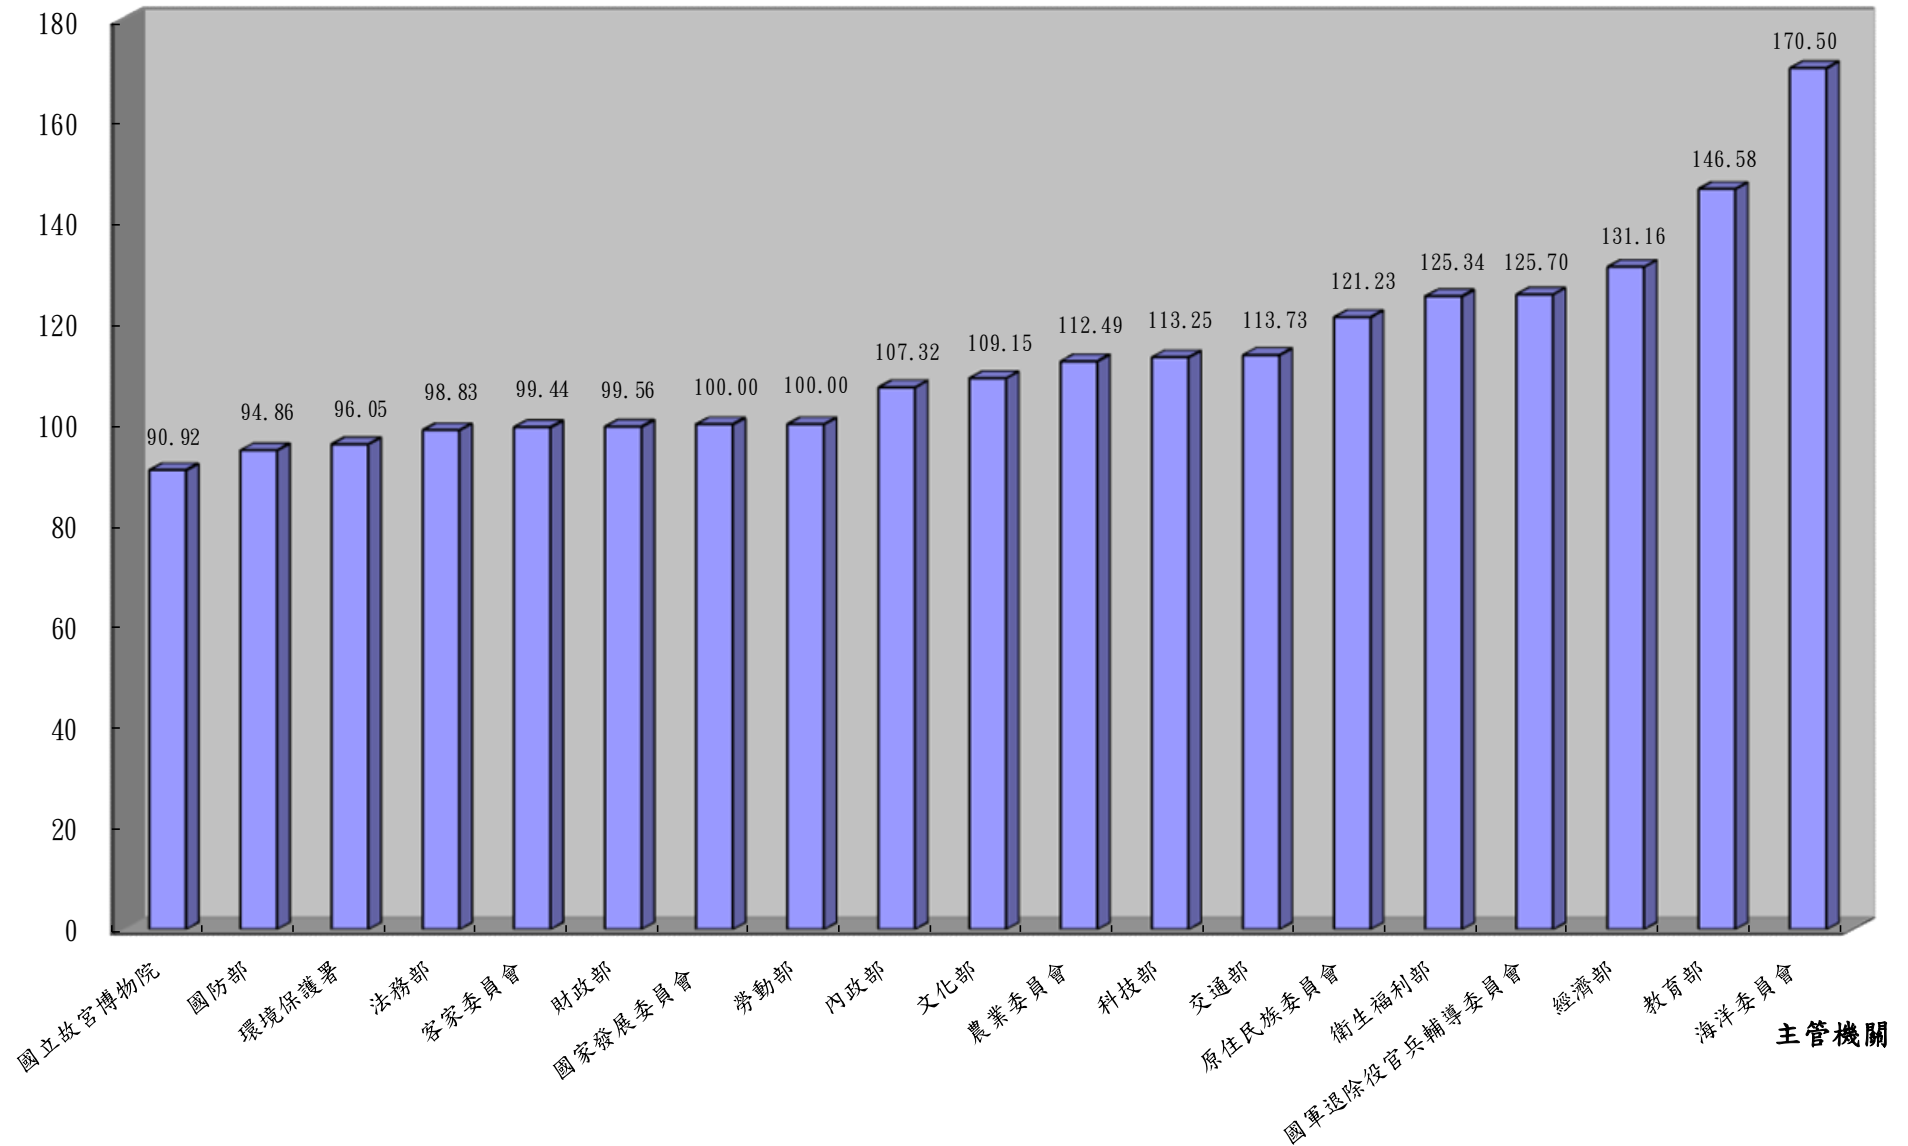

附表2

監督111年度公共工程委員會列管5千萬元以上公共建設計畫
年分配經費執行率或總分配經費執行率未達80%計畫執行情形

111年1月1日至6月30日

單位：千元

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
1	經濟部	台灣電力股份有限公司	寶山超高壓變電所新建計畫	11101-12312	14,829,955	行政院	為滿足新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫用電需求，啟動寶山超高壓變電所新建計畫，強化國家高科技產業布局，並提升國際競爭力。	3,342	1,605	85	5.30	1,605	85	5.30	因天候不穩定，345kV寶山E/S出口新設輸電線路空載光達測量尚未進場作業所致。	業就該案落後情形，函請經濟部督促台灣電力股份有限公司積極處理。
2	教育部	教育部	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心設計計畫	10701-11312	4,749,385	行政院	均衡南北圖書資源之建設，提升南部地區圖書館服務質量；建設國家圖書館永續發展環境，提升圖書服務能量。	612,160	81,205	15,118	18.62	257,441	191,354	74.33	因工程多次流標所致。	業就教育部所提改進措施，康續注意其後續辦理情形。
3	經濟部	台灣電力股份有限公司	霧社水庫防淤工程計畫	11001-11612	5,024,153	行政院	改善霧社水庫淤積問題，完工後可增加霧社水庫排淤能力，減少水庫淤積並提升中部地區供水穩定。	143,853	39,905	10,564	26.47	39,905	10,564	26.47	因原預定於111年1月成立並執行計畫預算之「水力施工處」，配合「海域風電施工處」裁撤時程延至同年7月所致。	業就該案落後情形，函請經濟部督促台灣電力股份有限公司積極處理。
4	農業委員會	農業委員會	因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫(110-113年)	11001-11312	1,415,000	行政院	可提升我國農業科技水準，促進農漁畜業轉型升級，進而發展永續產業等。	568,497	98,597	36,897	37.42	199,495	137,795	69.07	因受新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情影響及物價上漲工程流標等所致。	業就農業委員會所提改進措施，康續注意其後續辦理情形。
5	交通部	公路總局	西濱快速公路曾文溪橋段新建工程	11001-11512	6,636,215	行政院	延續西濱快速公路路網、帶動觀光休閒產業、促進區域均衡發展、加速濱海地區發展。	100,000	16,644	7,743	46.52	100,344	91,443	91.13	因工程多次流標所致。	業就該案落後情形，函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
6	農業委員會	農業委員會試驗所	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)(林業試驗所)	11101-11112	63,770	行政院	降低建築物損壞或倒塌，提升建築物耐震能力，確保地震災害發生後，持續發揮公有建築物之機能。	63,770	2,580	1,235	47.87	2,580	1,235	47.87	因耐震補強所需工法及界面複雜所致。	業就農業委員會所提改進措施，康續注意其後續辦理情形。
7	文化部	國立傳統藝術中心	「跨藝匯流·傳統入心」—國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	10401-11112	2,472,871	行政院	串聯並發揮臺灣戲曲中心、宜蘭傳藝園區、高雄傳藝園區三地據點之特性，並兼具跨域加值、資源共享的經濟效能。	73,638	52,127	25,821	49.53	2,448,992	2,422,686	98.93	因設計疏漏，停工辦理變更設計，及部分工程未取得使用執照等影響所致。	業就文化部所提改進措施，康續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
8	交通部	臺灣鐵路管理局	高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	11009-11412	12,147,665	行政院	高雄機廠潮州基地二期計畫，於原有機廠範圍內之預留用地，擴充新購城際電聯車檢修功能，以維護行車安全。	19,470	1,000	513	51.30	1,000	513	51.30	因廠商遲未提送估驗計價資料所致。	業就該案落後情形，函請交通部研謀因應措施，並督促積極辦理。
9	經濟部	台灣電力股份有限公司	湖山水庫小水力發電計畫	10707-11112	169,028	經濟部	年發電量8.097百萬度，每年可減少4,275噸之二氧化碳排放。	26,971	13,380	7,104	53.09	155,436	149,160	95.96	因試運轉外籍技師，受國際疫情影響未能按時抵台作業，無法完成第二階段里程碑所致。	業就該案落後情形，函請經濟部督促台灣電力股份有限公司積極處理。
10	國軍退除役官兵輔導委員會	國軍退除役官兵輔導委員會	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫	10901-11212	1,019,243	行政院	擴大服務對象，榮家資源可高度使用，並提高自費就養率，以符合全民共享國家資源之正義原則等。	175,283	46,443	26,618	57.31	59,746	39,921	66.82	因疫情、人力短缺及營建物料價格上漲等，原計畫費用編列不足所致。	業就國軍退除役官兵輔導委員會所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
11	教育部	教育部	國立清華大學「藝術學院大樓新建工程」	10710-11306	699,938	行政院	新藝術學院將在音樂及藝術雙領域持續追求專業卓越，並培訓學生勇於嘗試豐富的創作、展演型態及美學風格。	85,565	20,000	12,133	60.67	180,000	172,133	95.63	因受天候因素所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
12	教育部	教育部	建置區域產業人才及技術培育基地計畫	11101-11412	2,400,000	行政院	配合政府投資青年就業政策，規劃設立20座「區域產業人才及技術培育基地」，並透過區域教學能量，強化大專校院與產業聚落的連結。	490,750	125,535	77,600	61.82	125,535	77,600	61.82	因協助學校聚焦產業人才需求，延長審查及輔導時間所致。	業就教育部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
13	文化部	國父紀念館	國立國父紀念館跨域加值計畫	10401-11412	1,632,000	行政院	大會堂、展場滿足多功能表演、展覽之需求；中山文化園區景觀改造，提供民眾更優質之休憩園地等。	147,070	68,150	45,652	66.99	346,638	324,140	93.51	因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影响出工率，及天候因素所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。
14	經濟部	台灣電力股份有限公司	變電所整所改建一期專案計畫	10801-12312	29,352,684	行政院	本計畫所提9所變電所建築物及主要供電設備已陸續達使用年限，供電可靠度及設備使用安全堪慮，原地規劃改建為屋內式變電所及汰換相關供電設備，進一步提升供電安全與美化市容。	1,597,348	539,695	371,783	68.89	642,789	474,877	73.88	因「台南一次變電所改建工程」決標工期延後所致。	業就該案落後情形，函請經濟部督促台灣電力股份有限公司積極處理。
15	文化部	國家人權博物館	國家人權博物館中程計畫	10501-11412	2,201,900	行政院	透過博物館的展示及相關活動，讓參訪者認知得來不易的民主價值，與民主生活方式的珍貴性與重要性。	309,942	60,106	46,341	77.10	798,007	784,242	98.28	因天候因素工程主要工項(如防水工程、混凝土澆灌作業)無法施作所致。	業就文化部所提改進措施，賡續注意其後續辦理情形。

排序	主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	總計畫經費(1)	核准機關	計畫預期效益	年計畫經費(2)	年累計分配經費(3)	年累計執行數(4)	年分配經費執行率(%) (4)/(3)×100	總累計分配經費(5)	總累計執行數(6)	總分配經費執行率(%) (6)/(5)×100	落後原因	審計部處理情形
16	經濟部	工業局	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫	10601-11712	104,701,621	行政院	建立循環園區評估指標、資源再生產品及技術應用研究、推動在地產業升級轉型、推動大林蒲地區遷村等。	255,099	179,461	179,461	100.00	23,318,898	498,248	2.14	因地方民眾及環保團體要求須完成「遷村計畫書」，再進行園區設置，故暫緩辦理環境影響評估公開說明會等所致。	業就該案落後情形，函請經濟部督促所屬工業局積極處理。


註：本表係按年分配經費執行率由最低至最高之順序排列。

附圖 2

111 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 年分配經費執行率未達 80%計畫明細

111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

經費執行率%

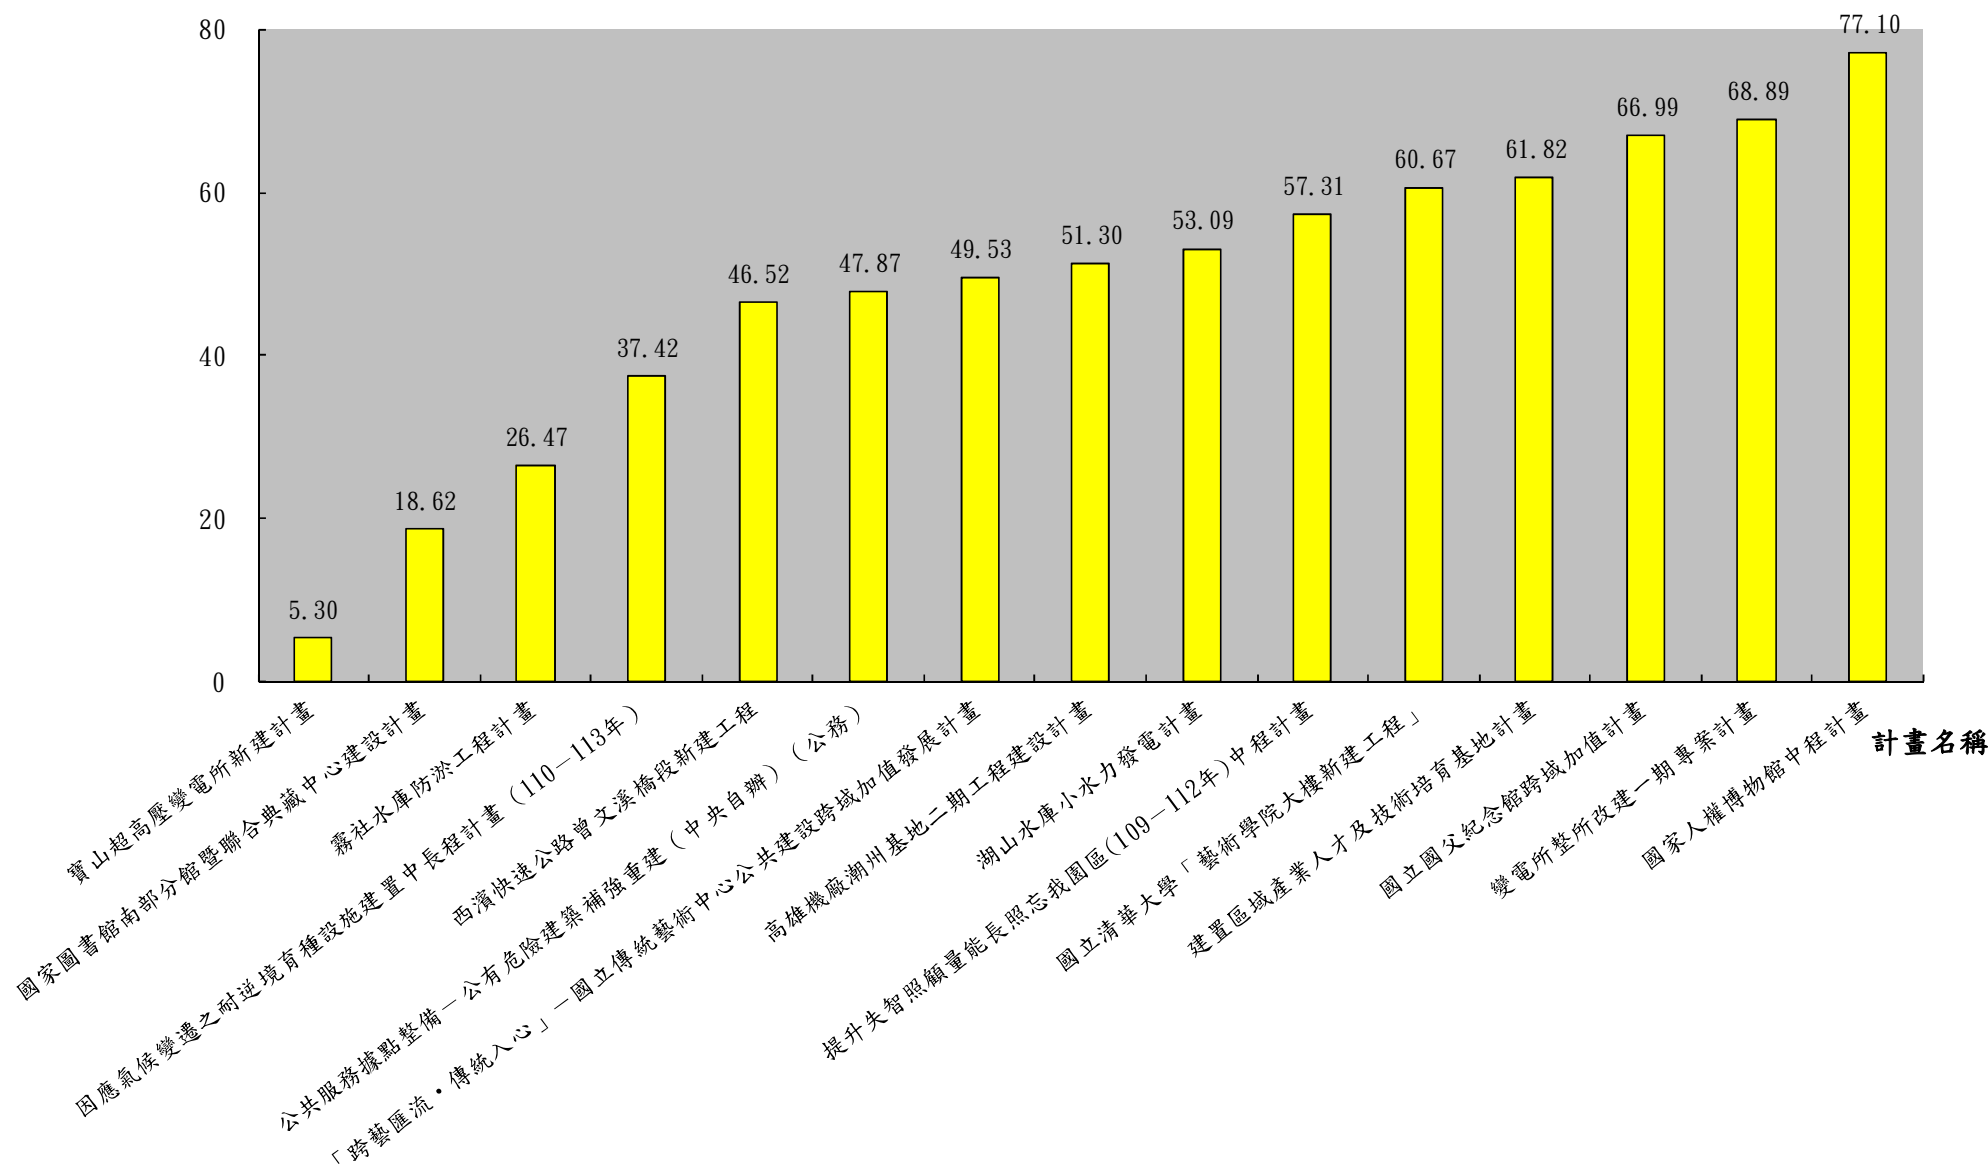

附圖 3

111 年度公共工程委員會列管 5 千萬元以上公共建設計畫 總分配經費執行率未達 80%計畫明細

111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

經費執行率%

