

中 央 政 府
易 淹 水 地 區 水 患 治 理 計 畫
第 2 期 特 別 決 算 審 核 報 告

中 華 民 國 97 年 度 至 99 年 度

審 計 部

中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別決算審核報告

中華民國 97 年度至 99 年度

審計長 林慶隆

前 言

中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別決算，行政院於民國 100 年 4 月 29 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為加速治理易淹水地區水患及治山防洪，保障人民生命財產安全，提升當地居民生活品質，並保育優質水環境，行政院依據「水患治理特別條例」第 4 條：「中央政府依本條例支應解決易淹水地區水患治理計畫所需經費上限為新臺幣一千一百六十億元，以特別預算方式編列，得分期辦理預算籌編及審議…。」之規定，接續第 1 期特別預算實施年度，編列中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別預算，執行期間自民國 97 至 99 年度止，分 3 個年度實施。

中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別預算，歲入未編列預算，歲出預算數 445 億元，決算審核結果，審定歲入實現數 1 億 4 千 6 百餘萬元；歲出決算經修正減列 1,504 萬餘元，審定歲出實現數 332 億 1 千 9 百餘萬元，應付保留數 102 億 8 千 2 百餘萬元，合計決算審定數為 435 億 2 百餘萬元，歲入歲出差短 433 億 5 千 5 百餘萬元，經舉借債務 344 億 2 百餘萬元支應，並配合歲出經費之保留，繼續保留債務之舉借預算 89 億 5 千 3 百餘萬元，以支應以後年度需要。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，提請 審議。

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算審核報告
中華民國97年度至99年度

目 錄

前 言

甲、總述.....	1
壹、預算執行之審核.....	1
貳、計畫實施之考核.....	3
參、重要審核意見.....	4
乙、最終審定數額表.....	16
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表.....	16
貳、審定後收支簡明比較分析表.....	17
參、融資調度決算審定表.....	18
丙、平衡表之查核.....	19
丁、其他附表.....	20
壹、歲入來源別決算審定表.....	20
貳、歲出政事別決算審定表.....	22
參、歲出機關別決算審定表.....	24
肆、歲出決算修正數明細表.....	26

甲、總 述

壹、預算執行之審核

中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別預算，歲入未編列預算，歲出預算編列 445 億元，歲入歲出差短 445 億元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核情形說明如次：

一、歲入部分

歲入未編列預算，決算審核結果，審定實現數 1 億 4 千 6 百餘萬元，主要係土石標售收入。

二、歲出部分

歲出預算 445 億元，決算審核結果，審定實現數 332 億 1 千 9 百餘萬元(74.65%)，應付保留數 102 億 8 千 2 百餘萬元(23.11%)，合計決算審定數為 435 億 2 百餘萬元，預算賸餘 9 億 9 千 7 百餘萬元(2.24%)。茲將各主管機關預算執行情形分述如次：

(一) 內政部主管：預算數 35 億 2 千萬元，決算審核結果，修正減列實現數 1,504 萬餘元，主要係減列補助地方政府之工程經費結餘；審定實現數 28 億 3 千 5 百餘萬元(80.56%)，應付保留數 2 億 8 千 8 百餘萬元(8.20%)，主要係部分工程因地下管線遷移及施工過程受地質因素等影響工進，相關經費繼續保留。合計決算審定數為 31 億 2 千 4 百餘萬元，預算賸餘 3 億 9 千 5 百餘萬元(11.24%)，主要係營繕工程及補助計畫經費結餘。

(二) 經濟部主管：預算數 278 億 8 千萬元，決算審核結果，審定實現數 186 億 2 千 6 百餘萬元(66.81%)，應付保留數 89 億 2 千 4 百餘萬元(32.01%)，主要係縣市管區域排水治理及應急工程合約期程

跨越年度或驗收未完成，及工程用地取得尚在執行中，相關經費繼續保留。合計決算審定數為 275 億 5 千 1 百餘萬元，預算賸餘 3 億 2 千 8 百餘萬元(1.18%)，主要係委辦、補助計畫或營繕工程經費之結餘。

(三) 農業委員會主管：預算數 131 億元，決算審核結果，審定實現數 117 億 5 千 7 百餘萬元(89.75%)，應付保留數 10 億 6 千 9 百餘萬元(8.16%)，主要係農田排水及治山防洪等工程合約期程跨越年度，相關經費繼續保留。合計決算審定數為 128 億 2 千 6 百餘萬元，預算賸餘 2 億 7 千 3 百餘萬元(2.09%)，主要係營繕工程經費之結餘。

中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別預算歲出部分執行情形表

民國 97 年 1 月 1 日至民國 99 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	實 現 數		計畫執行進度落後原因
		金額	%	
合 計	44,500	33,219	74.65	
內政部主管	3,520	2,835	80.56	
經濟部主管	27,880	18,626	66.81	主要係第 1 階段與第 2 階段工程同時進行，及受莫拉克颱風影響，各工程執行單位工作量增加，影響計畫整體進度。
農業委員會主管	13,100	11,757	89.75	

三、融資調度部分

債務之舉借預算數 445 億元，決算審核結果，修正減列保留數 1,504 萬餘元，係配合歲出之修正，同額減列待舉借數，審定實現數 344 億 2 百餘萬元(77.31%)，保留數 89 億 5 千 3 百餘萬元(20.12%)，係配合未來各項工程資金需求，仍須保留部分融資預算於以後年度繼續執行。合計決算審定數 433 億 5 千 5 百餘萬元，較預算減少 11 億 4 千 4 百餘萬元(2.57%)。

貳、計畫實施之考核

政府為賡續辦理水患治理計畫，編列中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算，執行期間自民國97至99年度止，主要係辦理易淹水地區雨水下水道興建、改善工程；縣市管河川、區域排水疏濬清淤、整體規劃及治理，暨其上游集水區及坡地水土保持、地質調查與資料庫建置；事業海堤之規劃與整治；農田水利會所轄涉及縣市管河川水系、區域排水系統之農田排水改善；原住民鄉鎮、重大土石災害區及其相關影響範圍治山防洪之規劃、設計及工程建設等，經編列8項工作計畫，分由經濟部水利署、中央地質調查所、內政部營建署、農業委員會及所屬水土保持局等5個機關執行。截至民國99年底止，除經濟部中央地質調查所辦理之地質調查及資料庫建置已執行完成外，餘7項工作計畫均尚待以後年度繼續執行，原因詳「壹、預算執行之審核」說明。茲將執行情形表列如次：

易淹水地區水患治理計畫第2階段實施計畫工作項目執行情形簡表

執 行 機 關	項 目	預定辦理標案(件)數	完成標案(件)數	完成比率(%)
經 濟 部 水 利 署	規 劃	95	87	91.58
	治 理 工 程	210	52	24.76
	應 急 工 程	657	580	88.28
	疏 濬 清 淤	420	414	98.57
經濟部中央地質調查所	地 質 調 查	15	15	100.00
內 政 部 營 建 署	治 理 工 程	116	96	82.76
	應 急 工 程	43	40	93.02
農 業 委 員 會 及所屬水土保持局	規 劃	77	70	90.91
	治 理 工 程	1,506	1,431	95.02
	應 急 工 程	258	253	98.06

資料來源：依據各執行機關提供資料彙整。

叁、重要審核意見

一、水患治理工作已漸次完成並發揮功效，惟計畫規劃及執行過程仍有未臻周妥，亟待檢討改善。

政府為加速治理易淹水地區水患及治山防洪，保障人民生命財產安全，分8年以特別預算方式籌措新臺幣1,160億元，改善淹水問題，民國97至99年度接續第1期特別預算實施年度，編列中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算，歲出預算445億元，執行結果，該計畫已完成或正執行中之多項工程，於颱風期間已發揮功效，惟查執行情形，仍有：(一)辦理計畫主要工作治理工程，迄未妥適解決用地取得、人力不足、管線遷移等執行困難問題，肇致進度落後，應付保留數高達102億8千2百餘萬元，占預算數23.11%；(二)中央執行機關及計畫推動小組未有效發揮特別條例賦予整治計畫之推動、執行及督導、管制考核等功能，落實辦理計畫推動相關之審議作業，積極督促縣(市)政府落實優先執行疏濬及應急工程，並即時協助解決執行過程遭遇之困難，影響預期防洪目標之達成及工程執行時效；(三)未慎酌經費資源有限，一再擴增治理範圍，致使計畫執行偏離以系統性整治之目的；(四)補助經費遭部分縣庫先行調用，應付廠商工程款項延遲撥付，損及政府信譽與形象等缺失，經分別通知各相關機關檢討改善。據復：各機關將積極改善，落實執行。

二、經費資源未擴增卻一再擴大治理範圍，致計畫執行偏離系統性整治目的。

行政院民國 95 年 5 月 3 日核定之「易淹水地區水患治理計畫」明載，計畫範圍包括縣(市)管河川 21 條水系、縣(市)管區域排水 115 條系統及縣(市)管事業海堤 5 處；所需工程費 574 億元，以流域整體規劃、治理工程及管理等手段，期有效降低易淹水地區之水患威脅。經查經濟部於計畫核定後，為因應地方民意反映，經各縣(市)政府調查後表示原核定計畫範圍外，尚有部分縣(市)管河川及縣(市)管區域排水，因確有水患之事實亟須治理，報經行政院分別於民國 96 年 6 月 27 日、同年 10 月 31 日、民國 98 年 5 月 25 日、民國 99 年 4 月 22 日及同年 11 月 30 日核定增辦(表 1)，將計畫範圍治理水系數目由原訂 141 條水系(系統、處)擴增為 295 條水系(系統、處)。據該部水利署統計，截至民國 99 年底止，僅以已完成整體規劃之 200 條水系(系統、處)，所需改善經費 3,440 億元，為計畫原預計治理經費之 599.3%，顯難於計畫核定經費數額內，達成原規劃系統性整治目的，如前臺南縣港尾溝溪排水系統，規劃分 10 件工程辦理整治，僅 6 件工程完工或執行中，其餘 4 件，囿於經費資源分配，仍無確切實施進程，經函請經濟部水利署通盤檢討，妥慎規劃，將有限資源作最有效之配置。據復：易淹水地區水患治理計畫推動小組業於民國 99 年 9 月 1 日召開會議決議，後續除特殊原因需求外，原則不再受理增辦水系，惟於第 3 階段(100-102 年)實施計畫，將考量編列經費協助地方政府加強辦理減災避洪等非工程措施，以減少受災程度。

表 1 易淹水地區水患治理計畫實施範圍增刪情形簡表

項 目	原計畫範圍(行政院95年5月3日核定之易淹水地區水患治理計畫)	第1次增辦範圍(行政院96年6月27日院臺經字第0960029351號函)	第2次增辦範圍(行政院96年10月31日核定之第2階段實施計畫)	第3次增辦範圍(行政院98年5月25日院臺經字第0980027175號函)	第4次增辦範圍(行政院99年4月22日核定之易淹水地區水患治理計畫修正計畫)	第5次增辦範圍(行政院99年11月30日院臺經字第0990066117號函)	刪除非屬縣市管範圍(行政院96年11月2日核定之第1階段實施計畫修正計畫)	總 計
合 計	141	51	85	3	5	13	-3	295
縣 市 管 河 川 (單位:水系)	21	4	10	0	0	0	0	35
縣 市 管 區 域 排 水 (單位:系統)	115	47	75	3	5	13	-2	256
縣 市 管 海 堤 (單位:處)	5	0	0	0	0	0	-1	4

資料來源：依據行政院函示及易淹水地區水患治理計畫、修正計畫、第1階段實施計畫修正計畫及第2階段實施計畫書內容整理。

三、經濟部水利署治理工程堤頂高程低於治理規劃標準，致通洪斷面不足，潛存洪災風險，有待檢討改善。

「易淹水地區水患治理計畫第2階段（97-99年）實施計畫」參、四、（二）治理工程載明，第2階段實施計畫比照第1階段實施計畫，對尚未完成整體規劃水系酌編工程經費，俾能於規劃完成時立即提列工程辦理，早日消弭水患；惟相關工程應依據具體規劃成果辦理，並經審查小組核定及推動小組備查後辦理，且須與日後整體規劃成果吻合。復依「易淹水地區水患治理計畫審查作業要點」第9點規定略以，治理規劃報告審查程序，由各執行機關先依核定執行計畫書完成治理規劃報告，送中央執行機關審議，再經審查小組召開會議審查同意後，報推動小組備查，並報經濟部核定。經查經濟部水利署依上開尚未完成整體規

劃，仍酌編工程經費原則，辦理彰化縣石筍排水及麻剪溝排水改善等 5 件工程，實際執行結果，計有 6 處斷面實際竣工之堤頂高程低於核定之治理計畫堤頂高程標準，誤差值介於 3 至 14 公分不等(表 2)，致排水通洪斷面不足，顯示該署執行第 1 及第 2 階段實施計畫治理工程，未能確實依據規劃成果辦理，且於其後審議規劃報告或治理計畫過程，亦未能參照工程實際竣工情形，妥適檢討處理，致工程竣工結果，與整體規劃成果未合，經函請該署妥適檢討計畫推動各作業階段審議作業，研謀具體改進措施。據復：已函請所屬各河川局針對第 1 階段及第 2 階段實施計畫之竣工工程全面檢核，並就堤高不足部分，於後續工程辦理改善，嗣後辦理治理計畫審議時，將加強與原規劃報告作檢核。

表 2 實際竣工圖堤頂高與核定治理計畫堤頂高對照表


單位：公尺

累 距	治理計畫 核定日期	工 程 名 稱	開工日期	竣工日期	治理計畫堤頂高	竣工圖堤頂高	誤 差 值
10K+400	98.04.17	石筍排水改善 工程(一工區)	97.07.23	98.08.31	15.84	15.70	-0.14
10K+600					16.05	15.96	-0.09
11K+000		石筍排水改善 工程(二工區)	98.09.14	99.08.07	16.56	16.50	-0.06
11K+526					16.93	17.20	0.27
11K+800		石筍排水改善 工程(三工區)	97.07.16	98.06.30	17.72	17.68	-0.04
12K+400					18.18	18.23	0.05
12K+800		石筍排水改善 工程(四工區)	98.09.14	99.09.08	18.64	18.91	0.27
13K+020					19.35	19.32	-0.03
0K+000	98.04.17	麻剪溝排水改善 工程(一工區)	96.11.11	98.09.24	4.84	4.75	-0.09

資料來源：依據經濟部水利署提供之治理計畫書暨竣工圖資料整理。

四、經濟部水利署執行進度迭有落後情事，所提增加執行量能等改善措施成效未彰，影響計畫執行進度與成效。

經濟部水利署為持續辦理易淹水地區水患治理計畫，於該計畫第 2 期特別預算續編列 275 億 6 千 7 百餘萬元，其中由該署各河川局及委託地方政府執行之治理工程經費 213 億 8 千 2 百餘萬元，占整體預算經費之 77.56%，為該階段實施計畫主要工作，其執行良窳，攸關整體計畫推動執行成效。次查，該計畫第 1 階段實施期間，迭因工程用地取得不易、人力不足、委外辦理規劃設計量超出市場胃納量等問題，導致計畫執行進度落後，嗣以增加僱用人員、對公私部門規劃設計工作人員實施教育講習，以提高工作效率等措施改善，惟第 2 階段實施計畫仍因前述相同落後事由一再重複發生，致工程進度落後或中輟，耽延治理進度，據該署統計，迄民國 99 年底止，應辦之 290 件治理工程，實際完工者僅 52 件，占 17.93%；至未完工之 154 件治理工程，計有 17 件工程因用地取

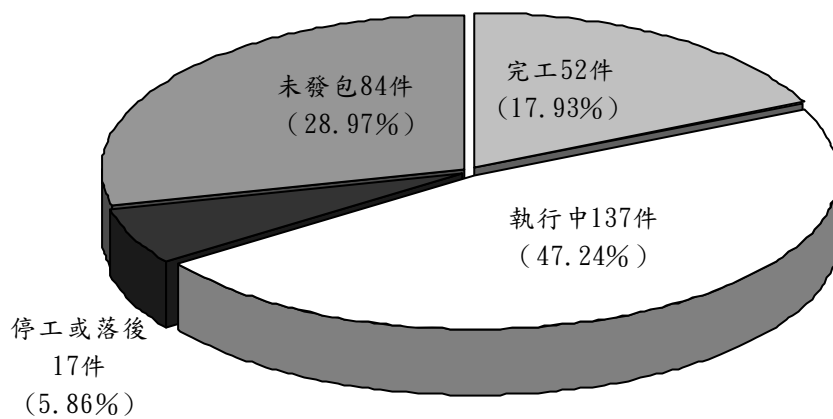

資料來源：依據經濟部水利署提供資料整理。

治理工程執行件數及比率圖

得、管線遷移協調等問題，工程處於停工或落後狀態；餘 84 件工程尚未發包（如左圖），經函請該署檢討研謀改善措施，以達預期治水成效。據復：將加強控管工程執行進度，並於每月召開之專案小

組會議中，討論及追蹤計畫工程辦理情形，涉及縣（市）政府辦理部分，另請各河川局於溝通平台會議進行檢討，再輔以工程督導或專案督導方

式，督促及協助嚴重落後或停工中工程之執行進度，且要求各河川局及縣市政府嗣後辦理治理工程時，應於施工前 1 年即辦理用地取得先期作業以為因應。

五、經濟部水利署未覈實辦理計畫提報及審議作業，延宕治理工程作業時效。

依「水患治理特別條例」第 2 條規定，該條例之中央主管機關為經濟部；「易淹水地區水患治理計畫推動小組設置與作業辦法」第 2 條及第 7 條規定，經濟部為辦理該條例規定之易淹水地區水患治理計畫之審查、督導、管制考核、政策協調等事項，設置易淹水地區水患治理計畫推動小組，由水利署辦理幕僚作業；復依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」第 4 項規定，該署所屬各河川局應於每一階段實施計畫預定實施之前，研提工程執行計畫書送水利署，並經該署彙整提經推動小組審查通過後，報經濟部核定。查經濟部水利署第四及第五河川局為辦理「溪湖埔鹽排水出口改道工程（250 公尺）」等 5 件治理工程（契約金額 2 億 2 千 8 百餘萬元，表 3），先後於民國 96 及 98 年度提具工程執行計畫書送水利署彙整提經推動小組審查，案內工程所需經費，係以民國 95 及 96 年度辦理規劃時期之物價概估，惟該等河川局於執行計畫書提報過程，未能妥依市場環境差異，迅速反映物價調整，復有基礎地盤改良等工作項目未納入考量，或設計未臻周延等情，肇致各該工程完成細部設計後，發現已核定之經費不敷實需，乃費時另籌經費，及研商縮減、修訂工程內容，始繼續辦理後續工程事宜，致新塹排水及溪湖埔鹽排水等 5 件工程均逾完工期限，遲未完成，均顯該等河川局研具之治水工程執行計畫書，有未盡周延之處，又推動小組審議作業亦未盡落實，均影響工程執行時效，經函請經濟部水利署檢討。據復：將請各河川局研提工程執行

計畫書時審慎估列所需經費，易淹水地區水患治理計畫推動小組亦將加強審核，避免影響治理工程作業時效。

表 3 彰化縣溪湖埔鹽及嘉義縣新塭排水治理工程明細表

執行單位	標案名稱	原定完工期限	契約金額
合	計		2億2,898萬元
第四河川局	溪湖埔鹽排水出口改道工程(250公尺)併辦土石標售	99.12	5,488萬元
第五河川局	新塭排水滯洪池連接水路及龍宮溪排水之縣水路改善工程(第二期A標)	97.12	6,040萬元
	新塭排水村落水門及抽水機改善工程(第二期B標)	97.12	4,200萬元
	新塭排水支線及直線改善工程(第二期C標)	97.12	3,700萬元
	新塭排水支線出口整治及抽水站改善工程(第二期D標)	97.12	3,470萬元

資料來源：依據經濟部水利署提供資料整理。

六、經濟部水利署未有效督促地方政府加速執行疏濬清淤及應急工程，潛存洪災風險。

經濟部於民國 97 至 99 年度間，核定疏濬清淤工程 420 件（契約金額 7 億 3 千 8 百餘萬元），及應急工程 657 件（契約金額 46 億 7 千 6 百餘萬元），經函請各受補助縣（市）政府於各該核定年度汛期前完成，且民國 99 年度核定辦理案件，至遲應於民國 99 年 6 月底前完工，以利於汛期間發揮成效。惟查該等工程執行結果，各受補助縣（市）政府或因辦理委外設計作業費時、工程招標多次流標，或因施工期間發現岩盤無法施作等問題，影響工進，經濟部水利署雖每月召集計畫專案小組會議列管督導，惟未能適時針對執行之困難癥結，有效協助地方政府解決，截至民國 99 年底止，仍有 6 件疏濬清淤及 77 件應急工程尚未完成（表 4），經函請經濟部水利署積極督導協助各受補助縣（市）政府針對執行

延宕問題癥結，妥適解決，加速辦理。據復：嗣後將加強工程核定前之審查作業與核定後之考核作業，並通函各河川局加強督導轄區縣（市）政府，針對執行延宕問題癥結妥適解決，並請各縣（市）政府配合辦理，以有效改善遭遇之執行困難問題。

表 4 易淹水地區水患治理計畫第 2 階段實施計畫
各地方政府疏濬及應急工程執行情形表
截至民國 99 年底止

縣 市 別	疏 濬 工 程			應 急 工 程		
	工 程 件 數	尚 未 完 工 件 數	%	工 程 件 數	尚 未 完 工 件 數	%
合 計	420	6	1	657	77	12
宜 蘭 縣	13	0	0	13	3	23
基 隆 市	2	0	0	0	0	0
前 臺 北 縣	5	0	0	2	1	50
桃 園 縣	6	0	0	13	0	0
新 竹 縣	18	0	0	14	0	0
新 竹 市	5	0	0	2	0	0
苗 栗 縣	23	0	0	29	1	3
前 臺 中 縣	3	0	0	14	0	0
南 投 縣	7	0	0	15	0	0
彰 化 縣	55	0	0	103	10	10
雲 林 縣	51	0	0	143	20	14
嘉 義 縣	41	0	0	67	14	21
嘉 義 市	0	0	0	2	0	0
前 臺 南 縣（市）	67	2	3	126	17	13
前 高 雄 縣	36	0	0	37	3	8
屏 東 縣	58	4	7	42	6	14
臺 東 縣	7	0	0	10	1	10
花 蓮 縣	11	0	0	14	0	0
澎 湖 縣	7	0	0	8	0	0
金 門 縣	5	0	0	3	1	33

資料來源：依據經濟部水利署提供資料整理。

七、治水經費遭部分縣庫先行調借，應付廠商之工程款項延遲撥付。

依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」第 8 項規定：「本計畫本署撥付各縣（市）政府各項工程、計畫經費應專款專用支用於核准之各項工程，不得移作他用。」經查經濟部水利署民國

98 年度補助前臺中縣政府辦理「太平市中山路二段與大興路口淹水改善應急工程」等 11 件疏濬清淤及應急工程（核定經費 1 億 5 千 2 百餘萬元），截至民國 99 年底止，經統計有「龍井大排水系護岸改善應急工程」等 5 案（表 5），業向該署申撥補助款並獲核撥入庫，惟遭縣庫調用先行支付其他款項，致該等工程款雖已開立付款憑單，惟未能依「公款支付時限及處理應行注意事項」規定天數撥付各鄉（鎮、市）公所，延遲撥付款項達 24 至 106 天，金額計 7,253 萬餘元，經函請經濟部水利署督促地方政府依規定辦理，以確保治水預算專款專用。據復：將於相關會議中加強宣導，並針對曾有延遲撥款情事之縣（市）政府，列為日後核定補助款之參考。

表 5 前臺中縣政府辦理易淹水地區水患治理計畫
延遲撥付款項明細表
截至民國 99 年底止

單位：新臺幣元

應急或疏濬工程名稱	付款憑單 開立日期	付款金額	受款人	付款日期	撥款天數
合 計		72,537,596			
龍井大排水系護岸改善應急工程	99.03.16	28,000,000	龍井鄉公所	99.06.01	77
太平市中山路二段與大興路口淹水改善應急工程	99.02.26	6,198,670	太平市公所	99.03.25	27
		10,000,000		99.04.22	55
		10,000,000		99.04.08	41
太平市太平二圳淹水改善應急工程	99.02.26	5,760,000	太平市公所	99.06.10	104
梧棲鎮安良港大排疏濬清淤工程	99.07.09	6,717,924	梧棲鎮公所	99.08.02	24
龍井大排水系護岸改善應急工程	99.08.25	5,861,002	龍井鄉公所	99.12.09	106

資料來源：依據前臺中縣政府提供資料整理。

八、農業委員會水土保持局特別預算編列及執行排擠水土保持發展公務預算，不符「水患治理特別條例」附帶決議。

依據立法院審查「水患治理特別條例」附帶決議(一)6.規定，本特別預算不能排擠一般公務預算編列執行。查農業委員會水土保持局所屬臺東及花蓮分局，有關水土保持發展(不含農村風貌計畫)經費占各該分局年度預算之比率，民國 93 至 95 年度平均介於 10%至 17%之間，民國 95 年 5 月中央政府易淹水地區水患治理計畫第 1 期特別預算經立法院審議通過後，民國 96 年度隨即降至 8%以下，又民國 98 及 99 年度，花蓮分局之水土保持發展經費占各該年度預算之比率降至 2.22%及 5.64%，臺東分局則僅 0.69%及 0.66%（表 6），顯示因易淹水地區水患治理計畫特別預算開始執行，嚴重排擠各該地區水土保持發展公務預算之編列及執行，不符立法院附帶決議，經函請農業委員會檢討改善。據復：近年來推動整體治山防災業務之公務預算編列遠不及中長程規劃額度，爾後編列公務預算將極力爭取經費，並依立法院審查「水患治理特別條例」附帶決議，注意預算分配之均衡性，避免發生類似情形。

表 6 水土保持發展經費占各該年度比率

單位：新臺幣千元

年 度	臺 東 分 局		花 蓮 分 局	
	經 費	%	經 費	%
93	458,714	17.44	315,528	11.99
94	288,490	13.13	245,061	11.15
95	229,528	12.50	188,064	10.24
96	53,651	7.54	32,485	4.56
97	35,152	3.68	28,206	2.96
98	7,337	0.69	23,556	2.22
99	2,910	0.66	25,023	5.64

資料來源：依據農業委員會水土保持局提供資料整理。

九、農業委員會執行易淹水地區農田排水設施改善工程存有缺失，有待檢討改進。

行政院農業委員會辦理「農田排水」計畫，編列歲出預算數 20 億元，補助各區農田水利會辦理易淹水地區農田排水設施改善，實際支用經費 15 億 8 千 1 百餘萬元，經查執行情形，間有：(一) 工程契約項目及數量錯誤，致變更設計頻仍，延宕工期；(二) 未考量整體功效而減作應作項目，規劃設計欠周延；(三) 未依規定辦理工程履約管理作業等缺失，經函請農業委員會檢討改善。據復：(一) 已要求各承辦人員確實覆核工程數量，避免類似情形再度發生；(二) 嗣後於設計前召開地方說明會時，將加強與當地民眾溝通，考量整體功效；(三) 已要求各承辦人員及監造單位審慎處理，確實依規定詳實檢查並填寫檢查表。

十、農業委員會水土保持局山坡地水土保持及治山防洪計畫採購作業頻生缺失，影響計畫執行成效。

農業委員會水土保持局辦理「水土保持」與「治山防洪」計畫，編列歲出預算數 111 億元，實際支用經費 101 億 7 千 5 百餘萬元，經查執行情形，核有：(一) 工程未能取得用地即先行發包，致取消全部或部分項目施作，造成設計費浪費，並影響設施安全及整體治理成效；(二) 辦理與治水無關之設施，違反「水患治理特別條例」附帶決議；(三) 工程契約編列無施作項目之檢驗費用；(四) 部分工程履約過程未覈實依照契約規定要求承商提具試驗報告或施工資料；(五) 工程契約項目及數量錯誤，致須辦理變更設計；(六) 工程逾期完工，影響計畫執行成效等缺失，經函請農業委員會檢討改善。據復：(一) 嗣後於工程設計前先與在地民

眾充分溝通，及時瞭解地方需求及解決用地問題，俾防杜類似情形再發生；(二)爾後當注意符合計畫用途；(三)合約檢驗費項目已刪除；(四)已補送試驗報告，並依契約扣罰監造單位服務費；(五)已依契約對監造單位扣罰服務費，將加強核對工程數量計算式，避免類似情形再發生；(六)已依契約規定計算逾期違約金。

十一、農業委員會水土保持局治山防洪構造物未落實巡查及維護管理，已毀損設施亦未善盡修復並完成財產減帳程序之責。

農業委員會水土保持局民國 97 年度委外辦理「兔和山南等集水區復建規劃」案，經規劃單位調查計畫區內歷年完成工程之現況，即發現下竹林農路改善工程等 6 件工程，於民國 96 年聖帕颱風及民國 97 年卡玫基颱風侵襲後，功能受損，惟截至民國 100 年 4 月底止仍未修復。又該局於民國 98 年 8 月莫拉克颱風前完工之「絲麻吉他野溪整治工程」等 9 件水患治理工程，均已遭沖毀或土砂掩埋，喪失防洪功能，惟僅 1 件工程辦理減帳，亦未落實工程養護及巡查制度，覈實辦理構造物健康檢查，致已毀損者仍列為正常良好，未能適時修復處理，顯示財產管理作業未盡周全，影響山坡地安全等缺失，經函請農業委員會督促檢討改善。據復：已請各承辦單位提供財產減帳資料及修護情形，辦理減帳，另為落實工程養護及巡查制度，將於各次會議中加強對各縣市政府提示及宣導治山防災構造物養護巡查之重要性，如發現構造物毀損，儘速通報，以利後續修復工作，確保山坡地安全。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

乙、最終審定數額表

壹、中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

中華民國 97 年度至 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
			金 額	占總數%	金 額	%	金 額	%
一、歲 入 合 計	—	146,537,651.00	146,537,651.00	100.00	+ 146,537,651.00	—	—	—
(一)罰款及賠償收入	—	26,066,692.00	26,066,692.00	17.79	+ 26,066,692.00	—	—	—
(二)財產收入	—	120,110,558.00	120,110,558.00	81.96	+ 120,110,558.00	—	—	—
(三)其他收入	—	360,401.00	360,401.00	0.25	+ 360,401.00	—	—	—
二、歲 出 合 計	44,500,000,000.00	43,517,370,292.00	43,502,325,179.00	100.00	- 997,674,821.00	2.24	- 15,045,113.00	0.03
(一)經濟發展支出	40,980,000,000.00	40,377,882,516.00	40,377,882,516.00	92.82	- 602,117,484.00	1.47	—	—
(二)社區發展及環境 保護支出	3,520,000,000.00	3,139,487,776.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
三、歲 入 歲 出 餘 絀	-44,500,000,000.00	-43,370,832,641.00	-43,355,787,528.00	100.00	+ 1,144,212,472.00	2.57	+ 15,045,113.00	0.03

貳、中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算審定後收支簡明比較分析表

中華民國 97 年度至 99 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		原 列 決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預算數比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收 入 合 計	44,500,000,000.00	100.00	43,517,370,292.00	100.00	43,502,325,179.00	100.00	- 997,674,821.00	2.24
(一)歲 入	—	—	146,537,651.00	0.34	146,537,651.00	0.34	+ 146,537,651.00	—
(二)債務之舉借	44,500,000,000.00	100.00	43,370,832,641.00	99.66	43,355,787,528.00	99.66	- 1,144,212,472.00	2.57
二、支 出 合 計	44,500,000,000.00	100.00	43,517,370,292.00	100.00	43,502,325,179.00	100.00	- 997,674,821.00	2.24
歲 出	44,500,000,000.00	100.00	43,517,370,292.00	100.00	43,502,325,179.00	100.00	- 997,674,821.00	2.24

丙、平衡表之查核

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算平衡表原列民國99年12月31日之資產及負債總額各為11,907,874,405元，經審核修正減列歲出決算數15,045,113元，並同額增列平衡表資產及餘絀科目，暨配合歲出之修正，同額減列應收賒借收入，決算審定後之資產及負債總額各為11,907,874,405元，茲列表如次：

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
暫 付 款	2,939,736,298.00		應 付 歲 出 款	2,887,769,541.00	
應 收 賒 借 收 入	6,468,138,107.00		應 付 歲 出 保 留 款	7,395,119,495.00	
應 收 公 債 收 入	2,500,000,000.00		短 期 借 款	1,624,985,369.00	
原 列 資 產 總 額		11,907,874,405.00	原 列 負 債 總 額		11,907,874,405.00
			調 整 後 負 債 總 額		11,907,874,405.00
			餘 絀 部 分		
			原 列 餘 絀 總 額		0.00
本部審核修正決算應調整數		0.00	本部審核修正決算應調整數		0.00
減 列 歲 出 實 現 數	15,045,113.00		減 列 歲 出 應 調 整 數	15,045,113.00	
減列應收賒借收入科目 無 需 舉 借 部 分	- 15,045,113.00		減列應收賒借收入應調整數	- 15,045,113.00	
			調 整 後 餘 絀 總 額		0.00
調 整 後 資 產 總 額		11,907,874,405.00	調 整 後 負 債 及 餘 絀 總 額		11,907,874,405.00

丁、其他

壹、中央政府易淹水地區水患治理計畫

中華民國 97 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
				總 計	—	146,537,651.00	—	—	146,537,651.00
1				罰款及賠償收入	—	26,066,692.00	—	—	26,066,692.00
	1			水利署及所屬	—	26,061,832.00	—	—	26,061,832.00
		1		賠 償 收 入	—	26,061,832.00	—	—	26,061,832.00
			1	一般賠償收入	—	26,061,832.00	—	—	26,061,832.00
2				中央地質調查所	—	4,860.00	—	—	4,860.00
		1		賠 償 收 入	—	4,860.00	—	—	4,860.00
			1	一般賠償收入	—	4,860.00	—	—	4,860.00
2				財 產 收 入	—	120,110,558.00	—	—	120,110,558.00
	1			水利署及所屬	—	120,110,558.00	—	—	120,110,558.00
		1		財 產 售 價	—	120,110,558.00	—	—	120,110,558.00
			1	動 產 售 價	—	120,110,558.00	—	—	120,110,558.00
3				其 他 收 入	—	360,401.00	—	—	360,401.00
	1			水利署及所屬	—	360,401.00	—	—	360,401.00
		1		雜 項 收 入	—	360,401.00	—	—	360,401.00
			1	其他雜項收入	—	360,401.00	—	—	360,401.00

附表

第 2 期特別決算歲入來源別決算審定表

至 99 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
146,537,651.00	—	—	146,537,651.00	100.00	146,537,651.00	—	—	—
26,066,692.00	—	—	26,066,692.00	17.79	26,066,692.00	—	—	—
26,061,832.00	—	—	26,061,832.00	17.79	26,061,832.00	—	—	—
26,061,832.00	—	—	26,061,832.00	17.79	26,061,832.00	—	—	—
26,061,832.00	—	—	26,061,832.00	17.79	26,061,832.00	—	—	—
4,860.00	—	—	4,860.00	0.00	4,860.00	—	—	—
4,860.00	—	—	4,860.00	0.00	4,860.00	—	—	—
4,860.00	—	—	4,860.00	0.00	4,860.00	—	—	—
120,110,558.00	—	—	120,110,558.00	81.97	120,110,558.00	—	—	—
120,110,558.00	—	—	120,110,558.00	81.97	120,110,558.00	—	—	—
120,110,558.00	—	—	120,110,558.00	81.97	120,110,558.00	—	—	—
120,110,558.00	—	—	120,110,558.00	81.97	120,110,558.00	—	—	—
360,401.00	—	—	360,401.00	0.24	360,401.00	—	—	—
360,401.00	—	—	360,401.00	0.24	360,401.00	—	—	—
360,401.00	—	—	360,401.00	0.24	360,401.00	—	—	—
360,401.00	—	—	360,401.00	0.24	360,401.00	—	—	—

貳、中央政府易淹水地區水患治理計畫

中華民國 97 年度

科 目			預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1		總 計	44,500,000,000.00	33,234,481,256.00	2,887,769,541.00	7,395,119,495.00	43,517,370,292.00
		(1. 經濟發展支出)	40,980,000,000.00	30,383,598,683.00	2,887,769,541.00	7,106,514,292.00	40,377,882,516.00
		農 業 支 出	40,980,000,000.00	30,383,598,683.00	2,887,769,541.00	7,106,514,292.00	40,377,882,516.00
	1	水 利 署 及 所 屬	27,567,700,000.00	18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00
	1	河川排水及事業海堤改善	27,567,700,000.00	18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00
	2	中 央 地 質 調 查 所	312,300,000.00	304,436,611.00	—	—	304,436,611.00
	1	地質調查及資料庫建置	312,300,000.00	304,436,611.00	—	—	304,436,611.00
	3	農 業 委 員 會	2,000,000,000.00	1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00
	1	農 業 發 展	2,000,000,000.00	1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00
	4	水 土 保 持 局	11,100,000,000.00	10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00
	1	水 土 保 持 發 展	11,100,000,000.00	10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00
		(2. 社區發展及環境保護支出)	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
	2	環 境 保 護 支 出	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
	1	營 建 署 及 所 屬	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
	1	下 水 道 管 理 業 務	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00

第 2 期特別決算歲出政事別決算審定表

至 99 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
33,219,436,143.00	2,887,769,541.00	7,395,119,495.00	43,502,325,179.00	100.00	- 997,674,821.00	2.24	- 15,045,113.00	0.03
30,383,598,683.00	2,887,769,541.00	7,106,514,292.00	40,377,882,516.00	92.82	- 602,117,484.00	1.47	—	—
30,383,598,683.00	2,887,769,541.00	7,106,514,292.00	40,377,882,516.00	92.82	- 602,117,484.00	1.47	—	—
18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00	62.63	- 321,109,789.00	1.16	—	—
18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00	62.63	- 321,109,789.00	1.16	—	—
304,436,611.00	—	—	304,436,611.00	0.70	- 7,863,389.00	2.52	—	—
304,436,611.00	—	—	304,436,611.00	0.70	- 7,863,389.00	2.52	—	—
1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00	4.19	- 179,137,297.00	8.96	—	—
1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00	4.19	- 179,137,297.00	8.96	—	—
10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00	25.30	- 94,007,009.00	0.85	—	—
10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00	25.30	- 94,007,009.00	0.85	—	—
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48

參、中央政府易淹水地區水患治理計畫

中華民國 97 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1				總 計	44,500,000,000.00	33,234,481,256.00	2,887,769,541.00	7,395,119,495.00	43,517,370,292.00
				內 政 部 主 管	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
			1	營 建 署 及 所 屬	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
			1	下 水 道 管 理 業 務	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
2			1	雨 水 下 水 道	3,520,000,000.00	2,850,882,573.00	—	288,605,203.00	3,139,487,776.00
				經 濟 部 主 管	27,880,000,000.00	18,626,283,690.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,551,026,822.00
			1	水 利 署 及 所 屬	27,567,700,000.00	18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00
			1	河川排水及事業海堤改善	27,567,700,000.00	18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00
			1	縣市管河川治理	2,129,400,000.00	1,548,497,496.00	131,726,761.00	358,253,582.00	2,038,477,839.00
			2	縣市管區域排水治理	25,389,300,000.00	16,726,179,604.00	2,419,630,705.00	6,014,910,237.00	25,160,720,546.00
			3	縣市管事業海堤改善	49,000,000.00	47,169,979.00	221,847.00	—	47,391,826.00
			2	中央地質調查所	312,300,000.00	304,436,611.00	—	—	304,436,611.00
3			1	地質調查及資料庫建置	312,300,000.00	304,436,611.00	—	—	304,436,611.00
				農 業 委 員 會 主 管	13,100,000,000.00	11,757,314,993.00	336,190,228.00	733,350,473.00	12,826,855,694.00
			1	農 業 委 員 會	2,000,000,000.00	1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00
			1	農 業 發 展	2,000,000,000.00	1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00
			1	農 田 排 水	2,000,000,000.00	1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00
			2	水 土 保 持 局	11,100,000,000.00	10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00
			1	水 土 保 持 發 展	11,100,000,000.00	10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00
			1	水 土 保 持	3,600,000,000.00	3,345,797,305.00	85,560,502.00	138,147,965.00	3,569,505,772.00
			2	治 山 防 洪	7,500,000,000.00	6,829,664,688.00	207,673,445.00	399,149,086.00	7,436,487,219.00

第 2 期特別決算歲出機關別決算審定表

至 99 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
33,219,436,143.00	2,887,769,541.00	7,395,119,495.00	43,502,325,179.00	100.00	- 997,674,821.00	2.24	- 15,045,113.00	0.03
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
2,835,837,460.00	—	288,605,203.00	3,124,442,663.00	7.18	- 395,557,337.00	11.24	- 15,045,113.00	0.48
18,626,283,690.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,551,026,822.00	63.33	- 328,973,178.00	1.18	—	—
18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00	62.63	- 321,109,789.00	1.16	—	—
18,321,847,079.00	2,551,579,313.00	6,373,163,819.00	27,246,590,211.00	62.63	- 321,109,789.00	1.16	—	—
1,548,497,496.00	131,726,761.00	358,253,582.00	2,038,477,839.00	4.68	- 90,922,161.00	4.27	—	—
16,726,179,604.00	2,419,630,705.00	6,014,910,237.00	25,160,720,546.00	57.84	- 228,579,454.00	0.90	—	—
47,169,979.00	221,847.00	—	47,391,826.00	0.11	- 1,608,174.00	3.28	—	—
304,436,611.00	—	—	304,436,611.00	0.70	- 7,863,389.00	2.52	—	—
304,436,611.00	—	—	304,436,611.00	0.70	- 7,863,389.00	2.52	—	—
11,757,314,993.00	336,190,228.00	733,350,473.00	12,826,855,694.00	29.49	- 273,144,306.00	2.09	—	—
1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00	4.19	- 179,137,297.00	8.96	—	—
1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00	4.19	- 179,137,297.00	8.96	—	—
1,581,853,000.00	42,956,281.00	196,053,422.00	1,820,862,703.00	4.19	- 179,137,297.00	8.96	—	—
10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00	25.30	- 94,007,009.00	0.85	—	—
10,175,461,993.00	293,233,947.00	537,297,051.00	11,005,992,991.00	25.30	- 94,007,009.00	0.85	—	—
3,345,797,305.00	85,560,502.00	138,147,965.00	3,569,505,772.00	8.21	- 30,494,228.00	0.85	—	—
6,829,664,688.00	207,673,445.00	399,149,086.00	7,436,487,219.00	17.09	- 63,512,781.00	0.85	—	—

肆、中央政府易淹水地區水患治理計畫

中華民國 97 年度

科 目					修正(剔除、增列、減列) 內 容	修 實 現 數 應 付		
款	項	目	節	名 稱		增	減	增
				總 計		—	15,045,113.00	—
1				內 政 部 主 管		—	15,045,113.00	—
	1			營 建 署 及 所 屬		—	15,045,113.00	—
				環 境 保 護 支 出		—	15,045,113.00	—
		1		下 水 道 管 理 業 務		—	15,045,113.00	—
			1	雨 水 下 水 道	減列補助地方政府之工程經費結餘。	—	15,045,113.00	—

第 2 期特別決算歲出決算修正數明細表

至 99 年度

單位：新臺幣元

正					數	應 繳 回 國 庫 數	
數	保	留	數	合	計	剔	除 數
減	增	減	增	減		剔	除 數
—	—	—	—	15,045,113.00	—	—	15,045,113.00
—	—	—	—	15,045,113.00	—	—	15,045,113.00
—	—	—	—	15,045,113.00	—	—	15,045,113.00
—	—	—	—	15,045,113.00	—	—	15,045,113.00
—	—	—	—	15,045,113.00	—	—	15,045,113.00
—	—	—	—	15,045,113.00	—	—	15,045,113.00
