

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區 開發計畫特別決算審核報告

中華民國 87 年 7 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

審計部臺灣省嘉義縣審計室

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算審核報告

審計部臺灣省嘉義縣審計室

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算審核報告

中華民國 87 年 7 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

審計部臺灣省嘉義縣
審計室審計官兼主任 任天遠

前 言

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算，嘉義縣政府於民國 103 年 4 月 30 日函送到室，本室已於法定期限內，依法完成審核。

嘉義縣政府為因應地方醫療資源貧乏，經選定嘉義縣治所在地都市計畫區北側土地，循都市計畫程序辦理「擴大嘉義縣治所在地都市計畫」，以區段徵收方式辦理土地取得，並配合擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫之發展，開發興建醫療專用區、住宅區、商業區、文教區、購物中心區及相關公共設施，照顧縣民就醫及安養，提高縣民生命保障，並提供優良居住環境及提升生活品質，以促進土地整體開發利用及地方經濟發展。計畫所需經費 107 億 3,225 萬餘元，以特別預算方式編列，執行期間自民國 87 年 7 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止，分 15 個年度實施。

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別預算，歲入、歲出預算各編列 107 億 3,225 萬餘元，決算審核結果，審定歲入實現數 79 億 7,662 萬餘元，應收保留數 33 億 3,350 萬元，合計決算審定數為 113 億 1,012 萬餘元，較預算超收 5 億 7,786 萬餘元，約為 5.38%；歲出決算經修正減列實現數 2,068 萬元，並如數增列應付保留數，審定歲出實現數 75 億 6,774 萬餘元，應付保留數 24 億 9,082 萬餘元，合計決算審定數為 100 億 5,857 萬餘元，較預算減支 6 億 7,368 萬餘元，約為 6.28%。歲入歲出相抵，審定賸餘為 12 億 5,155 萬餘元。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算審核報告

中華民國 87 年 7 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

目 錄

前 言

甲、總述

壹、預算執行之審核	甲-1
貳、計畫實施之考核	甲-2
參、重要審核意見	甲-3

乙、最終審定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表	乙-1
----------------------	-----

丙、平衡表之查核

丙-1

丁、其他附表

壹、歲入來源別決算審定表	丁-1
貳、歲出政事別決算審定表	丁-3
參、歲出機關別決算審定表	丁-3
肆、歲出決算修正數明細表	丁-5

戊、附錄

嘉義縣議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核	戊-1
----------------------------------	-----

審編說明

- 一、民國 102 年度簡稱本年度。
- 二、嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區簡稱本區。
- 三、約數金額【如萬(餘)元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、統計表內無數值者，以「—」表示。

甲、總 述

壹、預算執行之審核

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別預算，歲入、歲出預算各編列 107 億 3,225 萬餘元，決算審核結果，歲入決算審定為 113 億 1,012 萬餘元；歲出決算審定為 100 億 5,857 萬餘元；歲入歲出相抵，審定賸餘 12 億 5,155 萬餘元。茲將預算執行之審核情形說明如次：



圖片來源：嘉義縣政府提供。

圖 1 嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區概況圖

一、歲入部分

歲入原編列預算數 177 億 3,131 萬餘元，經淨追減預算 69 億 9,906 萬餘元，合計 107 億 3,225 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 79 億 7,662 萬餘元(74.32%)，應收保留數 33 億 3,350 萬元(31.06%)，係部分土地尚未出售及配合公共設施工程資金需求，仍須保留部分財產收入及融資預算於以後年

度繼續執行，合計決算審定數為 113 億 1,012 萬餘元，較預算超收 5 億 7,786 萬餘元(5.38%)，主要係衡酌故宮南院預計於民國 104 年底試營運及馬稠後工業園區已分期開發，預計於民國 107 年間開發完成，將帶動本區房地產市場，經估算後之不動產售價收入較預計增加所致。

二、歲出部分

歲出原編列預算數 177 億 3,131 萬餘元，經淨追減預算 69 億 9,906 萬餘元，合計 107 億 3,225 萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數 2,068 萬元，係減列逕列實現數而尚未完成之太保市第八公墓無主墳墓遷葬作業費，並如數增列應付保留數；審定實現數 75 億 6,774 萬餘元(70.51%)，應付保留數 24 億 9,082 萬餘元(23.21%)，主要係嘉義縣擴大縣治污水處理廠物價調整款及各項工程費用尚未完成核銷、太保市第八公墓無(有)主墳墓仍待辦理後續遷葬事宜及貸款本金尚未清償，仍須保留部分公共設施工程、土地取得及融資等相關經費於以後年度繼續執行，合計決算審定數為 100 億 5,857 萬餘元，預算賸餘 6 億 7,368 萬餘元(6.28%)，主要係開發計畫公共設施工程依實際需要執行而減支，及預備金依實際需要動支後賸餘所致。

貳、計畫實施之考核

嘉義縣政府為因應地方醫療資源貧乏，經選定嘉義縣治所在地都市計畫區北側土地，循都市計畫程序辦理「擴大嘉義縣治所在地都市計畫」，以區段徵收方式辦理土地取得，並配合擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫之發展，開發興建醫療專用區、住宅區、商業區、文教區、購物中心區及相關公共設施等。本區開發土地總面積計 215.05 公頃，該府於民國 88 年間以預先標售方式，將醫療專用區土地計 80.005542 公頃售予長庚聯盟，約占土地總面積 37.20%，由長庚聯盟依雙方簽訂之「嘉義醫療專用區開發暨土地買賣契約書」負責醫療專用區開發，開發期程自民國 89 年 12 月 22 日至 108 年 12 月 31 日，截至本年度止，已完成長庚紀念醫院(含復建暨癌症大樓)、護理之家、長庚科技大學嘉義分部等硬體設備，尚有老人安養中心及養生村

仍待持續規劃辦理；至其餘 135.044458 公頃土地，分別編定住宅區、商業區、文教區、購物中心區、加油站及公用設施用地等，約占土地總面積 62.80%，該府依平均地權條例第 55 之 2 條規定，將其中 40.203709 公頃土地，撥充抵價地發還原土地所有權人，另取得公共設施用地 50.367728 公頃及 12 筆可出售土地面積 44.473021 公頃。截至本年度止，公共設施用地部分，已興設太子大道等道路、公園、廣場、遊客服務中心、學校及停車場等計 48.257713 公頃；可出售土地部分，已標脫土地 10 筆，面積 33.120511 公頃，尚有 6 筆(經該府辦理分割，增加 4 筆)，面積 11.35251 公頃，仍待繼續辦理標售。本特別預算經編列業務計畫 2 項，下分工作計畫 5 項，包括辦理本區用地徵收作業、地上物(包括農林作物等)之查估補償、重新地籍整理、抵價地分配、醫療專用區等土地標售作業及興設本區各項公共設施工程等重要施政項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 4 項，主要原因詳「壹、預算執行之審核」，尚待以後年度繼續執行。


參、重要審核意見

一、開發醫療專用區之長庚紀念醫院已提供門診、急診與住院醫療服務，且相關公共設施齊備，有助提升醫療服務品質，惟居住人口數仍與計畫目標差異頗鉅，致興設之公共設施未能發揮最大使用效能，亟待研謀良策。

本區開發土地面積計 215.05 公頃，嘉義縣政府於民國 88 年間，以預先標售方式將醫療專用區土地售予長庚聯盟，面積計 80.005542 公頃，並由長庚聯盟依「嘉義醫療專用區開發暨土地買賣契約書」負責醫療專用區開發，其中嘉義長庚紀念醫院興建完成後，在民國 91 年 1 月 16 日開始提供門診、急診與住院醫療服務，並陸續完成設立護理之家與長庚科技大學嘉義分部，提升嘉義地區民眾急、慢性疾病醫療服務品質水準；另該府取得公共設施用地 50.367728 公頃，截至本年度止，已興設太子大道等道路、公園、廣場、遊客服務中心、學校及停車場等，計 48.257713 公頃，約占公共設施用地 95.81%，顯示興設之公共設施多已齊備，而本區人口數(包括太保市東勢里及朴子

市仁和里)自民國 90 年底之 2,055 人，至民國 102 年底達 4,080 人，成長近 1 倍，惟僅達開發計畫目

標容納居住人口數 2 萬人之 20.40%，致已興設相關公共設施，未能發揮最大使用效能，經函請檢討改進。據復：本發展區為嘉義縣重點發展核心，已積極規劃並投入本區周圍環境之重大建設，諸如：北鄰之故宮南院預定於民國 104 年底完成試營

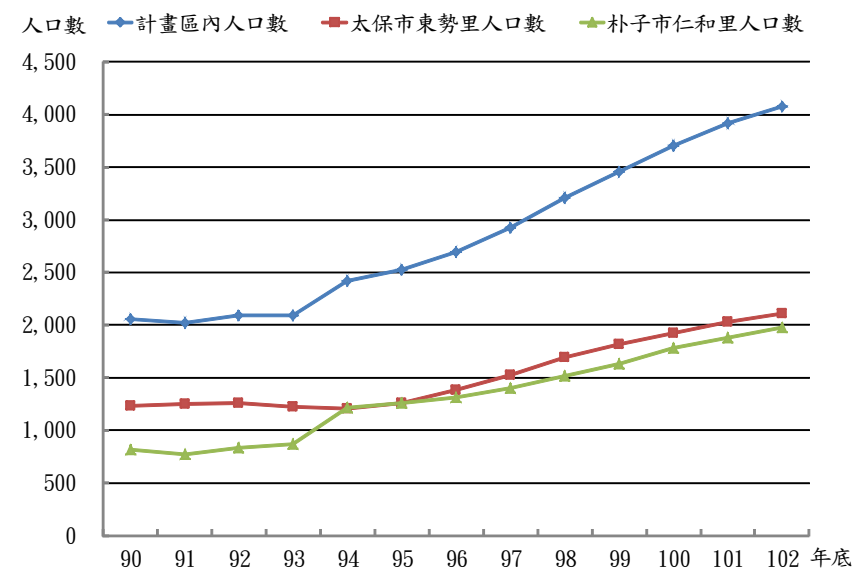

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

圖 2 嘉義縣擴大嘉義縣治第一期發展區內人口數趨勢圖

運，南側之馬稠後產業園區第一期計畫，已於民國 103 年 5 月 27 日動工，整體產業園區未來預計引進直接就業人口 2 萬餘人，並衍生相關就業居住人口，另可吸引民間開發商挹注資金申請興建旅館及住宅新建案等建設，將帶來可觀之磁吸效應。


二、本區開發計畫為擴大嘉義縣治所在地都市計畫區計畫之先驅，可促進地方經濟發展，提升全縣醫療水準，惟開發所產生磁吸效應不如預期，影響後續計畫之推動，亟待研謀因應。

依「擴大嘉義縣治所在地主要計畫書」第九章、實施計畫所載，擴大嘉義縣治所在地都市計畫區係採分期分區發展構想，共分為四期依序開發。其中「擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫」為擴大嘉義縣治所在地都市計畫區計畫之先驅，可促進地方經濟發展，提升全縣醫療水準，且其開發成效將影響後續第二期至第四期開發計畫之推動。經查嘉義縣政府為辦理擴大嘉義縣治所在地之後續分期計畫，曾於民國 93 年 5 月 3 日委託工程顧問公司辦理「擴大嘉義縣治所在地主要計畫(第一次通盤檢討)」暨「嘉義縣治所在地主要計畫與擴大縣治所在地主要計畫合併案」，民國 96 年 8 月 3 日委託工

程顧問公司辦理「擬定變更合併嘉義縣治都市計畫第二期發展區細部計畫案」，惟該府進行財務分析與發展評估結果，考量現況房地產市場景氣不佳，導致本區與高速鐵路嘉義車站特定區之土地開發不如預期，若持續進行第二期發展區之開發，恐導致財務計畫無法自償；亦因考量計畫執行時程過長，時空環境變遷過大，且未來

須重新檢討辦理變更等因素，分別於民國 99 年 4 月 24 日及民國 101 年 2 月 13 日簽辦終止契約，惟已耗費委託費用 422 萬餘元，未能付諸實現。顯示本區土地開發所產生磁吸效應尚不如預期目標，已影響後續第二期開發計畫之執行，經函請研謀檢討。據復：因本區空地及餘屋尚多，經評估結果，若持續開發第二期發展區，將使本區及高速鐵路嘉義車站特定區之發展受到影響，且第二期發展區之區段徵收費用達數十億餘元，以住宅區標售市價需達每坪約 8 萬元，財務方可自償，以目前經濟發展狀況，市場需求性不高，或造成財政困難，且現已積極開發本區周圍之馬稠後產業園區等相關重大建設，進而帶動本區發展且達到相當人口成長率，再依分期分區之順序辦理後續開發策略。

本室對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

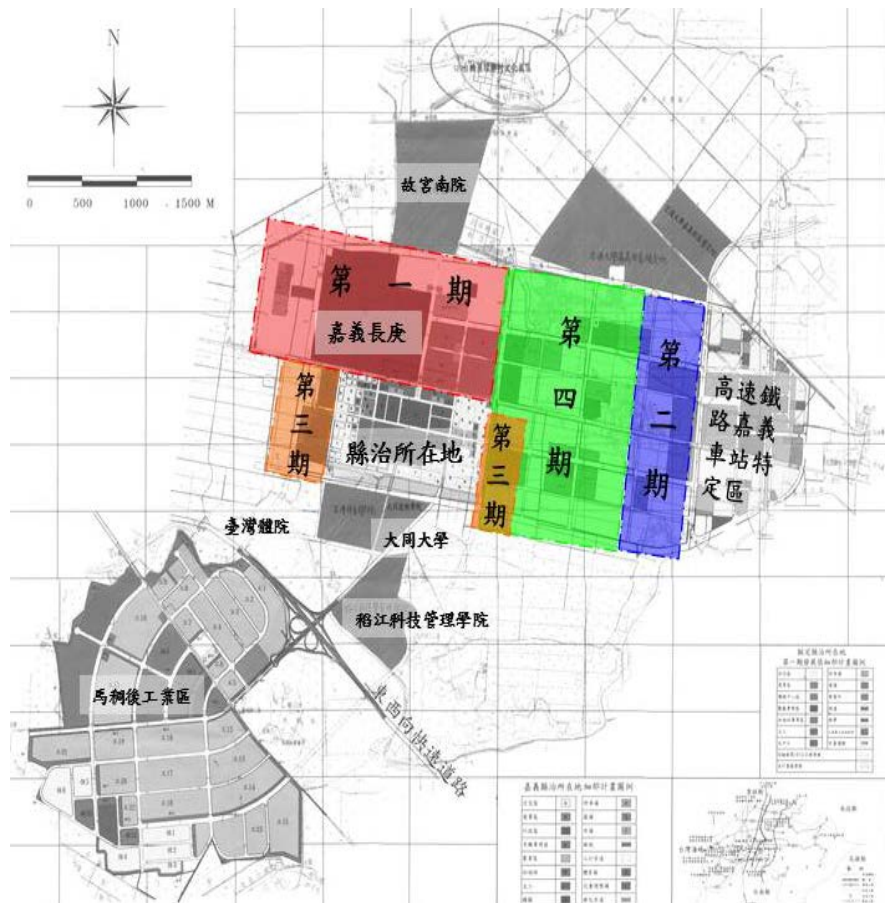

圖片來源：嘉義縣政府提供。

圖 3 嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期至第四期發展區概況圖

乙、最終審定數額表

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

中華民國 87 年 7 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			金 額	占總數 %	金 額	%	金 額	%
一、歲入合計	10,732,254,000	11,310,122,626	11,310,122,626	100.00	+ 577,868,626	5.38	—	—
（一）財產收入	7,017,754,000	7,558,251,185	7,558,251,185	66.83	+ 540,497,185	7.70	—	—
（二）賒借收入	3,714,500,000	3,714,500,000	3,714,500,000	32.84	—	—	—	—
（三）其他收入	—	37,371,441	37,371,441	0.33	+ 37,371,441	—	—	—
二、歲出合計	10,732,254,000	10,058,570,625	10,058,570,625	100.00	- 673,683,375	6.28	—	—
（一）經建及交通支出	6,570,414,000	5,896,730,625	5,896,730,625	58.62	- 673,683,375	10.25	—	—
（二）債務支出	4,161,840,000	4,161,840,000	4,161,840,000	41.38	—	—	—	—
三、歲入歲出餘絀	—	+ 1,251,552,001	+ 1,251,552,001	100.00	+ 1,251,552,001	—	—	—

丙、平衡表之查核

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算平衡表原列民國 102 年 12 月 31 日之資產總額 37 億 9,548 萬餘元、負債總額 25 億 4,393 萬餘元、歲計賸餘 12 億 5,155 萬餘元，經審核修正減列歲出實現數 2,068 萬元，並如數增列應付歲出保留款，決算審定後之資產總額 38 億 1,616 萬餘元、負債總額 25 億 6,461 萬餘元，歲計賸餘 12 億 5,155 萬餘元。茲列表如次：

嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別決算平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
縣庫結存－存款	386,529,605		應付歲出保留款	2,363,980,950	
經費結存－存款	73,792,699		應付歲出款	106,161,654	
應收歲入保留款	3,333,500,000		暫收款	73,792,699	
預付費用	1,665,000		原列負債總額		2,543,935,303
原列資產總額		3,795,487,304	本室審核修正決算應調整數		+ 20,680,000
本室審核修正決算應調整數		+ 20,680,000	應付歲出保留款應調整數	+ 20,680,000	
歲出事項應調整數	+ 20,680,000		增列應付歲出保留款	+ 20,680,000	
增列預付費用	+ 20,680,000		調整後負債總額		2,564,615,303
			餘 絀 部 分		
			原列餘絀總額		1,251,552,001
			本室審核修正決算應調整數		—
			歲計餘絀應調整數	—	
			增列歲出事項應調整數	—	
			調整後餘絀總額		1,251,552,001
調整後資產總額		3,816,167,304	調整後負債及餘絀總額		3,816,167,304

丁、其

壹、嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展

中華民國 87 年 7 月 1 日

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應收數	保 留 數	合 計
				合 計	10,732,254,000	7,976,622,626	—	3,333,500,000	11,310,122,626
1				財 產 收 入	7,017,754,000	5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185
	1			嘉 義 縣 政 府	7,017,754,000	5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185
		1		財 產 收 入	7,017,754,000	5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185
			1	不 動 產 售 價	7,017,754,000	5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185
2				賒 借 收 入	3,714,500,000	2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000
	1			嘉 義 縣 政 府	3,714,500,000	2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000
		1		賒 借 收 入	3,714,500,000	2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000
			1	賒 借 收 入	3,714,500,000	2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000
3				其 他 收 入	—	37,371,441	—	—	37,371,441
	1			嘉 義 縣 政 府	—	37,371,441	—	—	37,371,441
		1		利 息 收 入	—	8,038,228	—	—	8,038,228
		2		租 金 收 入	—	901,300	—	—	901,300
		3		雜 項 收 入	—	28,431,913	—	—	28,431,913

他附表

區開發計畫特別決算歲入來源別決算審定表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應收數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
7,976,622,626	—	3,333,500,000	11,310,122,626	100.00	+ 577,868,626	5.38	—	—
5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185	66.83	+ 540,497,185	7.70	—	—
5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185	66.83	+ 540,497,185	7.70	—	—
5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185	66.83	+ 540,497,185	7.70	—	—
5,158,251,185	—	2,400,000,000	7,558,251,185	66.83	+ 540,497,185	7.70	—	—
2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000	32.84	—	—	—	—
2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000	32.84	—	—	—	—
2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000	32.84	—	—	—	—
2,781,000,000	—	933,500,000	3,714,500,000	32.84	—	—	—	—
37,371,441	—	—	37,371,441	0.33	+ 37,371,441	—	—	—
37,371,441	—	—	37,371,441	0.33	+ 37,371,441	—	—	—
8,038,228	—	—	8,038,228	0.07	+ 8,038,228	—	—	—
901,300	—	—	901,300	0.01	+ 901,300	—	—	—
28,431,913	—	—	28,431,913	0.25	+ 28,431,913	—	—	—

貳、嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展

中華民國 87 年 7 月 1 日

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1			合 計	10,732,254,000	7,588,428,021	106,161,654	2,363,980,950	10,058,570,625
			經建及交通支出	6,570,414,000	5,531,572,556	104,496,654	260,661,415	5,896,730,625
		1	嘉義縣政府	6,570,414,000	5,531,572,556	104,496,654	260,661,415	5,896,730,625
		1	土地取得支出	2,341,478,000	2,137,547,356	305,172	187,630,373	2,325,482,901
		2	公共設施工程	3,988,026,000	3,394,025,200	104,191,482	73,031,042	3,571,247,724
2		3	預 備 金	240,910,000	—	—	—	—
			債 務 支 出	4,161,840,000	2,056,855,465	1,665,000	2,103,319,535	4,161,840,000
		1	嘉義縣政府	4,161,840,000	2,056,855,465	1,665,000	2,103,319,535	4,161,840,000
		1	債 務 還 本	3,714,500,000	1,681,000,000	—	2,033,500,000	3,714,500,000
		2	債 務 利 息	447,340,000	375,855,465	1,665,000	69,819,535	447,340,000

參、嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展

中華民國 87 年 7 月 1 日

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1			合 計	10,732,254,000	7,588,428,021	106,161,654	2,363,980,950	10,058,570,625
			縣 政 府 主 管	10,732,254,000	7,588,428,021	106,161,654	2,363,980,950	10,058,570,625
		1	嘉義縣政府	10,732,254,000	7,588,428,021	106,161,654	2,363,980,950	10,058,570,625
		1	土地取得支出	2,341,478,000	2,137,547,356	305,172	187,630,373	2,325,482,901
		2	公共設施工程	3,988,026,000	3,394,025,200	104,191,482	73,031,042	3,571,247,724
		3	預 備 金	240,910,000	—	—	—	—
		4	債 務 還 本	3,714,500,000	1,681,000,000	—	2,033,500,000	3,714,500,000
		5	債 務 利 息	447,340,000	375,855,465	1,665,000	69,819,535	447,340,000

區開發計畫特別決算歲出政事別決算審定表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
7,567,748,021	106,161,654	2,384,660,950	10,058,570,625	100.00	- 673,683,375	6.28	—	—
5,510,892,556	104,496,654	281,341,415	5,896,730,625	58.62	- 673,683,375	10.25	—	—
5,510,892,556	104,496,654	281,341,415	5,896,730,625	58.62	- 673,683,375	10.25	—	—
2,116,867,356	305,172	208,310,373	2,325,482,901	23.12	- 15,995,099	0.68	—	—
3,394,025,200	104,191,482	73,031,042	3,571,247,724	35.50	- 416,778,276	10.45	—	—
—	—	—	—	—	- 240,910,000	100.00	—	—
2,056,855,465	1,665,000	2,103,319,535	4,161,840,000	41.38	—	—	—	—
2,056,855,465	1,665,000	2,103,319,535	4,161,840,000	41.38	—	—	—	—
1,681,000,000	—	2,033,500,000	3,714,500,000	36.93	—	—	—	—
375,855,465	1,665,000	69,819,535	447,340,000	4.45	—	—	—	—

區開發計畫特別決算歲出機關別決算審定表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
7,567,748,021	106,161,654	2,384,660,950	10,058,570,625	100.00	- 673,683,375	6.28	—	—
7,567,748,021	106,161,654	2,384,660,950	10,058,570,625	100.00	- 673,683,375	6.28	—	—
7,567,748,021	106,161,654	2,384,660,950	10,058,570,625	100.00	- 673,683,375	6.28	—	—
2,116,867,356	305,172	208,310,373	2,325,482,901	23.12	- 15,995,099	0.68	—	—
3,394,025,200	104,191,482	73,031,042	3,571,247,724	35.50	- 416,778,276	10.45	—	—
—	—	—	—	—	- 240,910,000	100.00	—	—
1,681,000,000	—	2,033,500,000	3,714,500,000	36.93	—	—	—	—
375,855,465	1,665,000	69,819,535	447,340,000	4.45	—	—	—	—

肆、嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展

中華民國 87 年 7 月 1 日

科 目				修 正 內 容	修	
款	項	目	名 稱		實 現 數	
					增	減
1			合 計		—	20,680,000
			縣 政 府 主 管		—	20,680,000
			嘉 義 縣 政 府		—	20,680,000
			土 地 取 得 支 出	太保市第八公墓無主墳墓遷葬作業，尚未完成而逕列實現數。	—	20,680,000

區開發計畫特別決算歲出決算修正數明細表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

正 數						應 繳 回 縣 庫 數		備 註
應 付 數		保 留 數		合 計				
增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
—	—	20,680,000	—	20,680,000	20,680,000	—	—	轉帳性質，毋需繳庫。
—	—	20,680,000	—	20,680,000	20,680,000	—	—	
—	—	20,680,000	—	20,680,000	20,680,000	—	—	
—	—	20,680,000	—	20,680,000	20,680,000	—	—	

戊、附 錄

嘉義縣議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核

嘉義縣議會審議嘉義縣擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別預算案所列決議事項，其中與審計職權有關部分，本室均注意列管追蹤其執行情形。茲將決議辦理概況，列述如次：

決議事項

嘉義縣議會第 17 屆第 2、3 次臨時會議決，嘉義縣政府於民國 99 年 8 月 6 日提請審議「有關擴大嘉義縣治所在地第一期發展區開發計畫特別預算案，茲為各項業務實際執行之需，擬於不增加預算情形下調整原預算內節餘可支用經費，提請同意辦理第 6 次追加(減)預算及申請延長執行期間至 102 年 12 月 31 日止。」乙案，「原案通過」。惟附帶決議：「本案俟地方平均地權自治條例修法通過後，始得動支。」

辦理情形查核結果：已依決議辦理，嘉義縣實施平均地權基金設置管理自治條例已於民國 99 年 10 月 14 日修法通過並自同年月 25 日修正公布實施。

